

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

52

Actualización:

27-jul-26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-T-43-2025	Fecha de Adjudicación:	24 DE DICIEMBRE 2025
-----------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

EMPRESA:	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-23200002-5-431092	No COMPROMISO:	5-431092
Monto de Contrato:	\$36,090,157.38	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 30/12/2025 al 31/12/2027	Plazo de Ejecución:	732 DN

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:	
Periodo:	☐	Importe:			

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	26.18%	22.54%	-3.63%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 9,446,666.06	\$ 8,135,449.94	-\$ 1,311,216.12

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 36,090,157.38	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 538,166.54	HASTA EST. No.:	1
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	0
EN REVISION:	\$ 2,094,375.51	HASTA EST. No.:	3

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ 39,944.47	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ 101,293.25	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Las estimaciones No. 02 y No. 03, correspondientes a los meses de febrero y marzo del 2026, fueron remitidas para el trámite correspondiente.



ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

52

Actualización:

27-jul-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-39-2026	Fecha de Adjudicación:	18 de mayo de 2026
-----------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS (EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA E INSTALACIONES) PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

EMPRESA:	JULIO CESAR SANTOS JÍMEZ		
No. DE CONTRATO:	2-23200002-5-431117	No COMPROMISO:	5-431117
Monto de Contrato:	\$7,914,579.81	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 26/05/2026 al 26/12/2027	Plazo de Ejecución:	580 DN

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:	
Periodo:	☐	Importe:			

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	5.30%	5.30%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 419,330.75	\$ 419,330.75	\$ -

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$ 7,914,579.81	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	-	HASTA EST. No.:	0
PENDIENTE DE PAGO:	-	HASTA EST. No.:	0
EN REVISION:	\$ 223,745.35	HASTA EST. No.:	0

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Las estimaciones No. 01, correspondiente al mes de junio del 2026, fueron remitidas para el trámite correspondiente.



ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA DE CORPDA

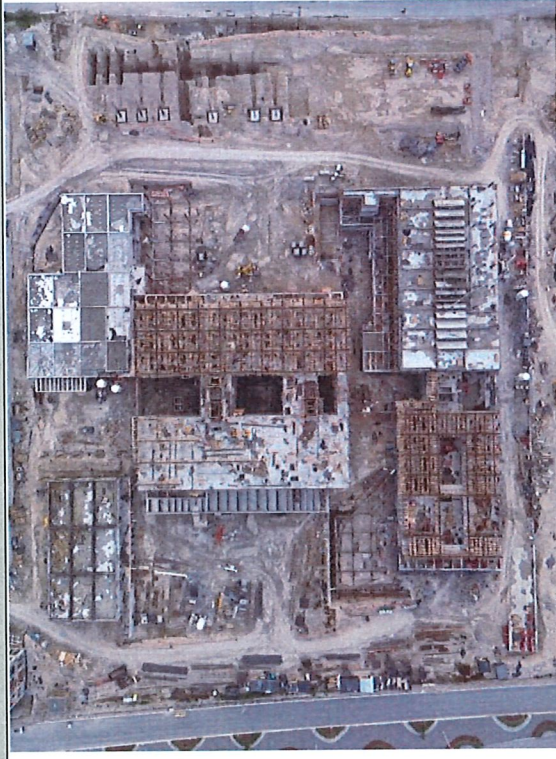
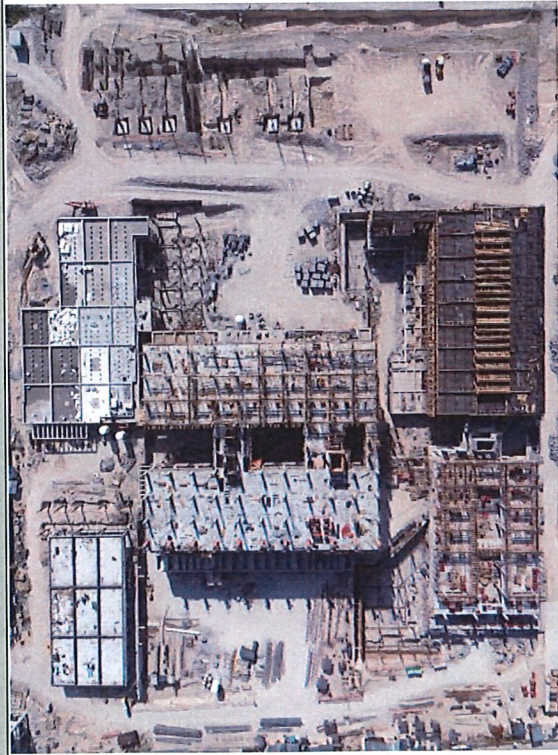
No. Cédula : 52

Actualización: 27-jul-26


CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL

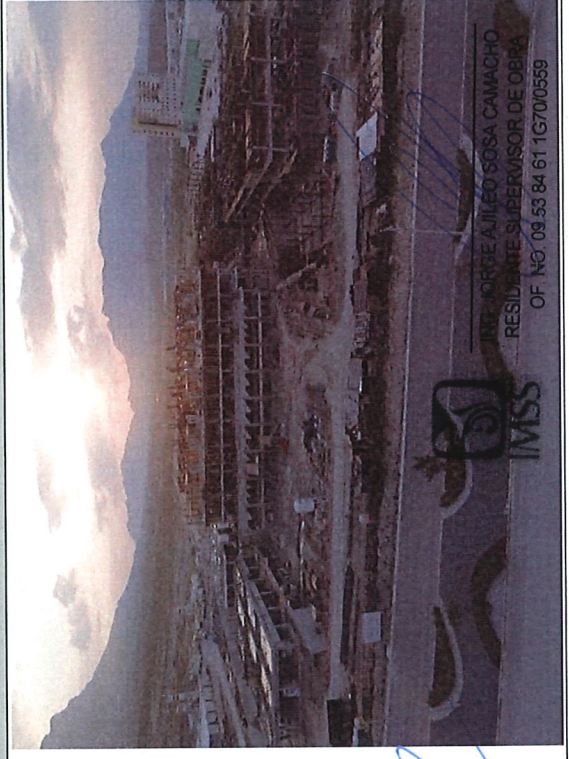

[Handwritten signature]



ING. JORGE AJLEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. N° 09 53 84 61 1G700559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN

DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

RESIDENCIA DE OBRA

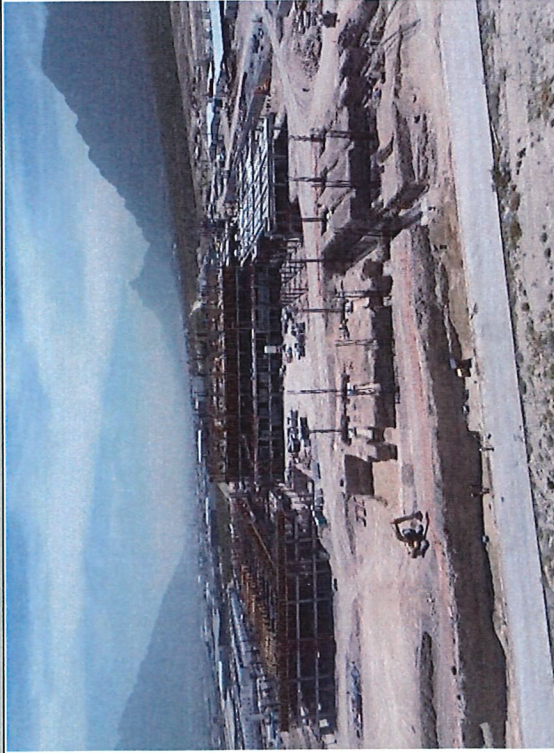
No. Cédula : 52

Actualización: 27-jul-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

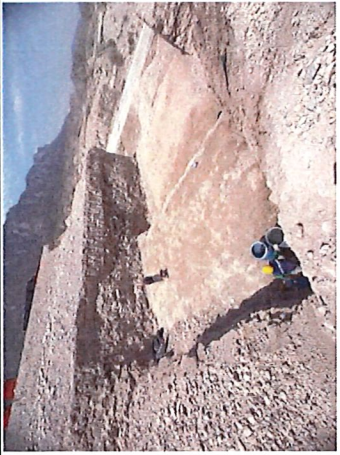
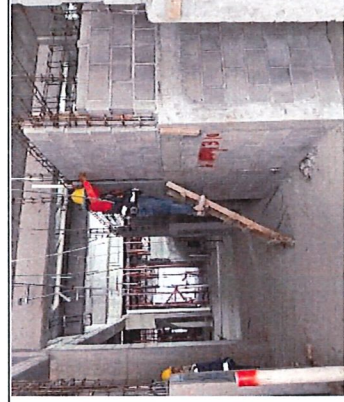
52

Actualización:

27-jul-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRAFICO GENERAL

			
RELLENO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CIMENTACIÓN DE EDIFICIO G	EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CIMENTACIÓN DE EDIFICIO H2	EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CIMENTACIÓN DE EDIFICIO H2	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE PTAR
			
COLADO DE COLUMNAS EDIFICIO D NIVEL +23.70	COLADO DE LOSA AZOTEA Y DIENTES DE SIERRA EDIFICIO A	HABILITADO DE ACERO PARA ESTRUCTURA DEL PUENTE DE INSTALACIONES A-D	HABILITADO DE ACERO, CIMBRA PARA VIGAS DEL D NIVEL +28.50
			
REVISIÓN DE COLADO DE CONCRETO CELULAR ULTRALIGERO, EN AZOTEA DE EDIFICIO F.	APLANADO EN MUROS DE BLOCK HUECO, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5; EDIFICIO G, NIVEL 9.30, CASA DE MAQUINAS.	REVISIÓN DE PLOMO EN MUROS DE BLOCK HUECO, JUNTAS, CUATRAPEO HABILITADO DE ACERO PARA DALAS DE CERRAMIENTO Y CASTILLOS, EN EDIFICIO A, NIVEL 0.00.	SUPERVISIÓN DE COLADO DE DALAS INTERMEDIAS Y CASTILLOS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN EDIFICIO G (CASA DE MAQUINAS), NIVEL 9.30.

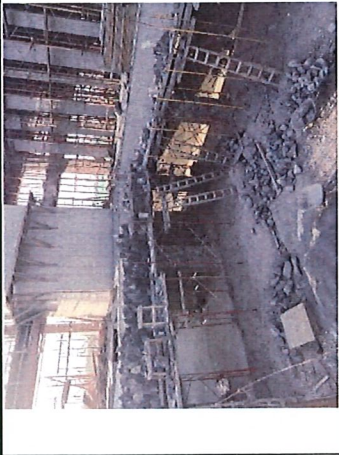
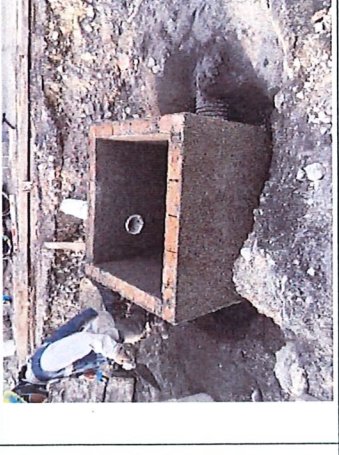
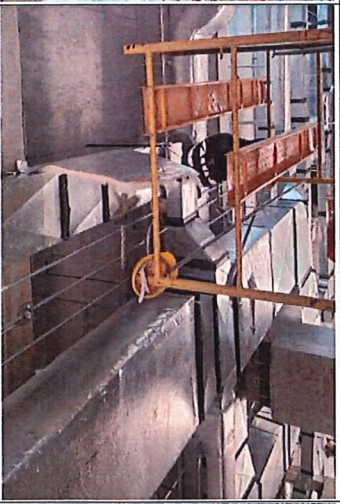
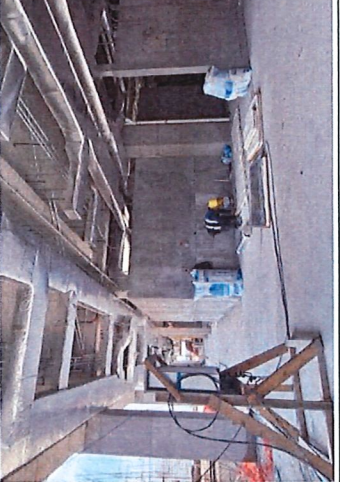
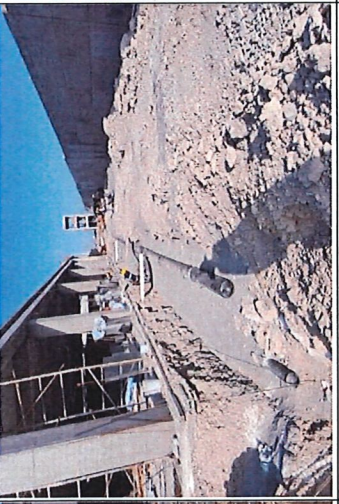
CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
DEPENDENCIA DE OBRA

No. Cédula 52
Actualización: 27-jul-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

			
REVISIÓN DE PLOMEO EN MUROS DE BLOQ HUECO, REVISIÓN DE HABILITADO DE ACERO PARA DALAS DE CERRAMIENTO Y CASTILLOS, EDIFICIO G NIVEL 9.30.	REVISIÓN DE COLOCACIÓN DE PIEDRA EN FACHADA DE EDIFICIO A Y EDIFICIO B, NIVEL 0.00. FIUADO CON ADHESIVO REFORZADO.	REVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQ EN EDIFICIO DE TANQUE DIESEL, REVISIÓN DE PLOMEO, JUNTAS, RECUBRIMIENTO DE CASTILLOS.	REVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA LA RED SANITARIA Y RED PLUVIAL EXTERIOR.
			
PASOS EN LOSA DE AZOTEA PARA DUCTOS, AA EN EDIFICIO A NIVEL 14.10.	COLOCACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO, AA EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 3.	COLOCACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO, AA EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 1.	COLOCACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO, AA EDIFICIO A NIVEL 0.00, SECCIÓN 1.
			
TRAZO Y EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA EN RED SANITARIA EXTERIOR, IS EDIFICIO F NIVEL 9.30.	COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y COLCHÓN DE ARENA PARA RED SANITARIA Y PLUVIAL EXTERIOR, IS EN EDIFICIO F NIVEL 9.30.	COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN CUADROS DE VÁLVULAS, IH EN EDIFICIO B NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, IHS EDIFICIO B NIVEL 4.50, SECCIÓN 1.

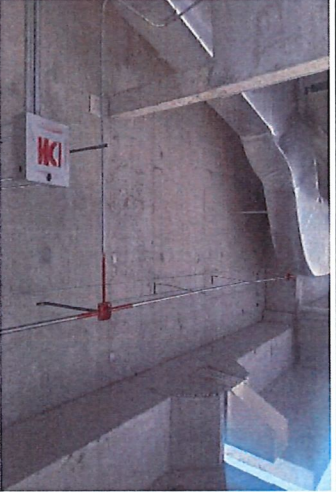
CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA


COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA DE OBRA

No. Cédula 52
Actualización: 27-jul-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

			
COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONTACTOS EN MURO, IE EDIFICIO D NIVEL 14.10, SECCIÓN 4.	COLOCACION DE TUBERÍA Y REGISTRO DE CONEXIONES PARA ALIMENTADORES SUBGENERALES, IE EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 4.	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, IE EDIFICIO G NIVEL 9.30.	MONTAJE DE TUBERÍA PARA ALIMENTADORES SUBGENERALES, IE EDIFICIO F NIVEL 9.30.
			
COLOCACION DE TUBERÍA Y CAJAS DESVIADORAS PARA CORREO NEUMÁTICO, TIC'S EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 3.	COLOCACION DE TUBERÍA PARA SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VOCEO-SONORIZACIÓN, TIC'S EN EDIFICIO F NIVEL 9.30, SECCIÓN 2.	COLOCACION DE TUBERÍA Y REGISTRO PARA CONEXIONES PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS EDIFICIO D NIVEL 9.30, SECCIÓN 3.	COLOCACION DE TUBERÍA PARA SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VOCEO-SONORIZACIÓN, TIC'S EN EDIFICIO F NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

52

Actualización:

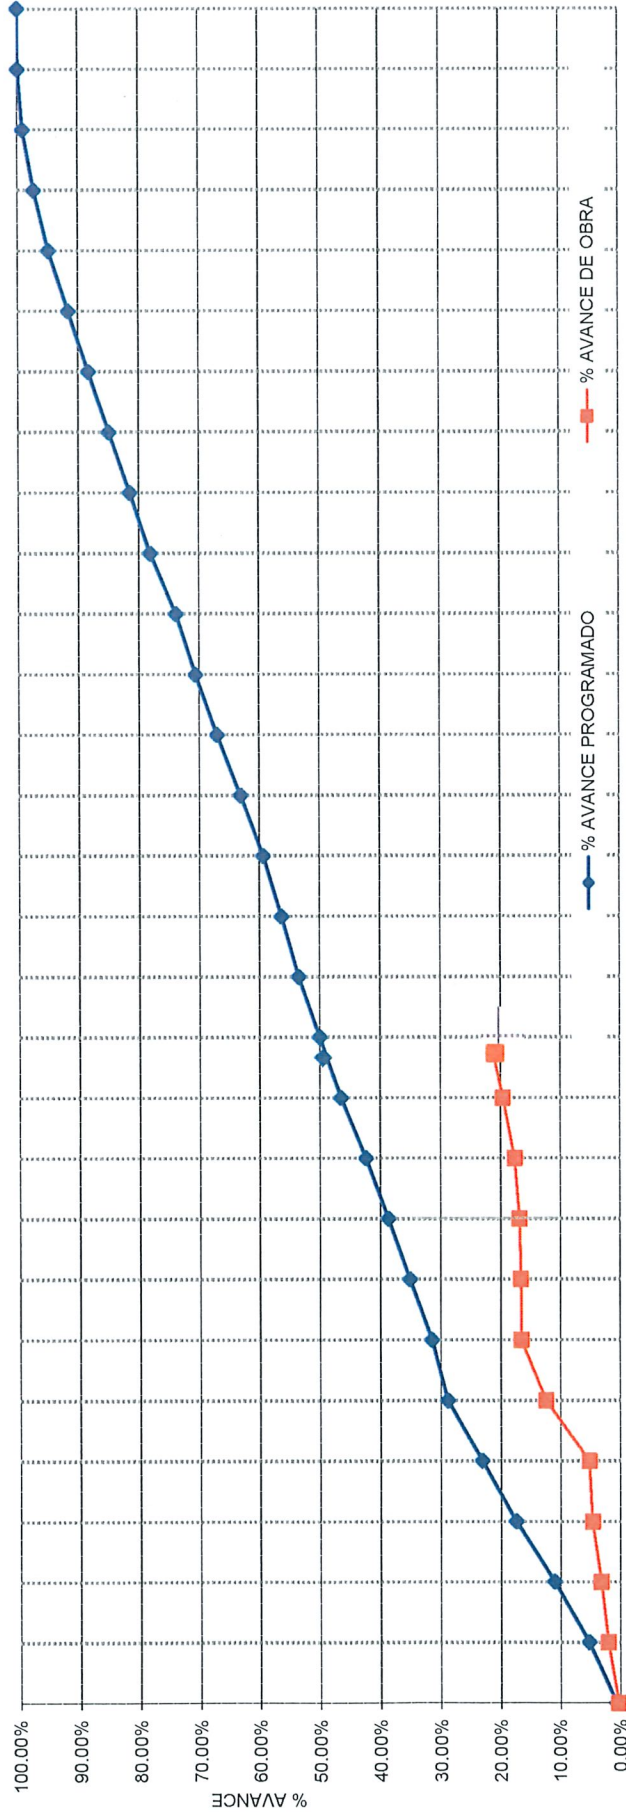
27-jul-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

FECHA DE CORTE:

27-jul-26

GRÁFICA AVANCE PROGRAMADO VS REAL



FECHA	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE DE OBRA
31-ago-25	0.66%	0.32%
30-sep-25	5.23%	2.03%
31-oct-25	10.99%	3.22%
30-nov-25	17.42%	4.65%
31-dic-25	23.10%	5.17%
31-ene-26	28.85%	12.40%
28-feb-26	31.47%	16.61%
31-mar-26	35.13%	16.66%
30-abr-26	38.68%	16.85%
31-may-26	42.40%	17.64%
30-jun-26	46.49%	19.61%
27-jul-26	49.99%	21.76%
31-ago-26	53.49%	
30-sep-26	56.38%	
31-oct-26	59.36%	
30-nov-26	63.15%	
31-dic-26	67.07%	
31-ene-27	70.65%	
28-feb-27	73.89%	
31-mar-27	78.16%	
30-abr-27	81.52%	
31-may-27	84.99%	
30-jun-27	88.34%	
31-jul-27	91.61%	
31-ago-27	94.87%	
30-sep-27	97.27%	
31-oct-27	99.12%	
30-nov-27	99.98%	
31-dic-27	100.00%	



ING. JORGE AJILLO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 16700559



Dirección de Administración

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Construcción de Infraestructura

Coordinación Técnica de Construcción

División de Supervisión de Obra Pública

Subjefatura de División de Control y Seguimiento de Obra Pública Zona Norte

Residencia de Obra

AVANCE FÍSICO PARAMÉTRICO

Avance físico paramétrico acumulado conciliado general es de 21.76% incluye el avance físico ejecutado y anticipos por fabricación de equipos

					FECHA DE CORTE: AVANCE PROGRAMADO			27-jul-26 AVANCE REAL		
Clave/Descripción	Inicio	Fin	IMPORTE TOTAL	% TOTAL	IMPORTE	% GLOBAL	% PARTICULAR	IMPORTE	% GLOBAL	% PARTICULAR
1.1 OBRA CIVIL OBRA CIVIL	13-ago-25	31-dic-27	\$ 1,681,740,971.90	58.1418%	\$ 1,097,629,220.65	37.9476%		\$ 446,886,750.83	15.4499%	
01 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS	13-ago-25	30-nov-25	\$ 121,764,624.38	4.2097%	\$ 121,764,624.38	4.2097%	100.00%	\$ 116,803,347.92	4.0382%	95.93%
02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	01-sep-25	31-ene-26	\$ 501,567,494.32	17.3404%	\$ 501,567,494.32	17.3404%	100.00%	\$ 287,582,516.51	9.9424%	57.34%
03 ESTRUCTURA DE ACERO	01-dic-25	30-jun-26	\$ 46,348,597.61	1.6024%	\$ 46,348,597.61	1.6024%	100.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
04 ALBAÑILERÍA	01-oct-25	31-jul-26	\$ 292,642,005.86	10.1173%	\$ 288,791,453.15	9.9842%	98.68%	\$ 38,347,960.78	1.3258%	13.10%
05 ACABADOS	01-feb-26	31-mar-27	\$ 256,114,557.88	8.8545%	\$ 106,915,747.04	3.6963%	41.75%	\$ -	0.0000%	0.00%
06 HERRERÍA	01-jun-26	31-dic-26	\$ 100,286,578.83	3.4671%	\$ 26,711,845.76	0.9235%	26.64%	\$ -	0.0000%	0.00%
07 ALUMINIO	01-jul-26	31-mar-27	\$ 5,598,198.32	0.1935%	\$ 551,647.28	0.0191%	9.85%	\$ -	0.0000%	0.00%
08 VIDRIOS ACRÍLICOS Y ESPEJOS	01-nov-26	30-oct-27	\$ 276,257,520.07	9.5509%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	01-may-26	30-jun-27	\$ 24,097,131.04	0.8331%	\$ 4,977,811.11	0.1721%	20.66%	\$ -	0.0000%	0.00%
10 JARDINERÍA	01-abr-27	31-dic-27	\$ 10,509,894.74	0.3634%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
11 URBANIZACIÓN	01-ene-27	30-oct-27	\$ 42,632,277.64	1.4739%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ 4,152,925.62	0.1436%	9.74%
31 MANO DE OBRA ÚNICAMENTE	01-abr-27	15-dic-27	\$ 3,922,091.21	0.1356%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
1.2 INSTALACIONES	01-nov-25	31-dic-27	\$ 1,210,742,002.66	41.8582%	\$ 348,277,246.44	12.0408%		\$ 30,193,096.76	1.0438%	
IH I. HIDRÁULICAS-SANITARIAS	01-nov-25	31-mar-27	\$ 137,307,641.99	4.7471%	\$ 71,580,921.89	2.4747%	52.13%	\$ 2,891,499.53	0.1000%	2.11%
IE I. ELÉCTRICAS	01-nov-25	30-sep-27	\$ 398,482,251.72	13.7765%	\$ 153,350,108.32	5.3017%	38.48%	\$ 1,674,487.32	0.0579%	0.42%
AA I. AIRE ACONDICIONADO	01-mar-26	31-ago-27	\$ 391,540,147.96	13.5365%	\$ 106,264,994.62	3.6738%	27.14%	\$ 25,627,109.91	0.8860%	6.55%
GM I. GASES MEDICINALES	01-mar-27	28-nov-27	\$ 67,658,850.22	2.3391%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
CE I. CABLE ESTRUCTURADO	01-mar-27	28-nov-27	\$ 20,350,324.30	0.7036%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
EE I. COMUN. ENFERMO-ENFERMERA	01-mar-27	28-nov-27	\$ 47,629,331.21	1.6467%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
SO I. SONIDO	01-mar-27	28-nov-27	\$ 12,772,076.75	0.4416%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
TE I. TELEFONÍA	01-mar-27	28-nov-27	\$ 13,225,589.15	0.4572%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
IN I. INFORMÁTICA	01-nov-26	30-jun-27	\$ 27,151,477.36	0.9387%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
TV I. TELEVISIÓN	01-ene-27	30-jun-27	\$ 3,146,240.50	0.1088%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
DI I. DETECCIÓN DE INCENDIO	01-ene-26	30-nov-27	\$ 48,961,406.40	1.6927%	\$ 14,569,345.54	0.5037%	29.76%	\$ -	0.0000%	0.00%
LPI I. GAS LP	01-feb-26	31-jul-27	\$ 7,748,499.08	0.2679%	\$ 2,511,876.08	0.0868%	32.42%	\$ -	0.0000%	0.00%
CR I. CONTROL NEUMÁTICO	01-mar-27	28-nov-27	\$ 5,504,510.79	0.1903%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
CA I. CONTROL DE ACCESOS	01-mar-27	30-oct-27	\$ 8,418,571.71	0.2911%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
CCTV I. CIRCUITO CERRADO DE	01-abr-27	30-nov-27	\$ 14,555,755.31	0.5032%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
EN I. TELE ENSEÑANZA	01-abr-27	31-dic-27	\$ 6,289,328.21	0.2174%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
PARTIDAS / SUBPARTIDAS	13-ago-25	31-dic-27	\$ 2,892,482,974.56	100.0000%	\$ 1,445,906,467.09	49.99%		\$ 477,079,847.58	16.49%	
% DE AVANCE POR FABRICACION DE EQUIPOS								\$ 152,433,852.76	5.27%	
								TOTAL	21.76%	

NOTA: En cuanto se tengan los P.U. autorizados se podrá dar un avance más preciso en cuanto a avance físico-financiero.

El % de avance correspondiente a los anticipos por la fabricación de equipos es un dato proporcionado por la Defensa el cual estará sujeto a revisión.

CONCILIACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE PARAMÉTRICO

POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

TTE. COR. I. C. HERNANDO MARTÍNEZ VALDIVIEZO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

