

GOBIERNO DE
MÉXICO

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES		SEGUIMIENTO
Del Contrato		
1. Da verifiers suscripción al 08 de julio de 2026, la Residencia de Obra ingresa a la DSOP el "Convenio modificatorio adicional al monto y reconocimiento de conceptos no prevías en el catálogo original, el día 18 de agosto fue solicitado por el emisor de la documentación soporte complementario del documento técnico, el cual fue entregado el mismo día. 2. Con oficio No. ROUMF 530446 26 la Residencia de obra envía vía correo electrónico el Presupuesto No. 9 A y 9C según el 10 conceptos no prevías en el catálogo original por 125 MDP. A Continúa para fines correspondientes, a la fecha no han sido entregados a esta Residencia estimación correspondiente. 3. Con Oficio No. ROUMF 530441 26 la Residencia de obra envía vía correo electrónico el Presupuesto No. 11 por 0.40 MDP de 4 conceptos no prevías en el catálogo original para su conexión, el día 05 de agosto mediante escrito No. 330508202601, reintegro el controlista presupuesto 11 con dos 2 precios adicionales (leptales y estuco con sus respectivas tarjetas unitarias y generadores para su revisión por esta Residencia de Obra los cuales fue entregado al superintendente de construcción para anexar soporte correspondientes, el día 20 de agosto fue ingresado por ofidatista de partes del Instituto a DSOP, presupuesto No. 11 para su trámite correspondiente. 4. Con oficio No. ROUMF 530439 26 la Residencia de obra ingresa al DSOP oficio de la Contratista 312503202601 de reconocimiento del acabado estuco en fachada del cuerpo II (servicios preventivos) y reconocimiento de lepatite en terraplen escrito 312503202601, con fecha 11 de agosto fue recibido oficio No. 09535461 11785DSOP/235/2026/22, para su seguimiento por esta Residencia de Obra. Venite concluido. 5. Con oficio No. ROUMF 530444 26, las observaciones a los reclamos de lepatite, acabado de estuco y pintura en fachadas y pendientes de obra, para su adecuación por parte al contratista, el día 08 de agosto mediante escrito No. 330508202601, fueron reintegradas tarjetas unitarias de lepatite y acabado estuco, una vez concluido conjuntamente en reunión del día 05 de agosto con Tular de la División de Supervisión de Obra Pública, Residencia de Obra y Contratista, para su revisión y conciliación, el día 20 de agosto fue ingresado presupuesto No. 11 con dos 2 precios adicionales a DSOP, por ofidatista de partes del Instituto. 6. Estimaciones Ordinarias, se encuentran pendientes por pagar 168, 172. Estimaciones Extraordinarias: se encuentran pendientes por pagar 179. El importe total de estimaciones pendientes de pago es de 1, 26 MDP, una vez formalizado el convenio correspondiente serán liquidadas. 7. El día 20 de agosto fue enviado por el contratista programa de ejecución de obra, para su revisión a esta Residencia de obra, mediante mensaje electrónico, el cual fue ingresado con las observaciones indicadas para su conexión al mismo día. 8. El día 21 de agosto de 2026 fue enviado vía correo electrónico a Dirección de Administración de UMF-53, solicitud de permisos y apoyo para el ingreso de personal técnico en telecomunicaciones para la instalación de 4 cámaras de CCTV y personal de obra civil para arreglar fajas de registros sanitarios de viduid dañados, para su reposición para el día 23 y 30 de agosto de 2026, en espera de la autorización y comentarios.		1. El área legal de la DSOP se encuentra revisando el convenio modificatorio, para poder ingresarlo a la DSOP. 2. La DSOP se encuentra en espera del ingreso de Estimaciones por parte del Contratista. 4. La DSOP está respuesta con oficio No. 09 53 84 61 10785DSOP/235/2026/22 al cual se encuentra en proceso de firma. 6. En espera de tener el convenio modificatorio para poder realizar el reintegro de estimaciones.
Del Proyecto Ejecutivo		
N/A		
De la Obra		
1. Continúa pendiente la colocación de 4 cámaras de CCTV, en área de estacionamiento posterior oriente. El día 21 de agosto fue solicitado vía correo electrónico a la Residencia de Obra la autorización de ingreso de personal de obra civil para arreglar fajas de registros sanitarios de viduid dañados, para su reposición para el día 23 y 30 de agosto de 2026, en espera de la autorización y comentarios. 2. Falta los siguientes trabajos que deberá realizar el contratista: - Fuga en baños públicos: hornos de atención médica continua - Fugas de impermeabilización en base de equipo de condensación del área de atención de personal - Acabado de pintura en cancelas de herrería en fachada exterior poniente de RP-BI - Asentado de vigas, colocación de junta constructiva en fachada lado poniente - Fijación correcta de línea de tierra de antenas pararrayos en área de jardín de la subdelegación 3. El contratista sigue aún realizar las siguientes reparaciones: - Fuga en baños públicos: hornos de atención médica continua - Fugas de impermeabilización en base de equipo de condensación del área de atención de personal - Retiro de cinta de madera en guardión, relleno y cobado de tanque en área posterior de cisterna de bombas de sistema de la subdelegación - Impermeabilización de azotea del cuadrante norte-oriental entre ejes (A-C) y (2-4) ya que presenta filtraciones y humedecimiento en plafones al interior. - Sellado correcto de impermeabilizante con fallidos de puentes de instalaciones - Serries de alumbrado de accesos principales, por carpintero y artesanos (pívidos) - Serries de alumbrado de accesos secundarios, por carpintero y artesanos (pívidos) - Colocación de muebles de baño en el baño principal - Colocación de muebles de baño de asistentes médicos (Ries) 4. Falta suministro y colocación de tapa de Ventilador V-15 del área de baños vestidores.		1. Falta colocación de cámaras de CCTV, por parte del contratista 2, 3, y 4 continúa pendiente su ejecución
De las Licencias, Permisos y Vistos Buenos		
El día 14 de agosto de 2026, fue realizado la visita de personal de Protección Civil de H. Ayuntamiento a la UMF-53, haciendo unas observaciones preventivas y recomendaciones para la mejora de la seguridad y Operación, así como la Autorización de Ingreso y Operación, así como la Autorización de Ingreso y Operación de la UMF-53, para el día 17 de agosto de 2026. Fue realizado nota informativa dirigida a CCI, de la Subdelegación de Obra Pública, Residencia de Obra y Contratista, para su revisión y conciliación, el día 20 de agosto de 2026, en espera de la autorización y comentarios.		
Descripción de los trabajos en ejecución		
Fecha conclusión de los trabajos		
Apertura Parcial		13 de julio de 2025

DATOS GENERALES									
UNIDAD: UNIDAD MEDICA FAMILIAR N° 93			LOCALIDAD: Ecatepec de Morelos , Estado de México						
Superficie de Terreno (m2)	Superficie Construida (m2)	Superficie Estacionamiento (m2)	Superficie Dren Externo (m2) (calza hidráulica, drenaje, sistema de alcantarillado, etc.)	Superficie Asfaltada y Pavedimentada (m2)					
14,142.250	8,785.53	1120.00	520	0.00					
CONTRATO									
No. de Procedimiento:	LO-050GYR19-E38-2022			Fecha de Adjudicación:	11-nov-22				
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:									
SUSTITUCIÓN DE LA UMF No. 93 (PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO MEXICO), UBICACIÓN AVENIDA VIA MORELOS KM. 17.5, ESQUINA, CON AVENIDA CASA NUEVA, COLONIA JARDINES DE CASA NUEVA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.									
EMPRESA: Edificaciones 3 Hsa. S.A. de C.V.									
No. de Contrato:	1-17150004-4-0350			No COMPROMISO:	4-0350				
Monto de Contrato:	\$ 316,333,123.97			Monto de Anticipo :	\$ 25,005,984.59				
Periodo de Ejecución:	25 de Nov de 2022 a 22 de Mayo de 2024.			Plazo de Ejecución:	535 días naturales				
MODIFICACIONES AL CONTRATO									
Tipo	Número	Periodo	Plazo (días)	Monto (€IVA)					
Contrato	1-17150004-4-0350	25/11/2022 a 22/05/2024	545	\$316,333,123.97					
Convenio	1-17150004-4-0350C1-23	16/02/2023 a 13/06/2024	83	N/A					
Acta Circunstanciada	Suspensión temporal de obra parcial	19/07/2024 a 30/11/2024	-	N/A					
Acta Circunstanciada	Prórroga de Suspensión temporal de forma parcial	04/07/2024 a 13/04/2025	261	N/A					
Prórroga	1-17150004-4-0350C2-23	14/06/2024 a 21/05/2025	281	N/A					
PROCESO DE OBRA (CON IVA)									
Avances		Programado	Real	Desviación					
Físico (En porcentaje %)		100.00%	100.00%	0.00%					
Financiero (Importes CIVA)		\$ 316,333,123.97	\$ 316,273,610.25	\$ 59,519.72					
Fuera de trabajo (Prom. Mensual)		0	0	0					
Materiales									
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)									
ESTIMACIONES/ADMINISTRACIONES (SEGUN SEA EL CASO)									
MONTO CONTRATO:	\$ 316,333,123.97		MONTO CONVENIDO:		\$ -				
MONTO PAGADO:	\$ 316,273,610.16		HASTA EST. No:		186				
DEPENDIENTE DE PAGOS	1,450,967.95		HASTA EST. No:		106,172 y 179				
EN REVISION:	\$ -		HASTA EST. No:						
AMORTIZACION DE ANTICIPO									
AMORTIZADO									
2022		\$ 137,641.39		\$ -					
2023		\$ 22,115,062.95		\$ -					
2024		\$ 10,015,705.58		\$ -					
PENALIZACIONES (SIN IVA)									
SANCION APLICABLE AL PERIODO (0.1% diario)									
SANCION ACUMULADA A LA FECHA									
\$141,281.93									

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA RESIDENCIA DE OBRA		No. Cédula 137	
		Actualización: 24-ago-26	
DATOS GENERALES			
CONTRATO DE SERVICIOS			
No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-47-2023	Fecha de Adjudicación: 18 DE OCTUBRE DE 2023	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO"			
EMPRESA:	EXPERENCIA INMOBILIARIA TOTAL, S.A. de C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-17150004-5-431019	No COMPROMISO: 5-431019	
Monto de Contrato:	\$ 12,196,606.06	Monto de Anticipo: \$ -	
Periodo de Ejecución:	Del 01 de noviembre de 2023 al 15 de octubre de 2024	Plazo de Ejecución: 350 DN	
CONVENIO			
No. De Convenio:	1-17150004-5-431019C1-25	Tipo de Convenio: ADICIONAL AL MONTO Y ADICIONAL AL PLAZO	
Periodo:	☒ del 16 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025	Fecha: 31 de julio de 2025	
**agregar filas como sea necesario		Importe: \$4,124,653.73 más I.V.A.	
PROCESO DE OBRA (CON IVA)			
Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 18,932,661.36	\$ 22,997,732.23	-\$ 4,065,070.87
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)			
ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:	\$ 18,932,661.36	MONTO CONVENIDO:	\$ 18,932,661.36
MONTO PAGADO:	\$ 18,915,921.85	HASTA EST. No.:	26
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ 4,081,810.38	HASTA EST. No.:	27 al 36
PENALIZACIONES (SIN IVA)			
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO			
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA			
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES			
Derivado de la necesidad del convenio modificadorio adicional al monto y adicional al plazo, la residencia de obra integro el dictamen técnico correspondiente, el cual contempla 3.5 MDP aprox. Se encuentra en revisión de forma económica el Dictamen Técnico por parte del Analista de la DSOP, el día 19 de agosto de 2026, fue solicitado por el analista documentación soporte complementaria del dictamen técnico, el cual fue entregado el mismo día. El contratista continua con la integración del Expediente Administrativo de la obra con la actualización de documentos de los contratos, El día 23 de julio de 2026, el contratista ingreso 9 cajas del Expediente Unitario con solo 23 puntos a oficinas centrales, se encuentra en revisión para su seguimiento y control. El día 06 de agosto fue notificado vía electrónica mediante oficio No. RO/ UMF 93/ 0447 26 al contratista la devolución de las 9 cajas, una vez revisada la información para su integración de manera formal y total del Expediente Unitario. El día 28 de julio de 2026, fueron regresadas las 10 estimaciones para su corrección de reportes de supervisión y control, soportes de estimaciones, de acuerdo a los Términos de Referencia y alcance del concepto del No. 27 al No. 36 de los periodos correspondientes de 01 abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025 y una vez autorizado el convenio adicional e monto y adicional en plazo serán tramitadas a pago. Se realizo el informe pormenorizado del estado que guarda el contrato para su cierre administrativo entregándose al analista para su revisión, a la fecha no se ha tenido visto bueno, El día 26 de junio fue notificado el visto bueno al contratista para la elaboración de programas para el convenio de adicional al monto y adicional al plazo. el día 17 de agosto de 2026 fue enviados el programas de ejecución de servicios, mediante correo electrónico para su corrección de montos al contratista.. El día 02 de julio fueron ingresados 11 estimaciones de ajustes de costos para su revisión a esta Residencia de Obra, (No, 27 al 37 de periodos mayo 2024 a diciembre de 2024 y de enero de 2025 a marzo de 2025), el día 16 de julio fueron regresadas para su corrección al contratista. al día de hoy no se han regresado para su revisión. El día 23 de julio fueron ingresadas las estimaciones No. 33, 34, 35 y 36 de los periodos 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para su revisión por esta Residencia de Obra, el día 28 de julio de 2026 fueron regresadas para corrección los reportes de supervisión y control de obra de acuerdo a sus términos de referencia y alcance del concepto, al día de hoy no se ha tenido respuesta o reingreso para su revisión.			

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRACOORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

111

Actualización:

24-ago-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-20-2024	Fecha de Adjudicación:	09 DE JULIO DE 2024
-----------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93".

EMPRESA:	MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ		
No. DE CONTRATO:	2-17150004-5-431038	No COMPROMISO:	5-431038
Monto de Contrato:	\$ 370,000.00	Monto de Anticipo:	\$ -
Periodo de Ejecución:	Del 17 de julio de 2024 al 13 de diciembre de 2024	Plazo de Ejecución:	150 DN

CONVENIO

No. De Convenio:	2-17150004-5-431038C1-25	Tipo de Convenio:	ADICIONAL AL MONTO Y ADICIONAL AL PLAZO	Fecha: 29 de agosto de 2025
Periodo:	☒	del 14 de diciembre de 2024 al 31 de marzo de 2025	Importe: \$120,002.46 más I.V.A.	

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 568,402.85	\$ 719,206.36	-\$ 150,803.51

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$ 568,402.85	MONTO CONVENIDO:	\$ 568,402.85
MONTO PAGADO:	\$ 487,211.25	HASTA EST. No.:	12
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ 231,995.10	HASTA EST. No.:	13 a la 18

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Derivado de la necesidad del convenio modificatorio adicional al monto y adicional al plazo, la residencia de obra integro el dictamen técnico correspondiente, el cual contempla 0.20 MDP aprox.

El día 15 de julio de 2026 fue entregado dictamen técnico actualizado y complementado de forma económica para su revisión al Analista de la DSOP, el día 19 de agosto de 2026, fue solicitado por el analista documentacion soporte complementaria del dictamen tecnico, el cual fue entregado el mismo día.

El día 23 de junio de 2026, se presentó el Superintendente de Servicios en oficinas del IMSS, se recibió el oficio de termino de obra, la revisión y autorización de documentos soportes para las estimaciones No. 13 al No. 18 de los periodos 01 de abril de 2025 al 31 de julio de 2025, Una vez autorizado el convenio, se ingresaran las estimaciones para tramite de pago.

El día 04 de agosto se tuvo la visita del Superintendente de Servicios (UVIE) firmándose la acta de verificación de los servicios y la entrega de documentos del expediente Unitario para su archivo, el día 12 de agosto el contratista envió fianza de vicios ocultos y fue terminado el acta entrega recepción, faltando la elaboración del finiquito una vez autorizado el convenio respectivo..

Se reviso el programa de ejecución para convenio adicional al monto y adicional al plazo, donde se devolvió para su corrección al contratista, una vez revisado y visto bueno, se procederá con la realización de los programas para convenio respectivo.

El día 19 de agosto de 2026 el analista fue entregado el visto bueno de la fianza de vicios ocultos a esta Residencia de Obra, para su verificación e informar al UVIE su procedencia y entrega.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRACOORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

203

Actualización:

24-ago-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	AO-050GYR119-E43-2021	Fecha de Adjudicación:	27 DE OCTUBRE DE 2021
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "Director Responsable de Obra, que cuente con los Responsables en Seguridad Estructural, Diseño Urbano y Arquitectónico e Instalaciones, para el registro de la Licencia de Construcción, seguimiento y aviso de terminación de obra, para la construcción de la UMF No. 93"

EMPRESA:

Construcciones TAANIKUN, S.A. de C.V.

No. DE CONTRATO:	2-17150004-5-43914	No COMPROMISO:	5-43914
Monto de Contrato:	\$ 2,266,578.40	Monto de Anticipo:	\$ -
Periodo de Ejecución:	Del 03 de noviembre de 2021 al 17 de marzo de 2023	Plazo de Ejecución:	500 DN

CONVENIO

No. De Convenio C1	2-17150004-5-43914C1-23	Tipo de Convenio:	ADICIONAL AL PLAZO	Fecha: 06 de julio de 2023
Periodo:	☒	del 18 de marzo de 2023 al 13 de agosto de 2024	Importe: N/A	
No. De Convenio C2:	2-17150004-5-43914C2-25	Tipo de Convenio:	ADICIONAL AL PLAZO	Fecha: 28 de agosto de 2025
Periodo:	☒	del 14 de agosto de 2024 al 21 de mayo de 2025	Importe: N/A	

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	75.00%	
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 2,629,230.94	\$ 707,760.38	\$ 1,921,470.56

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$ 2,629,230.94	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 707,760.38	HASTA EST. No.:	2
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ 85,742.40	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Derivado de la necesidad del convenio modificatorio adicional al plazo, la residencia de obra integro el dictamen técnico correspondiente, el cual contempla 1.92 MDP aprox.

Se encuentra en revisión de forma económica el Dictamen Técnico por parte del Analista de la DSOP, el día 18 de agosto fue solicitado por el analista documentación soporte complementaria del dictamen técnico, el cual fue entregado el mismo día.

Se realizo el informe pormenorizado del estado que guarda el contrato para su cierre Administrativo que fue entregado a analista para su revisión y visto bueno a la fecha no se ha tenido respuesta,

El día 16 de junio de 2026 le fue informado vía correo electrónico al contratista las observaciones realizadas a los informes, estudio, análisis y revisión de proyecto y notas de Seguridad e Higiene para su corrección y solventación. El día 16 de julio de 2026 se presentó en oficinas Centrales para recibir información complementaria. al día de hoy no se ha tenido respuesta a lo solicitado.

Se le solicito el avance de las correcciones de sus informes, estudio, análisis, revisión de proyecto y notas de seguridad, se informa que está realizando las correcciones observadas.

Se tiene los planos Asbuilt firmados, faltando el sello por parte del DRO, y escaneo del total de los planos para su integración al expediente Unitario y la entrega a la área operativa de inmueble de la UMF-93

El día 14 de agosto de 2026, fue realizado la visita del personal de Protección Civil del H. Ayuntamiento realizando unas observaciones preventivas y correctivas para así liberar los actas de Verificación del Visto Bueno de Seguridad y Operación, así como la Autorización de uso y ocupación del inmueble. el cual ya fue notificado el contratista Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V. para su solventación.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE GOB.

No. Cédula 175

Actualización: 24-ago-26

"SUSTITUCIÓN DE LA UMF No. 93 (PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO MEXICO)",
UBICACIÓN AVENIDA VIA MORELOS KM. 17.5, ESQUINA, CON AVENIDA CASA NUEVA, COLONIA JARDINES DE CASA NUEVA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

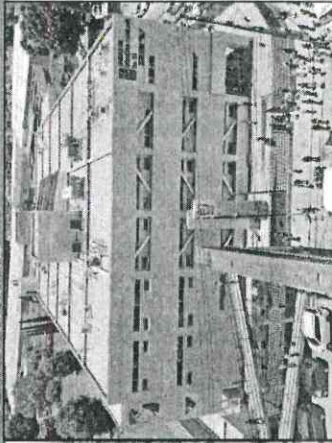
REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO





VISTA AEREA PLANTA GENERAL




VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR

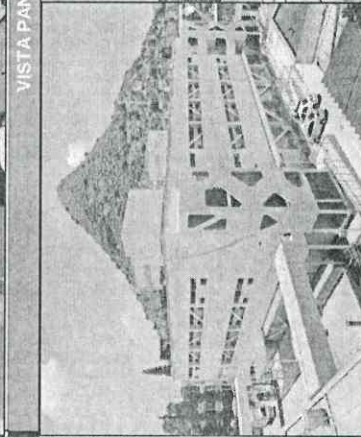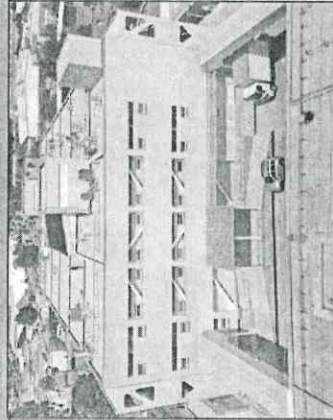







VISTA PANORAMICA

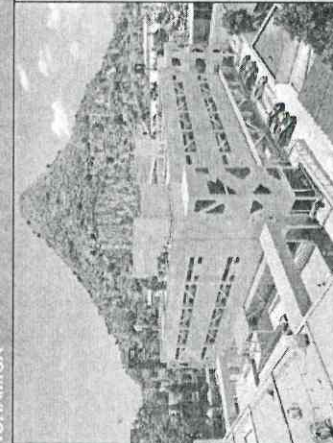

[Handwritten signature]

"SUSTITUCIÓN DE LA UNIF No. 93 (PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO MEXICO)", UBICACIÓN AVENIDA VIA MORELOS KM. 17.5, ESQUINA, CON AVENIDA CASA NUEVA, COLONIA JARDINES DE CASA NUEVA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

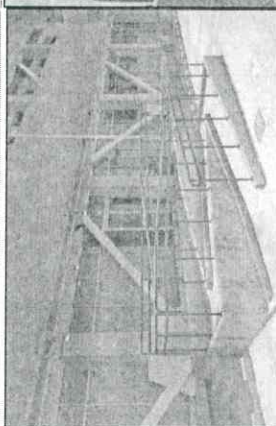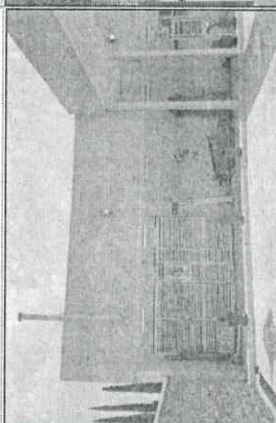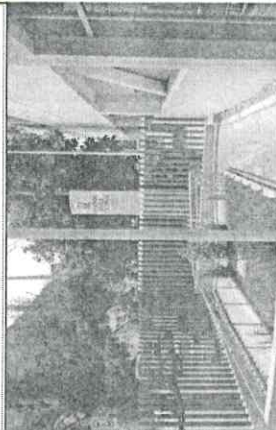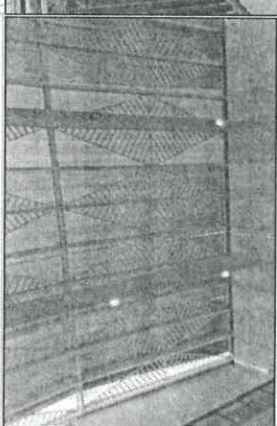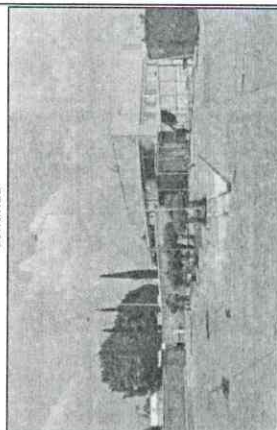REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL							
	Vista interior de Sala de espera en patio central cubierto.		Vista interior de área de atención derecho ambiente Prestaciones económicas		Vista de señalización de rutas de evacuación en planta baja		Vista al interior de ambientación
	Vista interior de accesos a tomas de muestras de		Vista exterior de rampa de salida de emergencia		Vista exterior de acceso a cada de máquinas eléctrica		Vista de rampa de acceso a área de Atención Médica Continua
	Vista interior cárcamo seco de bombas de cisterna de subdelegación		Vista interior del estructura de domo principal de patio central		Vista exterior de rampa de acceso principal al Inmueble UMF - 93		Vista exterior de área de estacionamiento posterior oriente

[Handwritten signature]
