

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento: **LO-50-GYR-050GYRT19-N-47-2023** Fecha de Adjudicación: **18-oct-23**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:**

"SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO"

EMPRESA: **EXPERENCIA INMOBILIARIA TOTAL, S.A. de C.V.**

No. DE CONTRATO: **1-17150004-5-431019** No COMPROMISO: **5-431019**

Monto de Contrato: **\$12,144,437.86** Monto de Anticipo: **N/A**

Periodo de Ejecución: **el 01 de noviembre de 2023 al 15 de octubre de 2024** Plazo de Ejecución: **350 días naturales**

**CONVENIO**

Monto  Plazo  Fecha:  Número compromiso:

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	75.08%	75.08%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$10,622,468.70	\$10,622,607.59	\$138.90
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	21.00	15.00	-6.00
Materiales	N/A	N/A	N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA (CON IVA)**


**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	<b>\$14,087,547.92</b>	MONTO CONVENIDO:	<b>N/A</b>
MONTO PAGADO:	<b>\$6,541,794.27</b>	HASTA EST. No.:	<b>1 al 6</b>
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISIÓN:	<b>\$1,430,653.00</b>	HASTA EST. No.:	<b>7 al 9</b>

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO  
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

**Reporte Fotográfico**

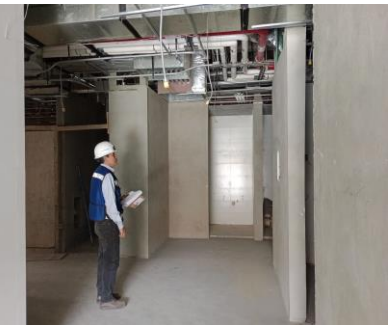

**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**
