

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula 50
Actualización: 27-jun

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: AO-50-GYR-050GYR119-N-20-2024 Fecha de Adjudicación: 09-jul-24

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

"UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93".

EMPRESA: ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ

No. DE CONTRATO: 2-17150004-5-431038 No COMPROMISO: 5-431038
Monto de Contrato: \$370,000.00 Monto de Anticipo: N/A
Periodo de Ejecución: Del 17 de julio al 13 de diciembre de 2024 Plazo de Ejecución: 150 días naturales

CONVENIO

Monto ☐ Plazo ☐ Fecha: Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	98.92%	-1.08%
Financiero (Importers C/IVA)	\$429,200.00	\$0.00	-\$429,200.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	3.00	3.00	0.00
Materiales	N/A	N/A	N/A

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$429,200.00	MONTO CONVENIDO:	N/A
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$232,005.19	HASTA EST. No.:	01 al 05

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico

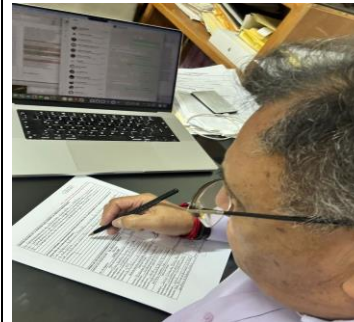

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

El avance físico real ejecutado corresponde al 98.92 %

EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 TERMINO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 2-17150004-5-431038, SE ENCUENTRA EL PROCESO DE REVISION PROGRAMAS DE LA CONTRATISTA Y ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO PARA FORMALIZAR CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO Y MONTO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ.

Se continua con el dictamen para entrega a C.F.E. Se encuentra en correccion de estimaciones por parte del contratista
