




Hospital General de Zona 90 Camas Ciudad Acuña, Coahuila

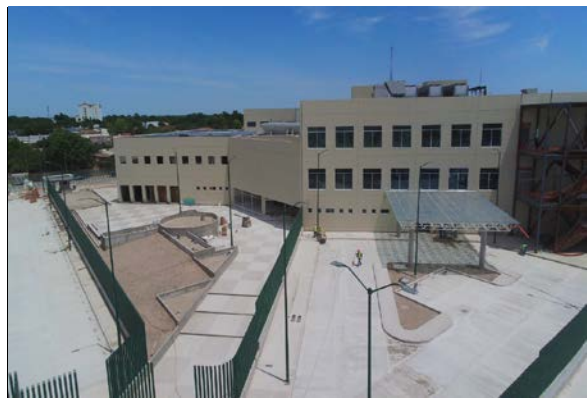

Situación actual de la obra:

Se encuentran realizando trabajos de acabados como plafones, pastas en muros, piso en vinil y cancelerías.

El contratista de Supervisión solicitó ampliación en tiempo y monto.

TIPO DE OBRA:	Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	31, 478 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	20, 500 m ²
NUMERO DE CAMAS:	90 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	6 unidades (3 de
POBLACION BENEFICIADA:	431, 218 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR ALVARGA HOSPITAL ACUÑA S.A. DE C.V.

Contrato	1-15050002-4-43747		
	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2017	24/08/2018	\$ 483,638,807.27
Convenio 1	25/08/2018	18/02/2019	\$ 87,331,431.16
Convenio 2	19/02/2019	18/06/2019	\$ -
Convenio 3	19/06/2019	31/12/2019	\$ -
Convenio 4	01/01/2020	31/03/2020	\$ -
Convenio 5	01/04/2020	30/06/2020	\$ 122,574,116.52
Convenio 6	01/07/2020	30/10/2020	\$ 38,883,487.81
Total	02/05/2017	30/10/2020	\$ 732,427,842.76

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	94.00%	6.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Pendiente de ejercer
\$ 732,427,842.77	\$ 641,606,154.52	\$ 90,821,688.25
100.00%	87.60%	12.40%
Hasta la estimación:	355	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria		

SUPERVISIÓN: CONSTRUIDEAS, INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Contrato	2-15050002-5-43892		
	Inicio	Fin	Importe
Original	20/09/2019	16/04/2020	\$ 6,440,558.04
Convenio 1	17/04/2020	31/08/2020	\$ 3,457,209.09
Convenio 2			
	20/09/2019	31/08/2020	\$ 9,897,767.13

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	85.70%	14.30%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 9,897,767.13	\$ 9,739,665.58	\$ 158,101.55
100.00%	98.40%	1.60%
Hasta la estimación:	16	

Acciones pendientes:

DRO: ING. OLGA LYDIA BENAVIDES OBREGÓN

Contrato	2-15050002-5-43767		
	Inicio	Fin	Importe
Original	27/07/2017	26/09/2019	\$ 821,048.00
Convenio 1	27/09/2018	24/03/2019	\$ 187,920.00
Convenio 2	25/03/2019	31/07/2020	\$ 501,120.00
Convenio 3			
	27/07/2017	31/07/2020	\$ 1,510,088.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	75.00%	25.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,510,088.00	\$ 717,288.00	\$ 792,800.00
100.00%	47.50%	52.50%
Hasta la estimación:	21	
