

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
 RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula **74**

Actualización: 25 de septiembre de 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-5-2024	Fecha de Adjudicación:	7 DE MAYO DE 2024
-----------------------	------------------------------	------------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:	RAZÓN SOCIAL: C. JESÚS RICARDO CANCINO RUIZ		
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-431026	No COMPROMISO:	5-431026
FECHA DE CONTRATO:	14 DE MAYO DE 2024		
Monto de Contrato:	\$656,371.51	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	15/05/2024 AL 10/11/2024	Plazo de Ejecución:	139 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	0
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:
0	0	0	0

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	44.93%	36.51%	8.42%
Financiero (Importes S/IVA)	\$294,891.37	\$239,631.45	\$55,259.92
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$761,390.95	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$239,631.45	HASTA EST. No.:	1, 2 (UNO Y DOS)
PENDIENTE DE PAGO:	\$55,259.92	HASTA EST. No.:	3 (TRES)
EN REVISION:			

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico

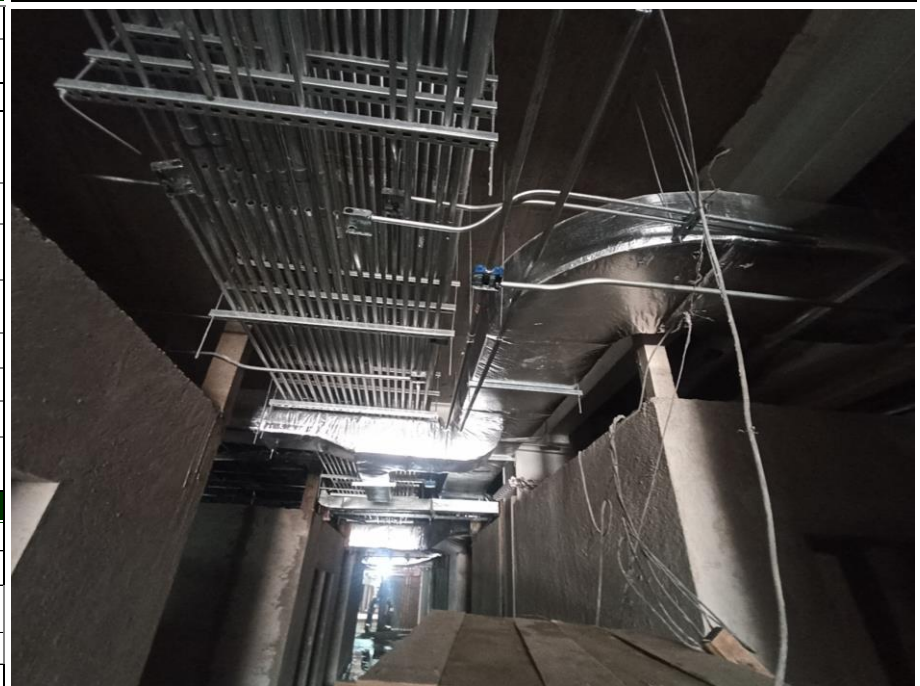

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES
