

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYRT19-N-31-2023	Fecha de Adjudicación:	16-ago-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
EMPRESA:			
No. DE CONTRATO:	1-22130004-5-43999	No COMPROMISO:	5-43999
Monto de Contrato:	\$28,894,700.23 (I.V.A. incluido)	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	17 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	420 días naturales

CONVENIO

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:		Importe:		Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	96.4442%	86.7935%	-9.65%
Financiero (Importers C/IVA)	\$27,867,262.48	\$25,078,721.64	-\$2,788,540.84
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	16.00	21.00	5.00
Materiales	99.05%	87.89%	-11.16%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$28,894,700.23	MONTO CONVENIDO:	-
MONTO PAGADO:	\$12,852,927.38	HASTA EST. No.:	12
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$3,065,115.38	HASTA EST. No.:	13-16

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (MAYO)	\$68,146.22
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$312,492.21

Reporte Fotográfico

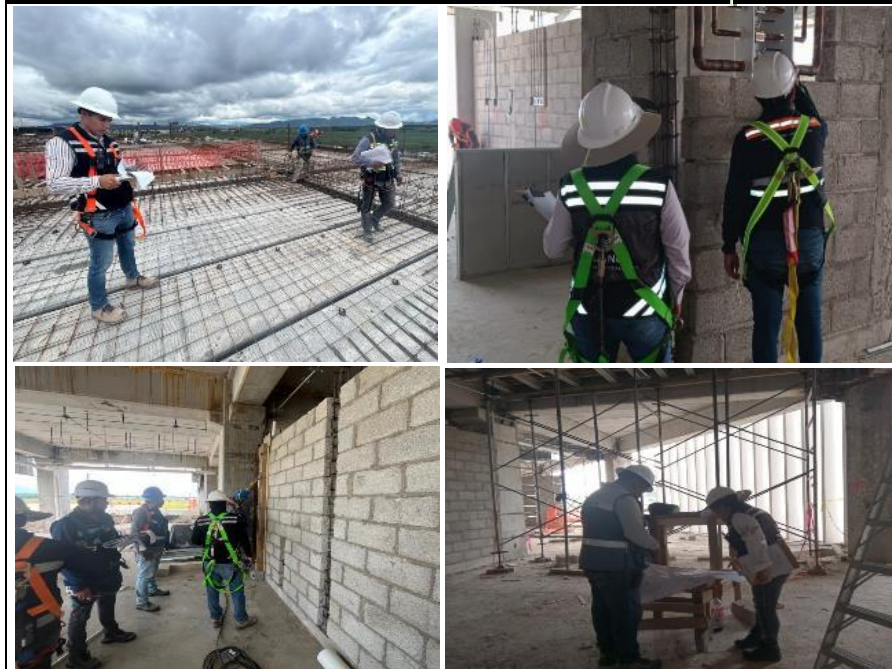

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se le solicita cumplir a la brevedad con lo señalado en sus Términos de Referencia y con lo señalado al alcance de su contrato esperando su pronta atención, los cuales tienen como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances al contrato durante su proceso de supervisión, con el objeto de dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos.
