

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-43-2023	Fecha de Adjudicación:	04-oct-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA"

EMPRESA: CONSULTORIA SUPERVISION TECNICA Y OPERACION EN SISTEMAS S.A. DE C.V. Y GRUPO ATENEA III MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO:	1-08360002-5-431011	No COMPROMISO:	5-431011
Monto de Contrato:	\$10,182,103.36	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	18 / OCTUBRE / 2023 al 24 / MAYO / 2024	Plazo de Ejecución:	220 Días Naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	(25 / MAYO / 2024 al 23 / JULIO / 2024)
Periodo: 60 días	Importe: N/A	Número: 1-08360002-5-431011C1-24	Número compromiso: 5-431011C1-24

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	69.17%	30.83%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 10,182,103.36	\$7,424,539.56	-\$2,757,563.80
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$10,182,103.36	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$7,424,539.56	HASTA EST. No.:	1 - 22
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$256,190.67
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$202,474.64
DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	\$0.00

Reporte Fotográfico

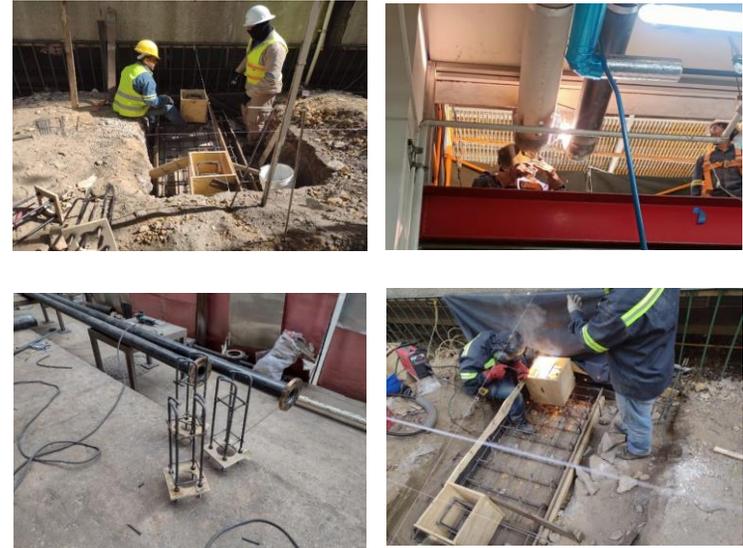

PROBLEMÁTICA Y PENDIENTES DE OBRA Y ADMINISTRATIVOS.

- Se celebrou un Convenio Adicional al Plazo originalmente pactado en el Contrato, donde se aumento el plazo en 60 días naturales, extendiendo el periodo del 25 de mayo de 2024 al 23 de julio de 2024, lo cual es equivalente al 27.27%, respecto al originalmente pactado, que sumado al plazo en el Contrato primigenio, resulta el nuevo plazo de ejecución de 280 días naturales, dicho Convenio aprobado con No. 1-08360002-5-431011C1-24; de fecha 19 de junio de 2024.
- El Contratista de Servicios continúa con la verificación de los trabajos en obra y revisando generadores.
- El Contratista de Servicios solicitó un Convenio de ampliación al plazo y monto del contrato. de Servicios solicitó un Convenio de ampliación al plazo y monto del contrato, por lo que una vez que se contó con el OLI vigente, la Residencia de Obra trámite el Dictamen Técnico correspondiente.
