

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-050GYR119-E43-2021	Fecha de Adjudicación:	27-oct-21
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
"Director Responsable de Obra, que cuente con los Responsables en Seguridad Estructural, Diseño Urbano y Arquitectónico e Instalaciones, para el registro de la Licencia de Construcción, seguimiento y aviso de terminación de obra, para la construcción de la UMF No. 93"			
EMPRESA:	Construcciones TAANIKUN, S.A. de C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-17150004-5-43914	No COMPROMISO:	5-43914
Monto de Contrato:	\$2,266,578.40	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	Del 03 de noviembre de 2021 al 17 de marzo de 202	Plazo de Ejecución:	500 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	6 DE JULIO DE 2023
Periodo: al 13-ago-24	Importe: N/A	Número: 2-17150004-5-43914C1-23	Número compromiso: 5-43914C1-23

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	65.81%	-34.19%
Financiero (Importers C/IVA)	\$2,629,230.94	\$1,730,356.24	-\$898,874.71
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	4.00	3.00	-1.00
Materiales	94.29%	94.29%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$2,629,230.94	MONTO CONVENIDO:	N/A
MONTO PAGADO:	\$771,754.10	HASTA EST. No.:	2
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$85,742.40

Reporte Fotográfico

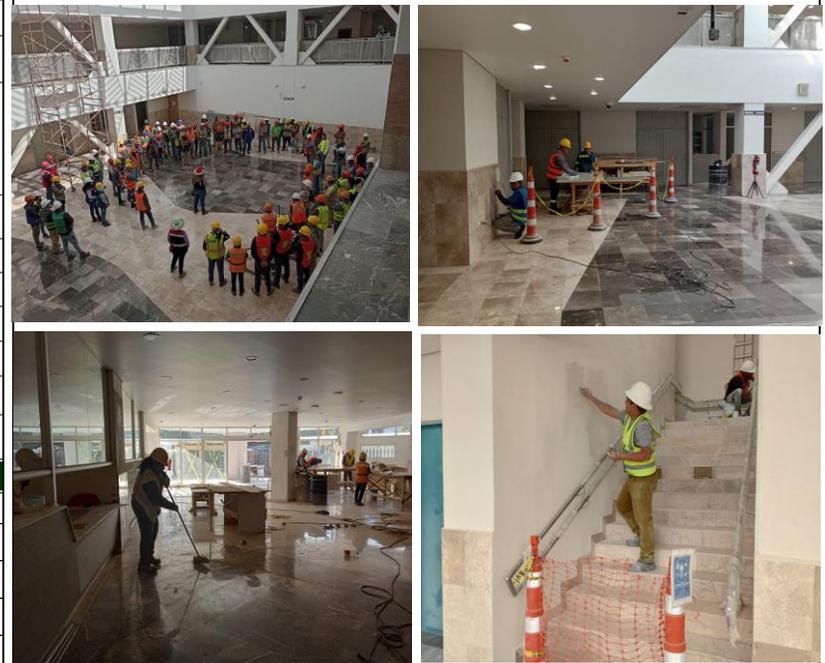

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

EL DIA 13 DE AGOSTO TERMINO PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO 2-17150004-5-43914C1-23, POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE CONOCER EL PLAZO DE EJECUCION DE LA REPROGRAMACION DE LA CONTRATISTA EDIFICACIONES 3 RIOS, S.A. DE C.V PAR SOLICITAR EL COVENIO DE AMPLIACION PARA EL DRO.
