




REPORTE SEMANAL DE OBRA
 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
 DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 RESIDENCIA DE OBRA

UNIDAD	HGO/UMAE No 23	CÉDULA No	13
TIPO DE OBRA	RESTRUCTURACION DE PISOS	ACTIVIDAD AL	domingo, octubre 23, 2016
LOCALIDAD	MONTERREY NL	CONTRATO No	2-14200006-4-43701
EMPRESA	KAANS ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	COMPROMISO	4-43701

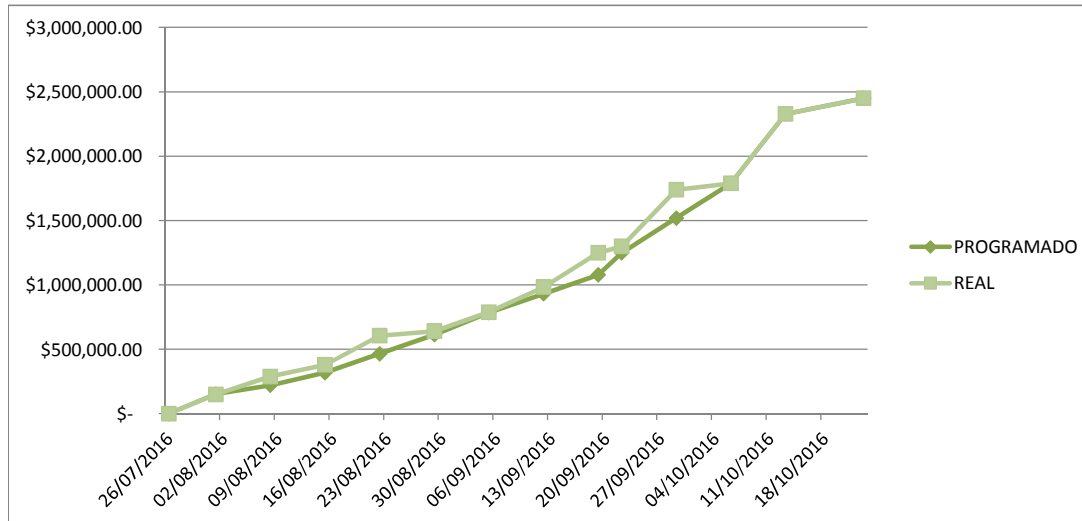

	PROGRAMADO	REAL
MONTO DEL CONTRATO	\$ 2,449,989.64	\$ 2,449,989.64
26/07/2016	\$ -	0.00%
01/08/2016	\$ 151,654.36	\$ 148,567.07
08/08/2016	\$ 220,499.07	\$ 288,982.15
15/08/2016	\$ 318,498.65	\$ 379,867.61
22/08/2016	\$ 465,498.03	\$ 605,147.44
29/08/2016	\$ 612,497.41	\$ 640,427.29
05/09/2016	\$ 783,996.68	\$ 787,671.67
12/09/2016	\$ 930,996.06	\$ 983,670.84
19/09/2016	\$ 1,077,995.44	\$ 1,249,494.72
22/09/2016	\$ 1,249,494.72	\$ 1,298,494.51
29/09/2016	\$ 1,518,993.58	\$ 1,739,492.64
06/10/2016	\$ 1,788,492.44	\$ 1,788,492.44
13/10/2016	\$ 2,327,490.16	\$ 2,327,490.16
23/10/2016	\$ 2,449,989.64	\$ 2,449,989.64

	PROGRAMADO	REAL
MONTO DEL CONTRATO	\$ 2,449,989.64	\$ 2,449,989.64
26/07/2016	0.00%	0.00%
01/08/2016	6.19%	6.19%
08/08/2016	9.00%	12.18%
15/08/2016	13.00%	15.50%
22/08/2016	19.00%	24.70%
29/08/2016	25.00%	26.14%
05/09/2016	32.00%	32.15%
12/09/2016	38.00%	40.15%
19/09/2016	44.00%	51.00%
22/09/2016	51.00%	53.00%
29/09/2016	62.00%	71.00%
06/10/2016	73.00%	73.00%
13/10/2016	95.00%	95.00%
23/10/2016	100.00%	100.00%

DE CONFORMIDAD

ARQ. LUIS MATA LEAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISÓ

ARQ. DANIEL SANTILLAN CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA IMSS

ELABORÓ

ARQ. DANIEL SANTILLAN CARRILLO
