




### REPORTE SEMANAL DE OBRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES  
 DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

<b>UNIDAD</b>	<b>HGO/UMAE No 23</b>	<b>CÉDULA No</b>	<b>13</b>
<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>RESTRUCTURACION DE PISOS</b>	<b>ACTIVIDAD AL</b>	<b>domingo, octubre 23, 2016</b>
<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTERREY NL</b>	<b>CONTRATO No</b>	<b>2-14200006-4-43701</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>KAANS ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>4-43701</b>

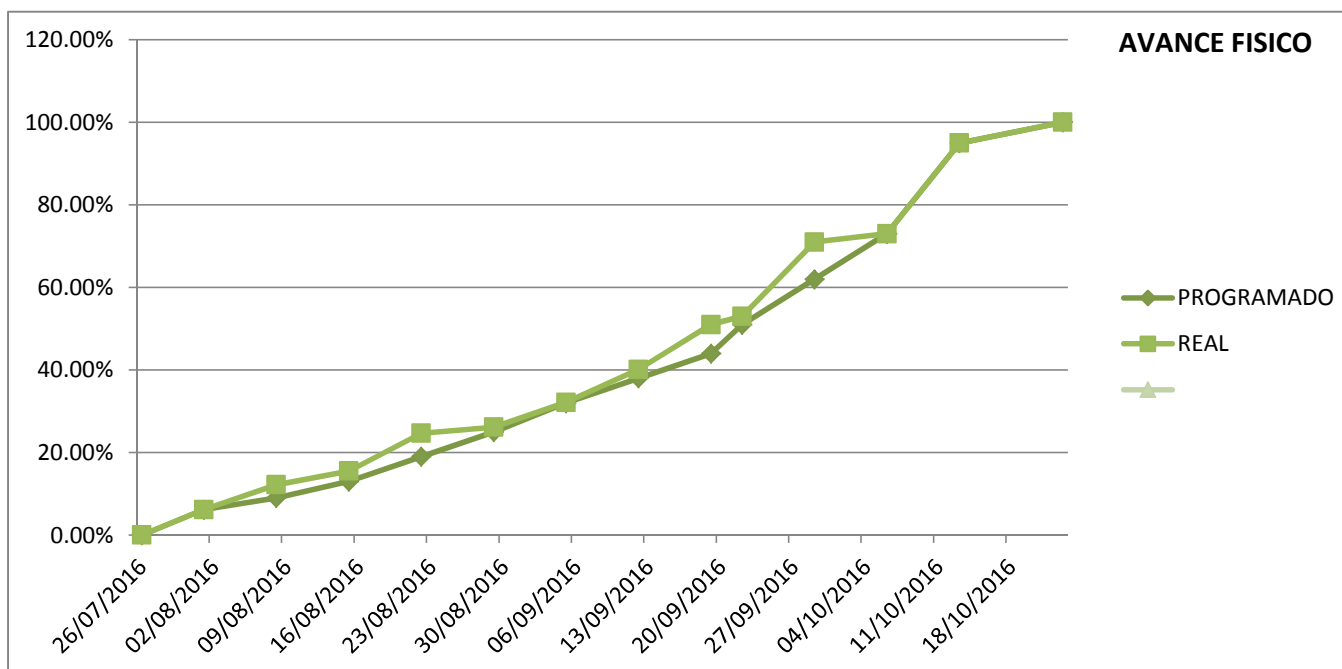

#### MONTO DEL CONTRATO

	PROGRAMADO	REAL
26/07/2016	0.00%	0.00%
01/08/2016	6.19%	6.19%
08/08/2016	9.00%	12.18%
15/08/2016	13.00%	15.50%
22/08/2016	19.00%	24.70%
29/08/2016	25.00%	26.14%
05/09/2016	32.00%	32.15%
12/09/2016	38.00%	40.15%
19/09/2016	44.00%	51.00%
22/09/2016	51.00%	53.00%
29/09/2016	62.00%	71.00%
06/10/2016	73.00%	73.00%
13/10/2016	95.00%	95.00%
23/10/2016	100.00%	100.00%

DE CONFORMIDAD

REVISÓ

ELABORÓ

ARQ. LUIS MATA LEAL  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. DANIEL SANTILLAN CARRILLO  
 RESIDENTE DE OBRA IMSS

ARQ. DANIEL SANTILLAN CARRILLO
