



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 2-22200019
UNIDAD AMPLIACION 3 CONSULTORIOS DEL HGSZMF No. 12 LINARES NUEVO LEON
TIPO DE OBRA OBRA NUEVA
LOCALIDAD: LINARES
EMPRESA: JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N° :
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

martes, 31 de octubre de 2023
2-22200019-4-20093 N° COMPROMISO: 4
16.11% GLOBAL: 0.00%
18/09/2023 : TERMINO: 12/12/2023

REPORTE FOTOGRAFICO



FOTO No. 1:
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA.- LLEGADA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA - 19-10-2023.

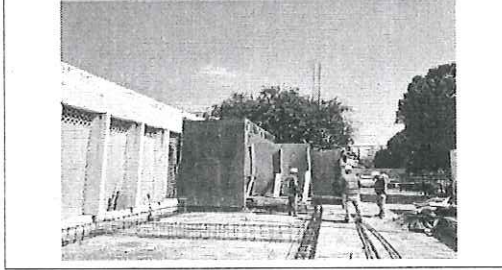


FOTO No. 2:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO TRABES DE CIM.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 24-10-2023



FOTO No. 3
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA.- COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO COLUMNAS.
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 25-10-2023

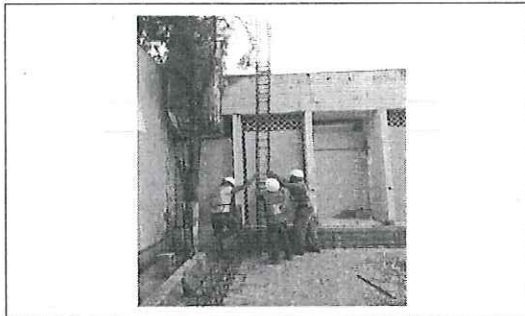


FOTO No. 4:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNA.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 25-10-2023



FOTO No. 5:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- RELLENO CON MATERIAL INERTE BAJO FIRME.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 29-10-2023

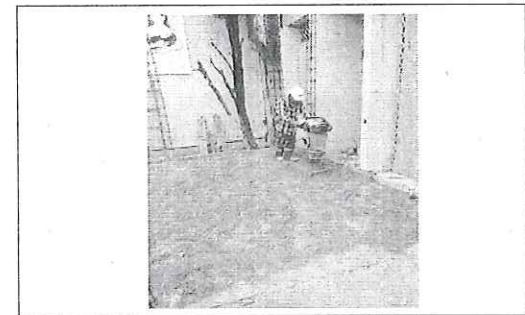


FOTO No. 6:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COMPACTACION DE MATERILA INERTE BAJO FIRME.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 31-10-2023

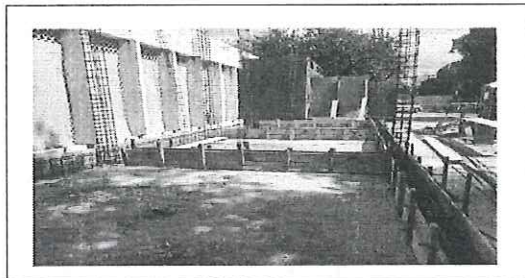


FOTO No. 7:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COLOCACION DE CIMBRA EN TRABES DE CIMENTACION.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 26-10-2023.

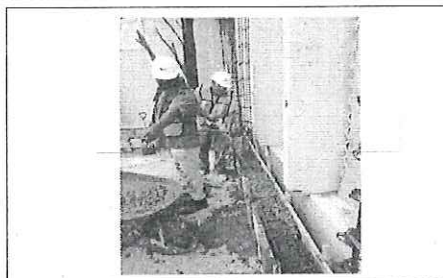


FOTO No. 8:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COLADO DE CONCRETO DE TRABES DE CIMENTACION.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 27-10-2023

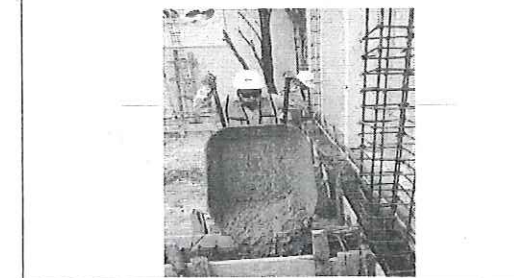


FOTO No. 9:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COLADO DE CONCRETO DE TRABES DE CIMENTACION .
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 27-10-2023

Handwritten signature in blue ink.



IMSS

No. de Obra: 2-22200019
 UNIDAD AMPLIACION 3 CONSULTORIOS DEL HGSMF No. 12 LINARES NUEVO LEON
 TIPO DE OBRA OBRA NUEVA
 LOCALIDAD: LINARES
 EMPRESA: JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ

ACTUALIZADO AL:
 CONTRATO N°:
 AVANCE REAL:
 FECHA DE INICIO:

martes, 31 de octubre de 2023
 2-22200019-4-20093 N° COMPROMISO: 4
 16.11% GLOBAL: 0.00%
 18/09/2023 : TERMINO: 12/12/2023

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

