

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DATOS GENERALES			
N° DE OBRA:	22200022		
UNIDAD:	U.M.F.No.15		
LOCALIDAD:	MONTERREY	DELEGACIÓN	NUEVO LEON
TIPO DE OBRA	SERVICIOS		
DOMICILIO:	AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES PONIENTE S/N, COLONIA MODERNA, C.P. 64530, MONTERREY, NUEVO LEÓN.		

DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	GEOTECNICA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIAS, PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No.15 Y DEMOLICIÓN DE LA CASA DE MAQUINAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JULIO ÁNGEL LÓPEZ MARCELO		
N° DE LICITACIÓN:	IO-50-GYR-050GYR048-N-7-2023		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:			
N° DE CONTRATO:	2-22200022-S-20095		
N° DE COMPROMISO:	S-20095	AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO INICIAL	
FECHA DE INICIO	16/10/2023	PROGRAMADO	100.00%
FECHA DE TERMINO	06/11/2023	REAL	100.00%
MONTO CONTRATADO	\$ 322,251.20	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)	
2DO. CONTRATO		PROGRAMADO	
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA	REAL	
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA		
MONTO CONTRATADO	\$		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	100.00%	100.00%	0.00%

SITUACIÓN FINANCIERA			
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 322,251.20	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 322,251.20	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 322,251.20
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)		INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	1
MONTO POR ESTIMAR (D)		ESTATUS	se encuentra en proceso de revisión
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	100.00%	100.00%	0.00%

AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO			
		PROG.	REAL
CONTRATO INICIAL:	%	100%	\$0.00
CONTRATO INICIAL:	\$	\$322,251.20	\$0.00
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA (DRO)			
EMPRESA:	S.I.A. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
N° DE CONTRATO:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE INICIO:	

CAPACIDAD INSTALADA	
EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.
CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN	
CONSUL. MEDICINA FAM.	
SALAS DE CIRUGIA	
SALAS DE RAYOS X	
PEÑES DE LABORATORIO	
SALAS DE PROC. MIXTOS	
POBLACIÓN BENEFICIADA	

METROS CUADRADOS DE:	
TERRENO:	
CONSTRUCCIÓN:	
OBRA NUEVA:	
AMPLIACIÓN:	
REMODELACIÓN:	
ADECUACIÓN:	
OBRA EXTERIOR:	
ESTACIONAMIENTO:	

ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD	

REQUERIMIENTOS DE CARTERA DE INVERSIÓN	
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE RECURSOS ADICIONALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA VARIACIÓN EN LAS METAS FÍSICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESENTA POSTERGACIÓN QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL?
<input type="checkbox"/> NO	

JUSTIFICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA:	

RESICIÓN	
EMPRESA:	
N° DE LICITACIÓN:	
N° COMPROMISO	
N° CONTRATO:	
AVANCE FÍSICO:	0%
FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.	DD/MM/AA
FECHA DE NOTIFICACIÓN	DD/MM/AA
FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESICIÓN:	DD/MM/AA
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DD/MM/AA
OBSERVACIONES:	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2023



PROBLEMÁTICA RELEVANTE	

OBSERVACIONES:	

ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN	

FUERZA DE TRABAJO:		
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	0
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$ -

M
D



IMSS

No. de Obra: 22200022
 UNIDAD U.M.F.No.15
 TIPO DE OBRA SERVICIOS
 LOCALIDAD: MONTERREY
 EMPRESA: GEOTECNICA Y SUPERVIONTECNICA,S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
 CONTRATO N°:
 AVANCE REAL:
 FECHA DE INICIO:

Viernes, 15 de diciembre de 2023
 2-22200022-S-20095 N° COMPROMISO: S-20095
 100.00% GLOBAL: 0.00%
 16/10/2023 : TERMINO: 06/11/2023

REPORTE FOTOGRAFICO



FOTO No. 1:
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2023



FOTO No. 2:
 5
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2023



FOTO No. 3
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2023



FOTO No. 4:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 5:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 6
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 7:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 8:
 FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023.

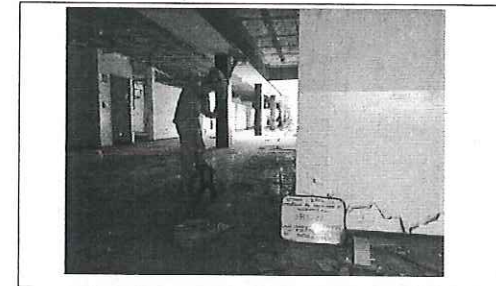


FOTO No. 9:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023

Handwritten signature in blue ink.
