







CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA
 DEL EJECCIÓN ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
 JEFE TURNO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 22200001
 UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
 TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
 LOCALIDAD: 21
 EMPRESA: TGC GEOTECNIA,S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 15 DE JULIO DEL 2024
 CONTRATO N°: 2-22200001-S-20099 N° COMPROMISO: 9-20099
 AVANCE REAL: 100.00% GLOBAL: 0.00%
 FECHA DE INICIO: 21/05/2024 TERMINO: 24/06/2024

DATOS GENERALES				CAPACIDAD INSTALADA				FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024	
N° DE OBRA:	22200001			EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.			REPORTE FOTOGRAFICO  	
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR			CAMAS DE HOSPITALIZACION					
LOCALIDAD:	21	GENERAL ESCOBEDO	NUEVO LEON	CONSUL. MEDICINA FAM.				PREDIO LOCALIZADO  INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 	
TIPO DE OBRA	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)			SALAS DE CIRUGIA					
DOMICILIO:	UBICADO EN LA CALLE JOSE MARIANO ABASOLO No 400 PTE. COL. CENTRO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON.			SALAS DE RAYOS X				PROBLEMATICA RELEVANTE 	
DATOS DEL CONTRATO				PEINES DE LABORATORIO					
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS				SALAS DE PROC. MIXTOS				ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD 	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	TGC GEOTECNIA,S.A. DE C.V.			POBLACIÓN BENEFICIADA					
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAFAEL CRESPO SOSA			METROS CUADRADOS DE					
N° DE LICITACIÓN:	AO-60-GYR-050-GYR048-N-2-2024			TERRENO:					
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACION DIRECTA			CONSTRUCCIÓN:					
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	20/05/2024			OBRA NUEVA:					
N° DE CONTRATO:	2-22200001-S-20099			AMPLIACIÓN:					
N° DE COMPROMISO:	9-20099			REMODELACIÓN:					
FECHA DE INICIO	21/05/2024			ADECUACIÓN:					
FECHA DE TERMINO	24/06/2024			OBRA EXTERIOR:					
MONTO CONTRATADO	\$	354,600.06		ESTACIONAMIENTO:					
AVANCE FISICO DEL CONTRATO INICIAL				ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD					
2DO. CONTRATO	PROGRAMADO								
FECHA DE INICIO	DDMM/AA								
FECHA DE TERMINO	DDMM/AA								
MONTO CONTRATADO	\$	-							
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:								
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:								
SITUACION FINANCIERA									
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$	354,600.06	IMPORTE DE CONVENIO	\$	-	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$	354,600.06	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$	354,600.06	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$	-	MONTO PAGADO	\$	-	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$	-	INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	02 NORMAL					
MONTO POR ESTIMAR (D)	\$	-	ESTATUS	FINANZAS					
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:								
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:								
AVANCE FINANCIERO									
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO									
				PROG.	REAL				
CONTRATO INICIAL:	\$	354,600.06	0.00%						
				REVISION					
				EMPRESA:					
				N° DE LICITACIÓN:					
				N° COMPROMISO:					
				N° CONTRATO:					
				ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES EN PROCESO AL DIA 15 DE JULIO DE 2024 SON LAS SIGUIENTES: Se espera la entrega del trabajo de gabinete y reporte correspondiente					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA**

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
 JEFAATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION RMOCELARIA

IMSS

No. de Obra: 22200001




UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
 TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
 LOCALIDAD: 21
 EMPRESA: TGC GEOTECHIA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
 CONTRATO N°:
 AVANCE REAL:
 FECHA DE INICIO:

15 DE JULIO DEL 2024
 2-22200001-S-20099 N° COMPROMISO: S-20099
 100.00% GLOBAL: 0.00%
 21/05/2024 : TERMINO: 24/06/2024

2DO. CONTRATO			
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA (DRO)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:	DDMM/AA	
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:	DDMM/AA	
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE	0%	
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR	
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA: (UVE)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:	DDMM/AA	
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:	DDMM/AA	
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE	0%	
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR	
SUPERVISION EXTERNA DE OBRA			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:	DDMM/AA	
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:	DDMM/AA	
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE	0%	
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR	

AVANCE FISICO:			
0%			
FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.	DDMM/AA		
FECHA DE NOTIFICACIÓN	DDMM/AA		
FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN:	DDMM/AA		
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DDMM/AA		
OBSERVACIONES:			
EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA OBRA			
	SINO	FECHA / PROG	NOTIVO
ENTREGADA A CONSERVACION:	NO	DDMM/AA	
PUESTA EN OPERACION:	NO	DDMM/AA	
PROQUITADA:	NO	DDMM/AA	
INAUGURADA:	NO	DDMM/AA	
POR QUEEN O QUEENES SE INALICIBO:			
OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.			
NOTA: Se deberán de enviar las caratulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.			

FUERZA DE TRABAJO			
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	OFICIALES: 2 AYUDANTES : 2	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$	-
	LICITADO	\$	-
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:	\$	-
	EQUIPO EN OBRA SVIST.	\$	-
AUDITORIA			
	OIC	de	SFP
No. OBSERVACIONES	0	0	0
ATENDIDAS	0	0	0
OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL CORTE DE AVANCE DE OBRA AL DIA 15 DE JULIO DE 2024			
 ARO. FABIOLA ASFRIO FLORES MENDOZA RESERVA DE OBRA IMSS			
 ARO. JUAN FLORES SANCHEZ OLVERA ENC. DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y FINANZAS			
 ARO. MARCO AIMECA TAMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION RMOCELARIA			



IMSS

No. de Obra: 22200001

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR

TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)

LOCALIDAD: 21

EMPRESA: TGC GEOTECHNIA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:

CONTRATO N°:

AVANCE REAL:

FECHA DE INICIO:

15 DE JULIO DEL 2024

2.22200001-S-20099

N° COMPROMISO: S-20099

100.00%

GLOBAL:

0.00%

21/05/2024

TERMINO:

24/06/2024

REPORTE FOTOGRAFICO



FOTO No. 1:
PROCESO DE TRABAJOS DE GABINETE




FOTO No. 2:
PROCESO DE TRABAJOS DE LABORATORIO




FOTO No. 3
PROCESO DE TRABAJOS DE LABORATORIO




FOTO No. 4:
PROCESOS DE TRABAJOS DE LABORATORIO

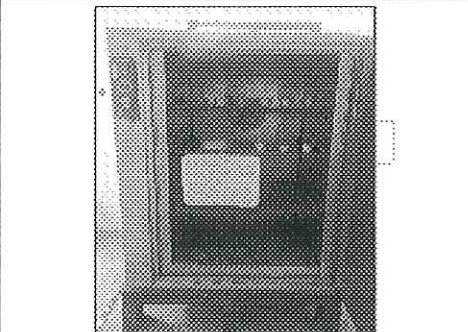


FOTO No. 5:
PROCESOS DE TRABAJOS DE LABORATORIOS



FOTO No. 6:
PROCESOS DE TRABAJO DE LABORATORIOS

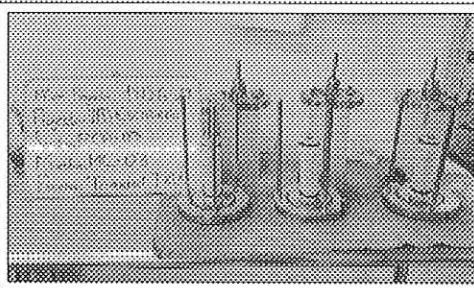


FOTO No. 7:
PROCESOS DE TRABAJOS DE LABORATORIOS

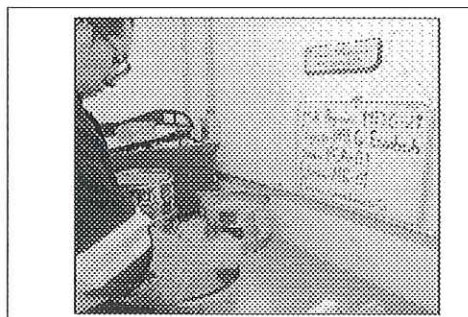


FOTO No. 8:
PROCESO DE TRABAJOS DE LABORATORIOS

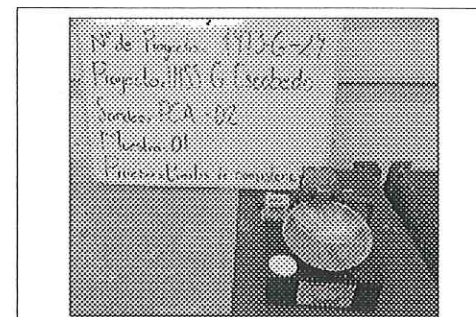


FOTO No. 9:
PROCESO DE TRABAJO DE LABORATORIOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.




MSS

No. de Obra: 22200001
 UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
 TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
 LOCALIDAD: 21
 EMPRESA: TGC GEOTECHNICA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
 CONTRATO N°:
 AVANCE REAL:
 FECHA DE INICIO:

16 DE JULIO DEL 2024		
2-22200001-S-20098	N° COMPROMISO:	S-20098
100.00%	GLOBAL:	0.00%
21/06/2024	TERMINO:	24/06/2024

LOCALIZACION DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

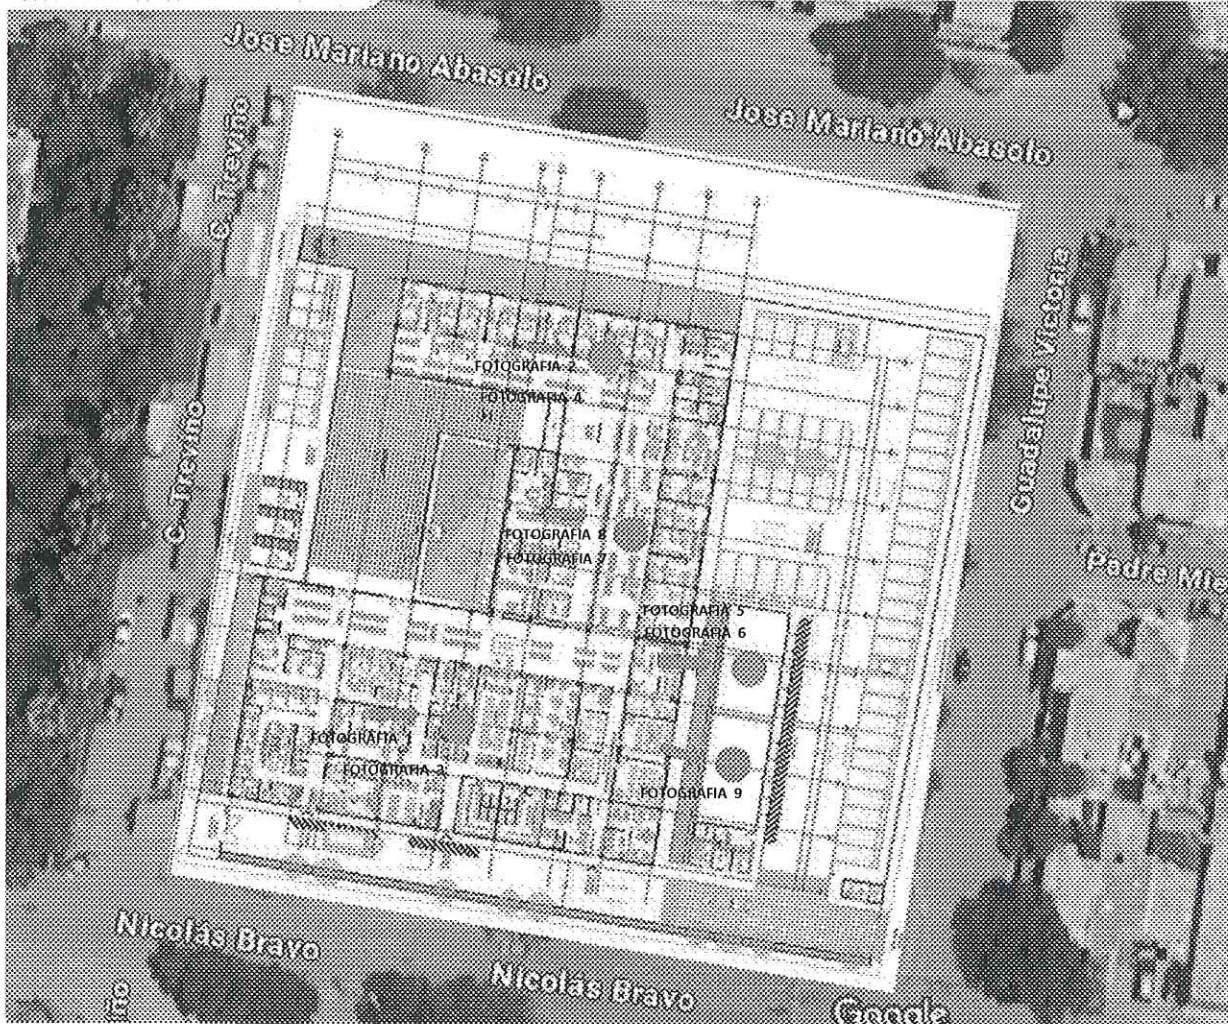

CONTRATO No 2-2200001-S-20098

MECÁNICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS) EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA U.M.F. 10 C. CON AMC, UBICADO EN CALLE JOSE MARIANO ABASOLO NO. 400 PTE., COL. CENTRO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.

2 SONDEOS MIXTOS (SPT) ●

3 POZOS A CIELO ABIERTO ●
