




**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA**

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA  
 JEFA TURNO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION (M)OBLI OBRA

IMSS

No. de Obra: 22200001  
 UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  
 TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)  
 LOCALIDAD: 21  
 EMPRESA: TGC GEOTECNIA,S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 28 DE JUNIO DEL 2024  
 CONTRATO N°: 2-22200001-S-20098  
 AVANCE REAL: 100.00% GLOBAL: 0.00%  
 FECHA DE INICIO: 21/05/2024 TERMINO: 24/06/2024

DATOS GENERALES				CAPACIDAD INSTALADA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2024	
N° DE OBRA:	22200001			EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.	<b>REPORTE FOTOGRAFICO</b> 	
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR			CAMAS DE HOSPITALIZACION			
LOCALIDAD:	21	GENERAL ESCOBEDO	NUEVO LEON	CONSUL. MEDICINA FAM.		<b>PREDIO LOCALIZADO</b> 	
TIPO DE OBRA	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)			SALAS DE CIRUGIA			
UBICADO EN LA CALLE	UBICADO EN LA CALLE JOSE MARIANO ABASOLO No 400 PTE. COL. CENTRO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON.			SALAS DE RAYOS X		<b>INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 	
DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCION DETALLADA DE LOS TRABAJOS		PEINES DE LABORATORIO			
NOMBRE DE LA EMPRESA:	TGC GEOTECNIA,S.A. DE C.V.	"DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS) EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA U.M.F 10+5 C CON AMC, UBICADO EN CALLE JOSE MARIANO ABASOLO No 400 PTE. COL. CENTRO, GENERAL ESCOBEDO ; NUEVO LEON"		SALAS DE PROC. MIXTOS			
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAFAEL CRESPO SOSA			POBLACION BENEFICIADA			
N° DE LICITACIÓN:	AD-60-GYR-050GYR048-N-2-2024			METROS CUADRADOS DE:		TERRENO:	
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACION DIRECTA			CONSTRUCCIÓN:			
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	20/05/2024			OBRA NUEVA:			
N° DE CONTRATO:	2-22200001-S-20098	AMPLIACIÓN:		ADECUACIÓN:			
N° DE COMPROMISO:	S-20098	AVANCE FISICO DEL CONTRATO INICIAL		OBRA EXTERIOR:			
FECHA DE INICIO	21/05/2024	PROGRAMADO	100.00%	ESTACIONAMIENTO:			
FECHA DE TERMINO	24/06/2024	REAL	100.00%	ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD			
MONTO CONTRATADO	\$ 354,600.06	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)		( ) SI (X) NO ¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSION TIENE RECURSOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN LA CARTERA DE INVERSION? ( ) SI (X) NO ¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSION PRESENTA VARIACION EN LAS METAS FISICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSION? ( ) SI (X) NO ¿EL PROGRAMA DE INVERSION PRESENTA POSTERGACION QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL? PROGRAMA RECURSOS PROPIOS.- Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No 0990016B30006B30IP24/176/0932, con fecha de 04 de abril de 2024, emitido por la dirección de finanzas, de conformidad a los acuerdos ACDO.AS3.HCT.12123/539.P.DF.Y ACDO.AS3.HCT.290516/255 P.D.F. emitidos por el H. Consejo Técnico del IMSS			
2DO. CONTRATO		PROGRAMADO					
FECHA DE INICIO	DDMM/AA	REAL					
FECHA DE TERMINO	DDMM/AA						
MONTO CONTRATADO	\$						
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:		<b>ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN</b> LAS ACTIVIDADES EN PROCESO AL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 SON LAS SIGUIENTES: Se espera la entrega del trabajo de gabinete y reporte correspondiente			
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:		<b>RESISION</b> EMPRESA: N° DE LICITACIÓN: N° COMPROMISO: N° CONTRATO:			
SITUACION FINANCIERA		AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL			POR EJECUTAR	
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 354,600.06	IMPORTE DE CONVENIO	\$			0.00%	
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 154,704.97	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 354,600.06				
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -				
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$ -	INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	02 NORMAL				
MONTO POR ESTIMAR (D)	\$ 199,895.10	ESTATUS	ESTIMACION EN REVISION				
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:					
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:					
SITUACION FINANCIERA		AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR			
SITUACION FINANCIERA		100.00%	100.00%	0.00%			
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO							
		PROG.	REAL				
CONTRATO INICIAL:	\$	354,600.06	0.00%				



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTADAL EN BAJA CALIFORNIA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 2220001

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)  
LOCALIDAD: 21  
EMPRESA: TGC GEOTECHNIA,S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 20 DE JUNIO DEL 2024  
CONTRATO N°: 2-22200001-S-20098 N° COMPROMISO: S-20098  
AVANCE REAL: 100.00% GLOBAL: 0.00%  
FECHA DE INICIO: 21/05/2024 TERMINO: 24/06/2024

Table with columns for contract details (2DO. CONTRATO), global information, company details, and progress tracking (AVANCE PROGRAMADO, AVANCE REAL, POR EJECUTAR) for various stages like UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA (UIVE) and SUPERVISION EXTERNA DE OBRA.

Table for physical progress (AVANCE FISICO) and observations (OBSERVACIONES). Includes a table for work status (ENTREGADA A CONSERVACION, PUESTA EN OPERACION, etc.) with columns for status, date, and location.

Table for workforce (FUERZA DE TRABAJO) and observations (OBSERVACIONES). Includes a table for workforce by article and equipment, and a table for observations by type (OIC, de, SFP).

Handwritten signatures and stamps of officials: ANA FABELA ASSIPI RIVERA and ROBERTO A. AMEZCA TAMEZ.

NOTA: Se deberán de enviar las carpetas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.



IMSS

No. de Obra: 22250001  
 UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  
 TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)  
 LOCALIDAD: ZI  
 EMPRESA: TOC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:  
 CONTRATO N°:  
 AVANCE REAL:  
 FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DEL 2024  
 2-22250001-S-20098 N° COMPROMISO: S-20098  
 100.00% GLOBAL: 0.00%  
 21/05/2024 TERMINO: 24/06/2024

**REPORTE FOTOGRAFICO**

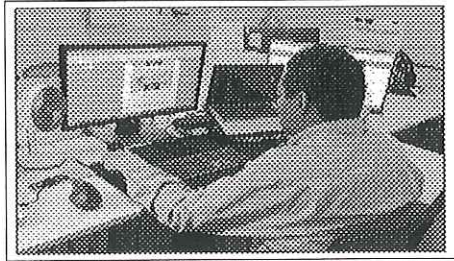


FOTO No. 1:  
 PROCESO DE TRABAJOS DE GABINETE




FOTO No. 2:  
 PROCESO DE TRABAJOS DE LABORATORIO




FOTO No. 3:  
 PROCESO DE TRABAJOS DE LABORATORIO




FOTO No. 4:  
 PROCESOS DE TRABAJOS DE LABORATORIO

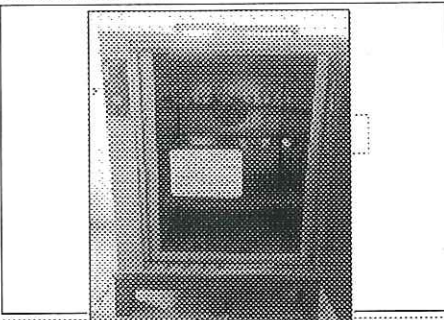


FOTO No. 5:  
 PROCESOS DE TRABAJOS DE LABORATORIOS

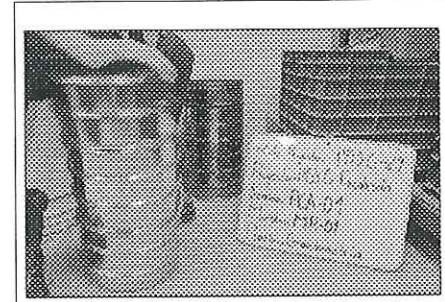


FOTO No. 6:  
 PROCESOS DE TRABAJO DE LABORATORIOS

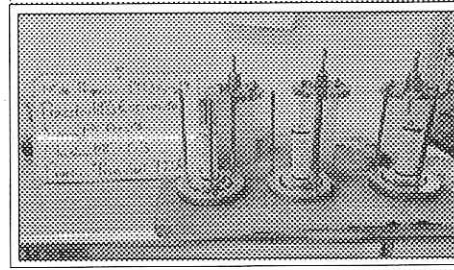


FOTO No. 7:  
 PROCESOS DE TRABAJOS DE LABORATORIOS




FOTO No. 8:  
 PROCESO DE TRABAJOS DE LABORATORIOS




FOTO No. 9:  
 PROCESO DE TRABAJO DE LABORATORIOS

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA**  
 DELEGACION ESTADAL EN BAJA CALIFORNIA  
 SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION URBANARIA


MSS

No. de Obra: 2220001  
 UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  
 TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)  
 LOCALIDAD: 21  
 EMPRESA: TGC GEOTECHASA DE C.V.

ACTUALIZADO AL:  
 CONTRATO N°:  
 AVANCE REAL:  
 FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DEL 2024	
2-2220001-S-20098	N° COMPROMISO: S-20098
100.00%	GLOBAL: 0.00%
21/05/2024	TERMINO: 24/06/2024

**LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS**

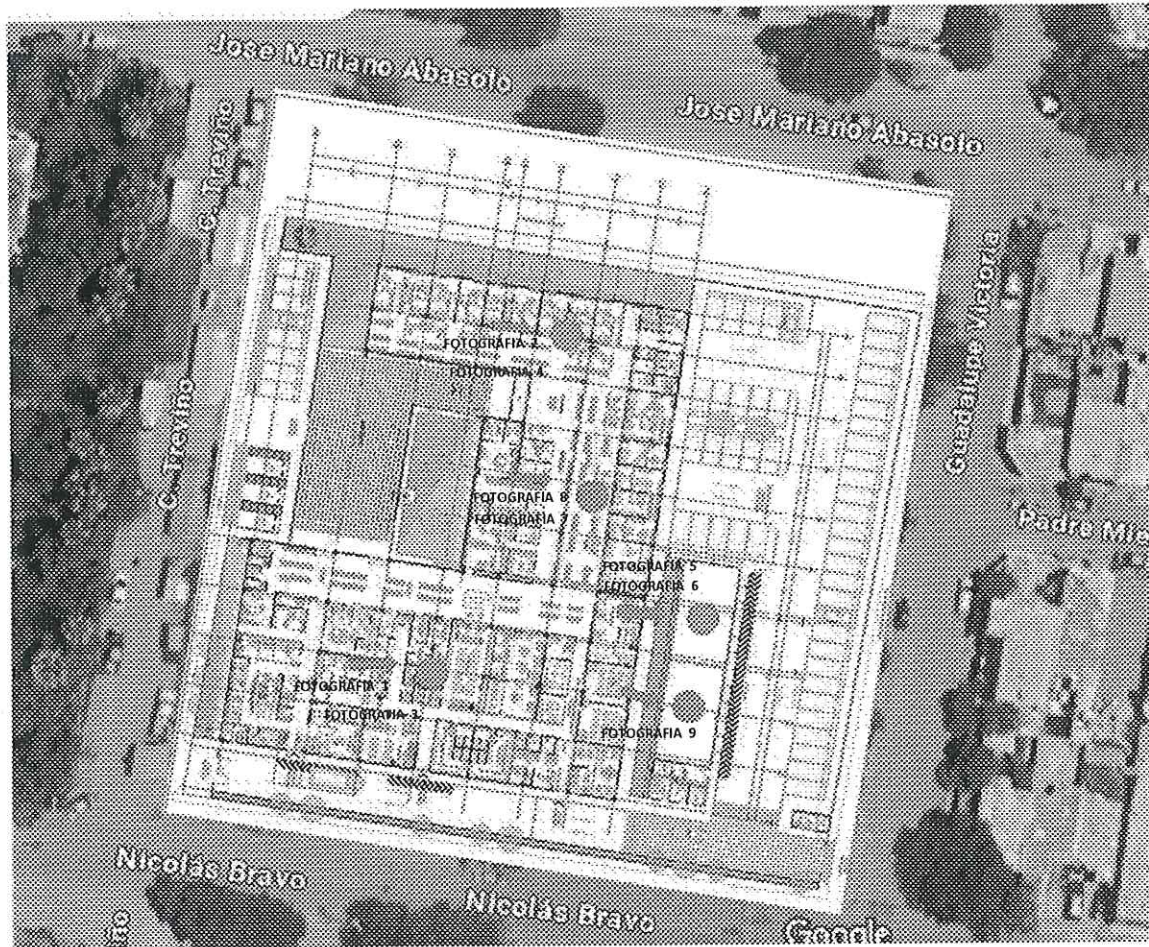

CONTRATO No 2-2200001-S-20098

MECÁNICA DE SUELOS, GEOFISICA Y  
 PAVIMENTOS} EN EL PREDIO  
 PROGRAMADO PARA LA  
 CONSTRUCCIÓN DE UNA U.M.F. ID C.  
 CON AMC, UBICADO EN CALLE JOSE  
 MARIANO ABASOLO NO. 408 PTE., COL.  
 CENTRO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO  
 LEÓN.

- 2 SONDEOS MIXTOS (SPT) ●
- 3 POZOS A CIELO ABIERTO ●

PLANTA UBICACION DE LA OBRA : DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
