



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 22AN002

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:

CONTRATO N°:

AVANCE REAL:

FECHA DE INICIO:

14 DE JUNIO DEL 2024

2-22200020-S-20097

N° COMPROMISO: S-20097

72.00%

GLOBAL: 0.00%

21/05/2024

TERMINO: 24/06/2024

2DO. CONTRATO			
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA (DRO)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACION:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:		DDMM/AA
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:		DDMM/AA
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE		0%
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA (UVIE)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:		DDMM/AA
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO:		DDMM/AA
MONTO CONTRATADO:	AVANCE		0%
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR
SUPERVISION EXTERNA DE OBRA			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:		DDMM/AA
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO:		DDMM/AA
MONTO CONTRATADO:	AVANCE		0%
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR

AVANCE FISICO:		0%	
FECHA DE RESCISION/SUSP.		DDMM/AA	
FECHA DE NOTIFICACION		DDMM/AA	
FECHA DE RESOLUCION DE RESICION:		DDMM/AA	
FECHA DE RENICIO DE LOS TRABAJOS:		DDMM/AA	
OBSERVACIONES:			
EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA OBRA			
SING		FECHA / PROG	ACTIVO
ENTREGADA A CONSERVACION	NO	DDMM/AA	
PUESTA EN OPERACION	NO	DDMM/AA	
FINQUITADA	NO	DDMM/AA	
HAJOURADA	NO	DDMM/AA	
POR CUEN O QUIENES SE SUSPENDIO:			
OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.			
NOTA: Se deberán de enviar las caratulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.			

FUERZA DE TRABAJO			
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	OFICIALES: 0 AYUDANTES: 0	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$	-
	LICITADO	\$	-
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:	\$	-
	EQUIPO EN OBRA SINIST.	\$	-
AUDITORIA			
	OIC	de	SFP
Nº. OBSERVACIONES	0	0	0
ATENDIDAS	0	0	0
OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL CORTE DE AVANCE DE OBRA AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024			
 ARO. TADYLA ASTORIO ROSA MENDOZA PRESIDENTE DE CEF-IMSS  ARO. JUAN CARLOS SANCHEZ OLIVERA DFC DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y FINQUITAS  PROYECTO ARIEGA TAMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA			



IMSS

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA
DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

14 DE JUNIO DEL 2024
N° COMPROMISO: S-20097
72.00% GLOBAL: 0.00%
21/05/2024 TERMINO: 24/06/2024

REPORTE FOTOGRAFICO




FOTO No. 1:
PROCESO DE TOMAS DE MUESTRAS

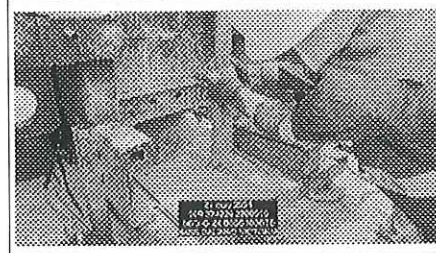


FOTO No. 2:
PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS



FOTO No. 3:
INSTALACION DE EQUIPO

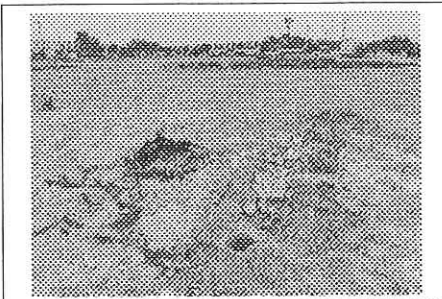


FOTO No. 4:
SECCION DE TOMA DE MUESTRAS DE SONDEO MIXTO (SPT)




FOTO No. 5:
SECCION DE TOMA DE MUESTRAS DE SONDEO MIXTO (SPT)

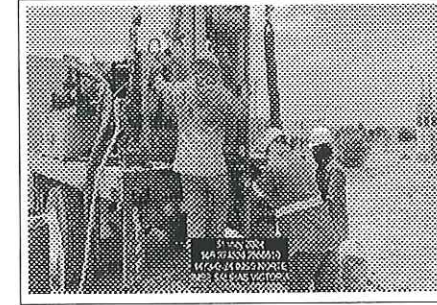


FOTO No. 6:
TRABAJOS DE TOMAS DE MUESTRAS



FOTO No. 7:
TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRAS CON MEDICION DE PROFUNDIDADES.



FOTO No. 8:
TRABAJOS DE TOMAS DE MUESTRAS Y MEDICION DE MATERIALES.




FOTO No. 9:
TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LOS POZOS DE CIELO ABIERTO.

Handwritten signature in blue ink.



IMSS


No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TOC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

14 DE JUNIO DEL 2024

2-22200020-S-20097	N° COMPROMISO:	S-20097
72.00%	GLOBAL:	0.00%
21/05/2024	TERMINO:	24/05/2024

LOCALIZACION DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

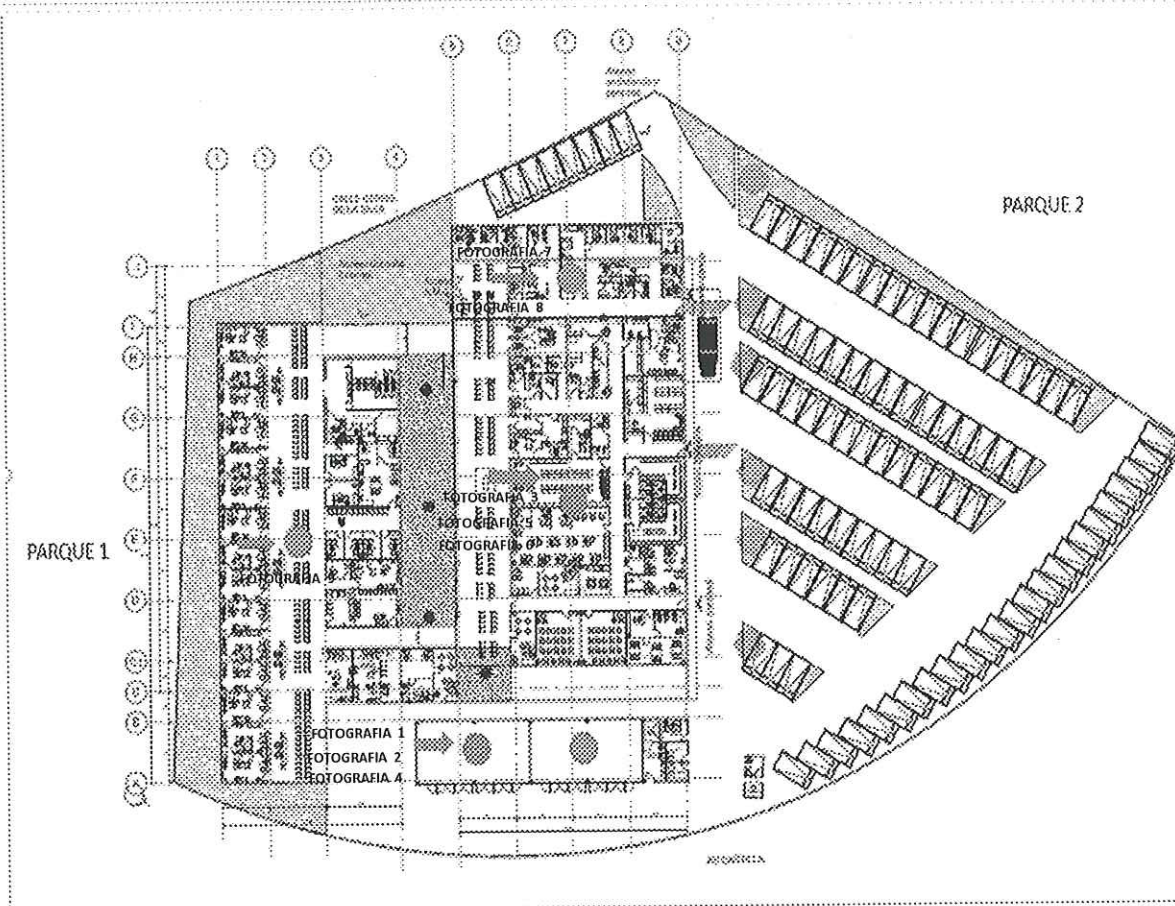

CONTRATO No 2-22000020-S-20097

MECÁNICA DE SUELOS, GEOFISICA Y
PAVIMENTOS) EN EL PREDIO
PROGRAMADO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA U.M.F. 10 C.
CON AMC, UBICADO EN AVE. CERRO D:
LA SILLA No 102, FRACC BOSQUES DE
CASTILLA; C.P. 65515; SAJUNAS VICTORI;
NUEVO LEÓN.

2 SONDEOS MIXTOS (SPT) ●

3 POZOS A CIELO ABIERTO ●

PLANTA UBICACION DE LA OBRA : DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
