



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA



DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION / INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

15 DE JULIO DEL 2024
N° COMPROMISO: S-20097
GLOBAL: 0.00%
TERMINO: 24/06/2024

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DE OBRA				
DATOS GENERALES		CAPACIDAD INSTALADA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024
N° DE OBRA:	22200020	EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.	REPORTE FOTOGRAFICO  
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR	CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN		
LOCALIDAD:	21	CONSUL. MEDICINA FAM.		
TIPO DE OBRA	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)	SALAS DE CIRUGIA		
DOMICILIO:	UBICADO EN AV. CERRO DE LA SILLA No 102, FRACC. BOSQUES DE CASTILLA, C.P. 65515, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON.	SALAS DE RAYOS X		PREDIO A DESARROLLAR  
		PEINES DE LABORATORIO		
		SALAS DE PROC. MIXTOS		PROBLEMÁTICA RELEVANTE
		POBLACIÓN BENEFICIADA		
DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS		PROGRAMA RECURSOS PROPIOS. - Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No 0990016830006B3002P241540767, con fecha de 27 de marzo de 2024, emitido por la dirección de finanzas, de conformidad a los acuerdos ACDO AS3 HCT.121223/339 P.D.F. Y ACDO AS3 HCT.280918/255 P.D.F., emitidos por el H. Consejo Técnico del IMSS
NOMBRE DE LA EMPRESA:	TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	MÉTROS CUADRADOS DE		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAFAEL CRESPO SOSA	TERRENO:		
N° DE LICITACIÓN:	AO-60-GYR-050GYR048-N-1-2024	CONSTRUCCIÓN:		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACION DIRECTA	OBRA NUEVA:		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	20/05/2024	AMPLIACIÓN:		
N° DE CONTRATO:	2-22200020-S-20097	REMODELACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	S-20097	ADECUACIÓN:		
FECHA DE INICIO	21/05/2024	OBRA EXTERIOR:		
FECHA DE TERMINO	24/06/2024	ESTACIONAMIENTO:		
MONTO CONTRATADO	\$ 354,584.10	ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD		
2DO. CONTRATO				
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA			
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA			
MONTO CONTRATADO	\$ -			
N° DE CONVENIO:				
N° DE CONVENIO:				
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR	
100.00%		100.00%	0.00%	
SITUACIÓN FINANCIERA				
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 354,584.10	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -	
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 354,584.10	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 354,584.10	
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -	
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$ -	INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	02 NORMAL	
MONTO POR ESTIMAR (D)	\$ -	ESTATUS	FINANZAS	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR	
100.00%		100.00%	0.00%	
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO				
CONTRATO INICIAL:		PROG.	REAL	
	\$ 354,584.10		0.00%	



DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y ELABORACION DE BOQUINA

No. de Obra: 22796970

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:

CONTRATO N°:

AVANCE REAL:

15 DE JULIO DEL 2024

2-22200020-5-20097

N° COMPROMISO:

100,00%

GLOBAL:

TERMINO:	24/05/2024
----------	------------

2DO. CONTRATO

GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)

DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA (DRO)

EMPRESA:

N° DE CONTRATO:

N° DE COMPROMISO:

MONTO CONTRATADO:

MONTO TOTAL ESTIMADO

N° DE CONVENIO:

N° DE CONVENIO:

HASTA ESTIMACIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:

AVANCE

TIPO DE CONVENIO:

TIPO DE CONVENIO:

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE REAL

POR EJECUTAR

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (UVE)

EMPRESA:

N° DE CONTRATO:

N° DE COMPROMISO:

MONTO CONTRATADO:

MONTO TOTAL ESTIMADO

N° DE CONVENIO:

N° DE CONVENIO:

HASTA ESTIMACIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:

AVANCE

ESTATUS

TIPO DE CONVENIO:

TIPO DE CONVENIO:

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE REAL

POR EJECUTAR

SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA

EMPRESA:

N° DE CONTRATO:

N° DE COMPROMISO:

MONTO CONTRATADO:

MONTO TOTAL ESTIMADO

N° DE CONVENIO:

N° DE CONVENIO:

HASTA ESTIMACIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:

AVANCE

ESTATUS

TIPO DE CONVENIO:

TIPO DE CONVENIO:

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE REAL

POR EJECUTAR

AVANCE FÍSICO:

0%

FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.

DDMM/AA

FECHA DE NOTIFICACIÓN

DDMM/AA

FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN:

DDMM/AA

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:

DDMM/AA

OBSERVACIONES:

EN QUE SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA OBRA

ENTREGADA A CONSERVACIÓN

NO

DDMM/AA

PUESTA EN OPERACIÓN

NO

DDMM/AA

FINALIZADA

NO

DDMM/AA

INAUGURADA

NO

DDMM/AA

¿POR QUÉ O BUENOS SE INAVIÓLORO?

OBSERVACIONES: LA SITUACIÓN DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.

FUERZA DE TRABAJO

ARTÍCULOS:

FUERZA DE TRABAJO

OFICIALES : 2

AYUDANTES : 2

EQUIPAMIENTO:

POR LICITAR

\$ -

LICITADO

\$ -

IMPORTE DE:

MATERIAL EN OBRA:

\$ -

EQUIPO EN OBRA SINIST.

\$ -

AUTOTRABA

OIC

de

SFP

Na. OBSERVACIONES

0

0

0

ATENDIDAS

0

0

0

OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL CORTE DE AVANCE DE OBRA AL DÍA 15 DE JUNIO DE 2024

ANO. FABIOLA ASTIBIO FLORES BARRIOA

PRESENTE DE COMANDANTE

ANO. JUAN FREDY SANCHEZ OLIVERA

ENC. DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y ENTREGAS

ANO. MANUEL ANTONIO TAPIA

JEFE DEL DESPACHO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN DE OBRA

NOTA: Se deberán de enviar las cartulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que a las 15:00 horas del día.



IMSS

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INGENIERIA

Nº de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TOC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

15 DE JULIO DEL 2024
2-22200020-S-20097 N° COMPROMISO: S-20097
100.00% GLOBAL: 0.00%
21/05/2024 TERMINO: 24/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO

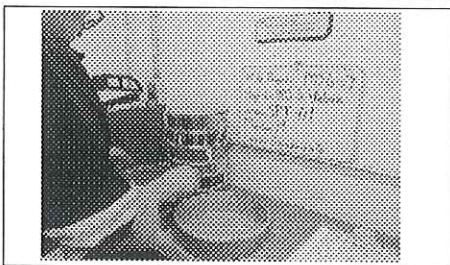


FOTO No. 1:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

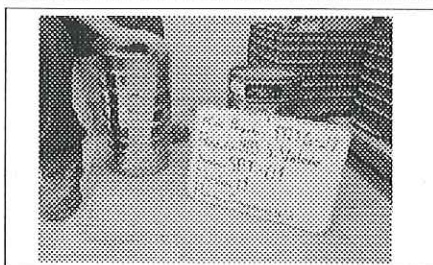


FOTO No. 2:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS




FOTO No. 3:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

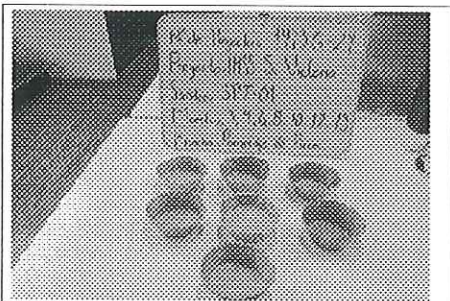


FOTO No. 4:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

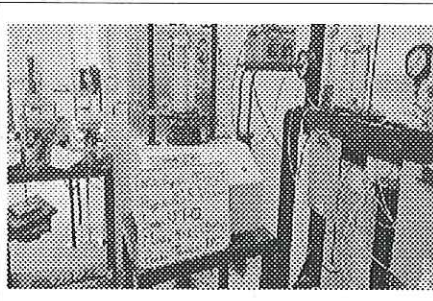


FOTO No. 5:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

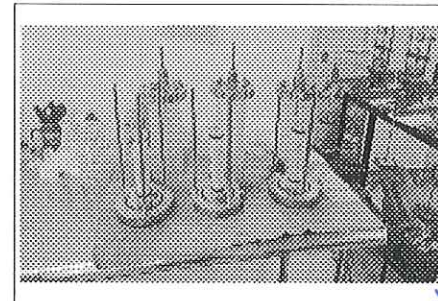


FOTO No. 6:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

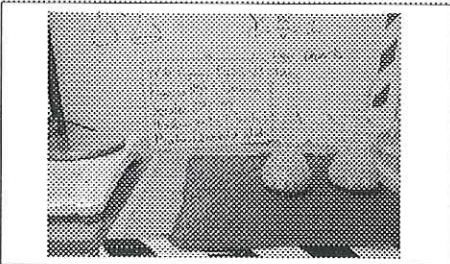


FOTO No. 7:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS




FOTO No. 8:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS




FOTO No. 9:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

Handwritten signature and initials in blue ink.



IMSS


No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TOC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

15 DE JULIO DEL 2024

2-22200020-S-20097	N° COMPROMISO:	S-20097
100.00%	GLOBAL:	0.00%
21/05/2024	TERMINO:	24/06/2024

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

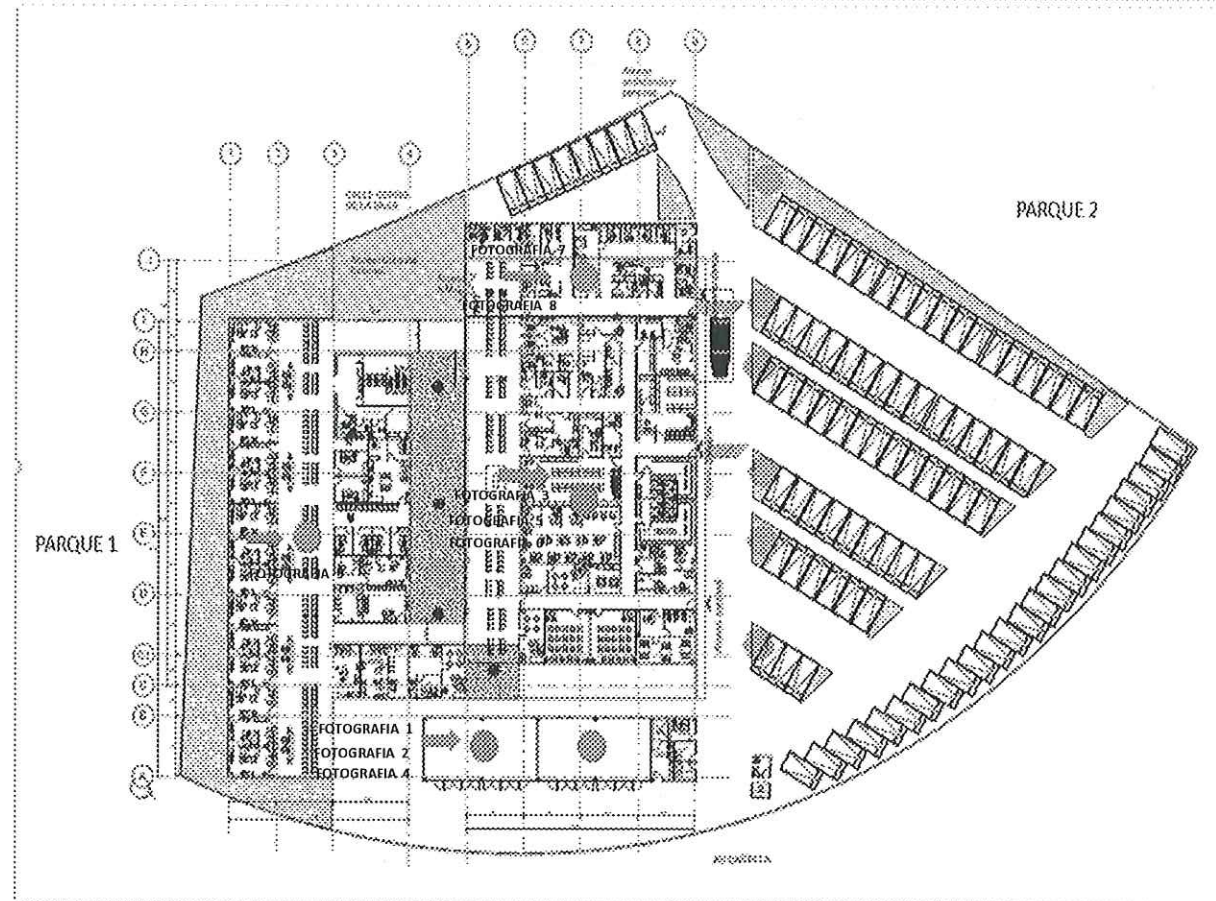

CONTRATO No 2-22000020-S-20097

MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS) EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA U.M.F. 10 C. CON AMC, UBICADO EN AVE. CERRO D. LA SILLA No 102, FRACC BOSQUES DE CASTILLA; C.P. 65515; SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON.

2 SONDEOS MIXTOS (SPT)

3 POZOS A CIELO ABIERTO
