



DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION URBANARIA

No. de Obra: 22200020

UNIDAD UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR

TIPO DE OBRA DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)

LOCALIDAD: 21

EMPRESA: TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:

CONTRATO N° :

AVANCE REAL:

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DEL 2024

2-22200020-S-20097 Nº COMPROMISO: S-20097

100.00%	GLOBAL:	0.00%
---------	---------	-------

21/05/2024	: TERMINO:	24/06/2024
------------	------------	------------

CEQUILA DE INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA

DATOS GENERALES				CAPACIDAD INSTALADA		
N° DE OBRA:	22200020			EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.	
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR			CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN		
LOCALIDAD:	21	SALINAS VICTORIA		CONSUL. MEDICINA FAM.		
TIPO DE OBRA	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)			SALAS DE CIRUGIA		
DOMICILIO:	UBICADO EN AV. CERRO DE LA SILLA No 102, FRACC. BOSQUES DE CASTILLA, C.P. 65516, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON.			SALAS DE RAYOS X		
				PEÑES DE LABORATORIO		
				SALAS DE PROC. MIXTOS		
DATOS DEL CONTRATO				POBLACIÓN BENEFICIADA		
NOMBRE DE LA EMPRESA:	TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.			METROS CUADRADOS DE		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAFAEL CRESPO SOSA			TERRENO:		
N° DE LICITACIÓN:	AO-50-GYR-060GYR049-N-1-2024			CONSTRUCCIÓN:		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACION DIRECTA			OBRA NUEVA:		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	20/05/2024			AMPLIACIÓN:		
N° DE CONTRATO:	2-22200020-S-20097			REMODELACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	S-20097			ADECUACIÓN:		
FECHA DE INICIO	21/05/2024	PROGRAMADO	100.00%	OBRA EXTERIOR:		
FECHA DE TERMINO	24/06/2024	REAL	100.00%	ESTACIONAMIENTO:		
MONTO CONTRATADO	\$ 354,584.10	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)		ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD		
2DO. CONTRATO		PROGRAMADO				
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA					
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA	REAL				
MONTO CONTRATADO	\$ -					
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:		PROGRAMA RECURSOS PROPIOS - Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No 0990016B3006B300DP401640767, con fecha de 27 de marzo de 2024, emitido por la dirección de finanzas, de conformidad a los acuerdos ACDO-AS3-HCT-121223339 P.D.F. Y ACDO-AS3-HCT-280916255 P.D.F. emitidos por el H. Consejo Técnico del IMSS		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:				
	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR			
	100.00%	100.00%	0.00%			
SITUACIÓN FINANCIERA				RESICIÓN		
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 354,584.10	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -	EMPRESA:		
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 154,704.97	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 354,584.10	N° DE LICITACIÓN:		
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -	N° COMPROMISO:		
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$ -	INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	02 NORMAL	N° CONTRATO:		
MONTO POR ESTIMAR (D)	\$ 199,879.14	ESTATUS	ESTIMACION EN REVISIÓN			
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:				
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:				
	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR			
	100.00%	100.00%	0.00%			
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO						
CONTRATO INICIAL:		PROG.	REAL			
	\$ 354,584.10	0.00%				

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2024	
REPORTE FOTOGRÁFICO	
PREDIO A DESARROLLAR	PREDIO A DESARROLLAR
PROBLEMÁTICA RELEVANTE	
ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN	
LAS ACTIVIDADES EN PROCESO AL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 SON LAS SIGUIENTES: Se espera la entrega del trabajo de gabinete y del reporte correspondiente.	



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION MUNICIPAL

IMSS

No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

29 DE JUNIO DEL 2024
2-22200020-S-20097 N° COMPROMISO: S-20097
100.00% GLOBAL: 0.00%
21/06/2024 TERMINO: 24/06/2024

2DO. CONTRATO			
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA (DRD)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO: DDMM/AA		
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO: DDMM/AA		
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE 0%		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA (UVE)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO: DDMM/AA		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO: DDMM/AA		
MONTO CONTRATADO:	AVANCE 0%		
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR
SUPERVISION EXTERNA DE OBRA			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO: DDMM/AA		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO: DDMM/AA		
MONTO CONTRATADO:	AVANCE 0%		
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	POR EJECUTAR

AVANCE FISICO: 0%			
FECHA DE RESCISIÓN SUSP. DDMM/AA			
FECHA DE NOTIFICACIÓN DDMM/AA			
FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN DDMM/AA			
FECHA DE RENICIO DE LOS TRABAJOS DDMM/AA			
OBSERVACIONES:			
EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA OBRA			
ENTREGADA A CONSERVACION	SINO	FECHA / PROG	ACTIVO
PUESTA EN OPERACION	NO	DDMM/AA	
FINIQUITADA	NO	DDMM/AA	
REABANDONADA	NO	DDMM/AA	
POR QUE NO O BUENES SE REABANDONADO			
OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.			
NOTA: Se deberán de enviar las caratulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.			

FUERZA DE TRABAJO			
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	OFICIALES: 2 AYUDANTES: 2	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$	-
	LICITADO	\$	-
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:	\$	-
	EQUIPO EN OBRA SIN ST.	\$	-
AUDITORIA			
	OIC	de	SFP
No. OBSERVACIONES	0	0	0
ATENDIDAS	0	0	0
OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL CORTE DE AVANCE DE OBRA AL DIA 29 DE JUNIO DE 2024			
ARO. FABIOLA ASTOR FLORES HENDON RESIDENTE DE OBRAS			
ARO. JUAN SOTE SANCHEZ OLIVERA ENC. DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y TENDIDOS			
ARO. MARCO ANTONIO TAMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION MUNICIPAL			



IMSS

No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

29 DE JUNIO DEL 2024
N° COMPROMISO: S-20097
GLOBAL: 0.00%
TERMINO: 24/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO

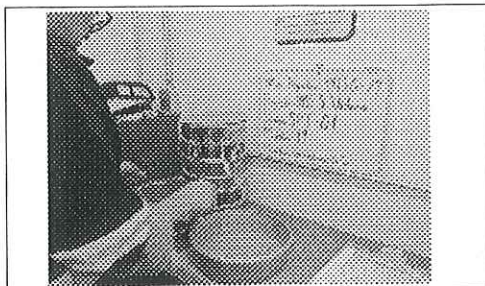


FOTO No. 1:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS




FOTO No. 2:
PROCESO DE TRABAJOS DE PRUEBAS

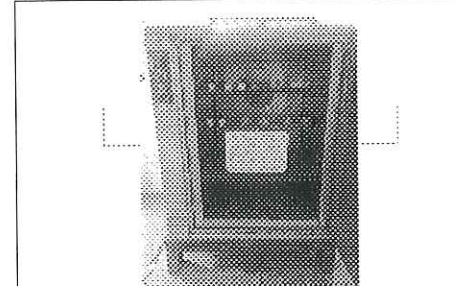


FOTO No. 3:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

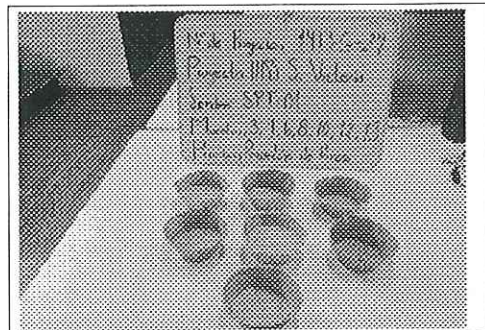


FOTO No. 4:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

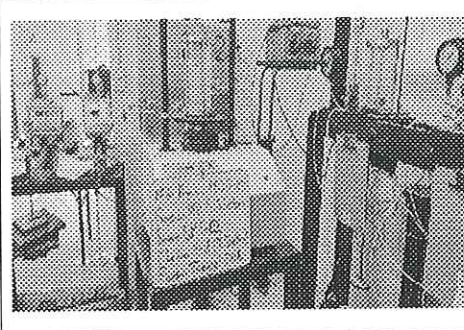


FOTO No. 5:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

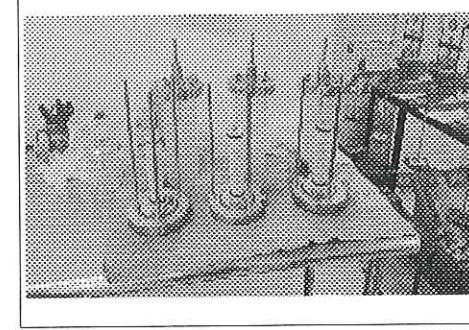


FOTO No. 6:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS




FOTO No. 7:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

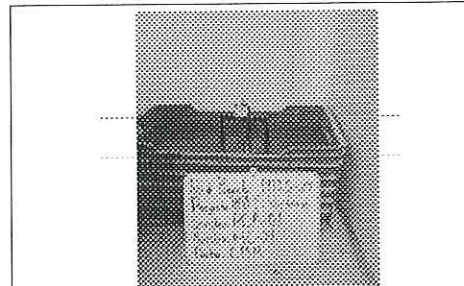


FOTO No. 8:
PROCESO DE TRABAJO DE PRUEBAS

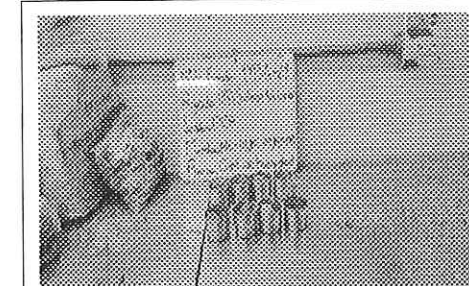


FOTO No. 9:
PROCESO DE TRABAJOS DE PRUEBAS

Handwritten blue ink marks, including a large 'X' and a signature.



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION URBANITARIA

IMSS


No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DEL 2024

2-22200020-S-20097	N° COMPROMISO:	S-20097
100.00%	GLOBAL:	0.00%
21/06/2024	TERMINO:	24/06/2024

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

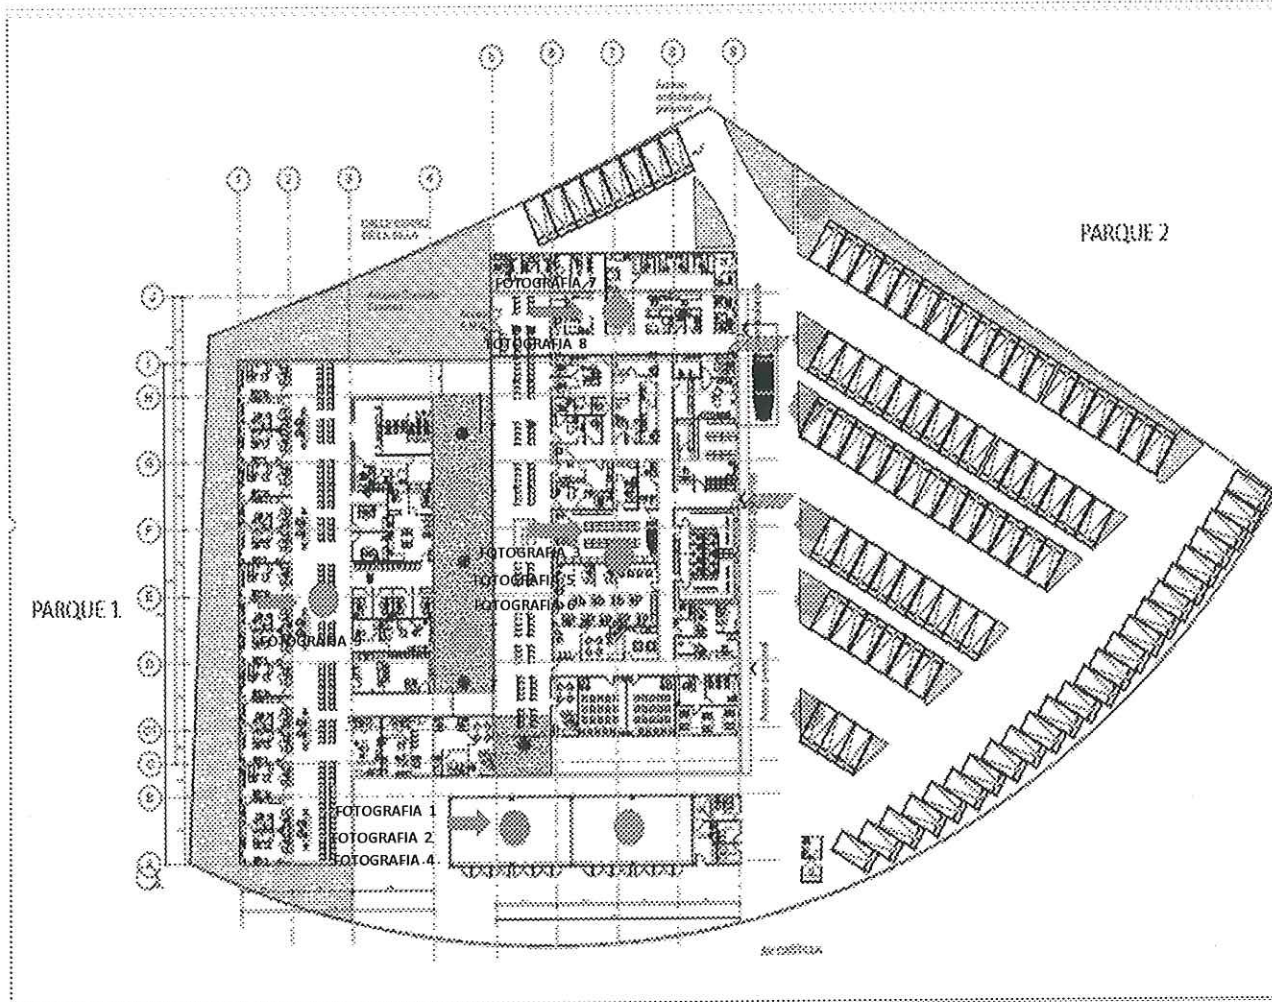

CONTRATO No 2-22000020-S-20097

MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y
PAVIMENTOS) EN EL PREDIO
PROGRAMADO PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA U.M.F. 10 C.
CON AMC, UBICADO EN AVE. CERRO DE
LA SILLA No 102, FRACC BOSQUES DE
CASTILLA; C.P. 65315; SALINAS VICTORIA
NUEVO LEON.

2 SONDEOS MIXTOS (SPT) ●

3 POZOS A CIELO ABIERTO ●
