

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES			
N° DE OBRA:	2220022		
UNIDAD:	UNIDAD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDICA		
LOCALIDAD:	MONTERREY	DELEGACIÓN	NUEVO LEON
TIPO DE OBRA	SERVICIOS		
DOMICILIO:	AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES PTE. S/N, COLONIA MODERNA, C.P. 64530, MONTERREY, NUEVO LEÓN		

CAPACIDAD INSTALADA		
	EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.
CAMAS DE HOSPITALIZACION		
CONSUL. MEDICINA FAM.		
SALAS DE CIRUGIA		
SALAS DE RAYOS X		
PEINES DE LABORATORIO		
SALAS DE PROC. MIXTOS		
POBLACIÓN BENEFICIADA		



DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A DE C.V.	*SONDEOS DE EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRUEBA DE PERMEABILIDAD DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS EXISTENTES (MECÁNICA DE SUELOS), PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 15 Y DEMOLICIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS, UBICADA EN AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES PTE. S/N, COLONIA MODERNA, C.P. 64530, MONTERREY, NUEVO LEÓN*.	
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JULIO ANGEL LOPEZ MARCELO		
N° DE LICITACIÓN:	AO-50-GYR-050GYR048-N-3-2024.		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACIÓN DIRECTA		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	08/10/2024		
N° DE CONTRATO:	2-22200022-S-20099		
N° DE COMPROMISO:	S-20099	AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO INICIAL	

METROS CUADRADOS DE:		
TERRENO:		
CONSTRUCCIÓN:		
OBRA NUEVA:		
AMPLIACIÓN:		
REMODELACIÓN:		
ADECUACIÓN:		
OBRA EXTERIOR:		
ESTACIONAMIENTO:		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO INICIAL			
FECHA DE INICIO	09/08/2024	PROGRAMADO	100.00%
FECHA DE TERMINO	30/08/2024	REAL	100.00%
MONTO CONTRATADO	\$ 127,748.00	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)	
2DO. CONTRATO			
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA	PROGRAMADO	
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA	REAL	
MONTO CONTRATADO	\$		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	

ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD	

AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	100.00%	100.00%	0.00%

REQUERIMIENTOS DE CARTERA DE INVERSIÓN	
() SI () NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE RECURSOS ADICIONALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
() SI () NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA VARIACIÓN EN LAS METAS FÍSICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
() SI () NO	¿EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESENTA POSTERGACIÓN QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL?

SITUACIÓN FINANCIERA			
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 127,748.00	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 127,748.00	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 127,748.00
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)		INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	1
MONTO POR ESTIMAR (D)	0.00	ESTATUS	EN PROCESO DE PAGO
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	

JUSTIFICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA:	

AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	100.00%	100.00%	0.00%

RESICIÓN		
EMPRESA:		
N° DE LICITACIÓN:		
N° COMPROMISO		
N° CONTRATO:		
AVANCE FÍSICO:	0%	
FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.	DD/MM/AA	
FECHA DE NOTIFICACIÓN	DD/MM/AA	
FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESICIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DD/MM/AA	
OBSERVACIONES:		

AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO			
		PROG.	REAL
CONTRATO INICIAL:	%	\$ 127,748.00	\$0.00
CONTRATO INICIAL:	%	100.00%	0.00%
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			

DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA. (DRO)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE INICIO:	

PROBLEMÁTICA RELEVANTE
EN PROCESO DE FINIQUITO DE OBRA.

ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN

FUERZA DE TRABAJO:		
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$ -



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN NUEVO LEON
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 22200022
UNIDAD: UNIDAD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDICA
TIPO DE OBRA: SERVICIOS
LOCALIDAD: MONTERREY
EMPRESA: Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
2-22200022-S-20099 N° COMPROMISO: S-20099
100.00% GLOBAL: 0.00%
09/08/2024 : TERMINO: 30/08/2024

REPORTE FOTOGRAFICO



FOTO No. 1:

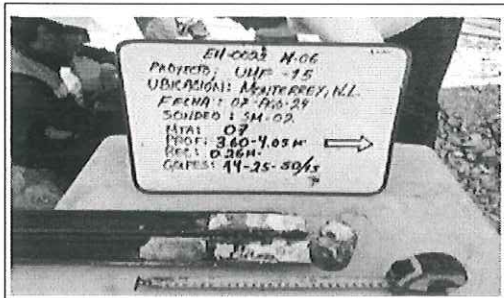


FOTO No. 2:



FOTO No. 3



FOTO No. 4:
SALA DE ESPERA
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO No. 5:



FOTO No. 6



FOTO No. 7:

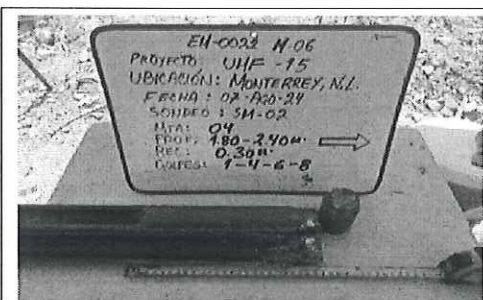


FOTO No. 8:



FOTO No. 9:

Handwritten signatures and initials in blue ink.
