




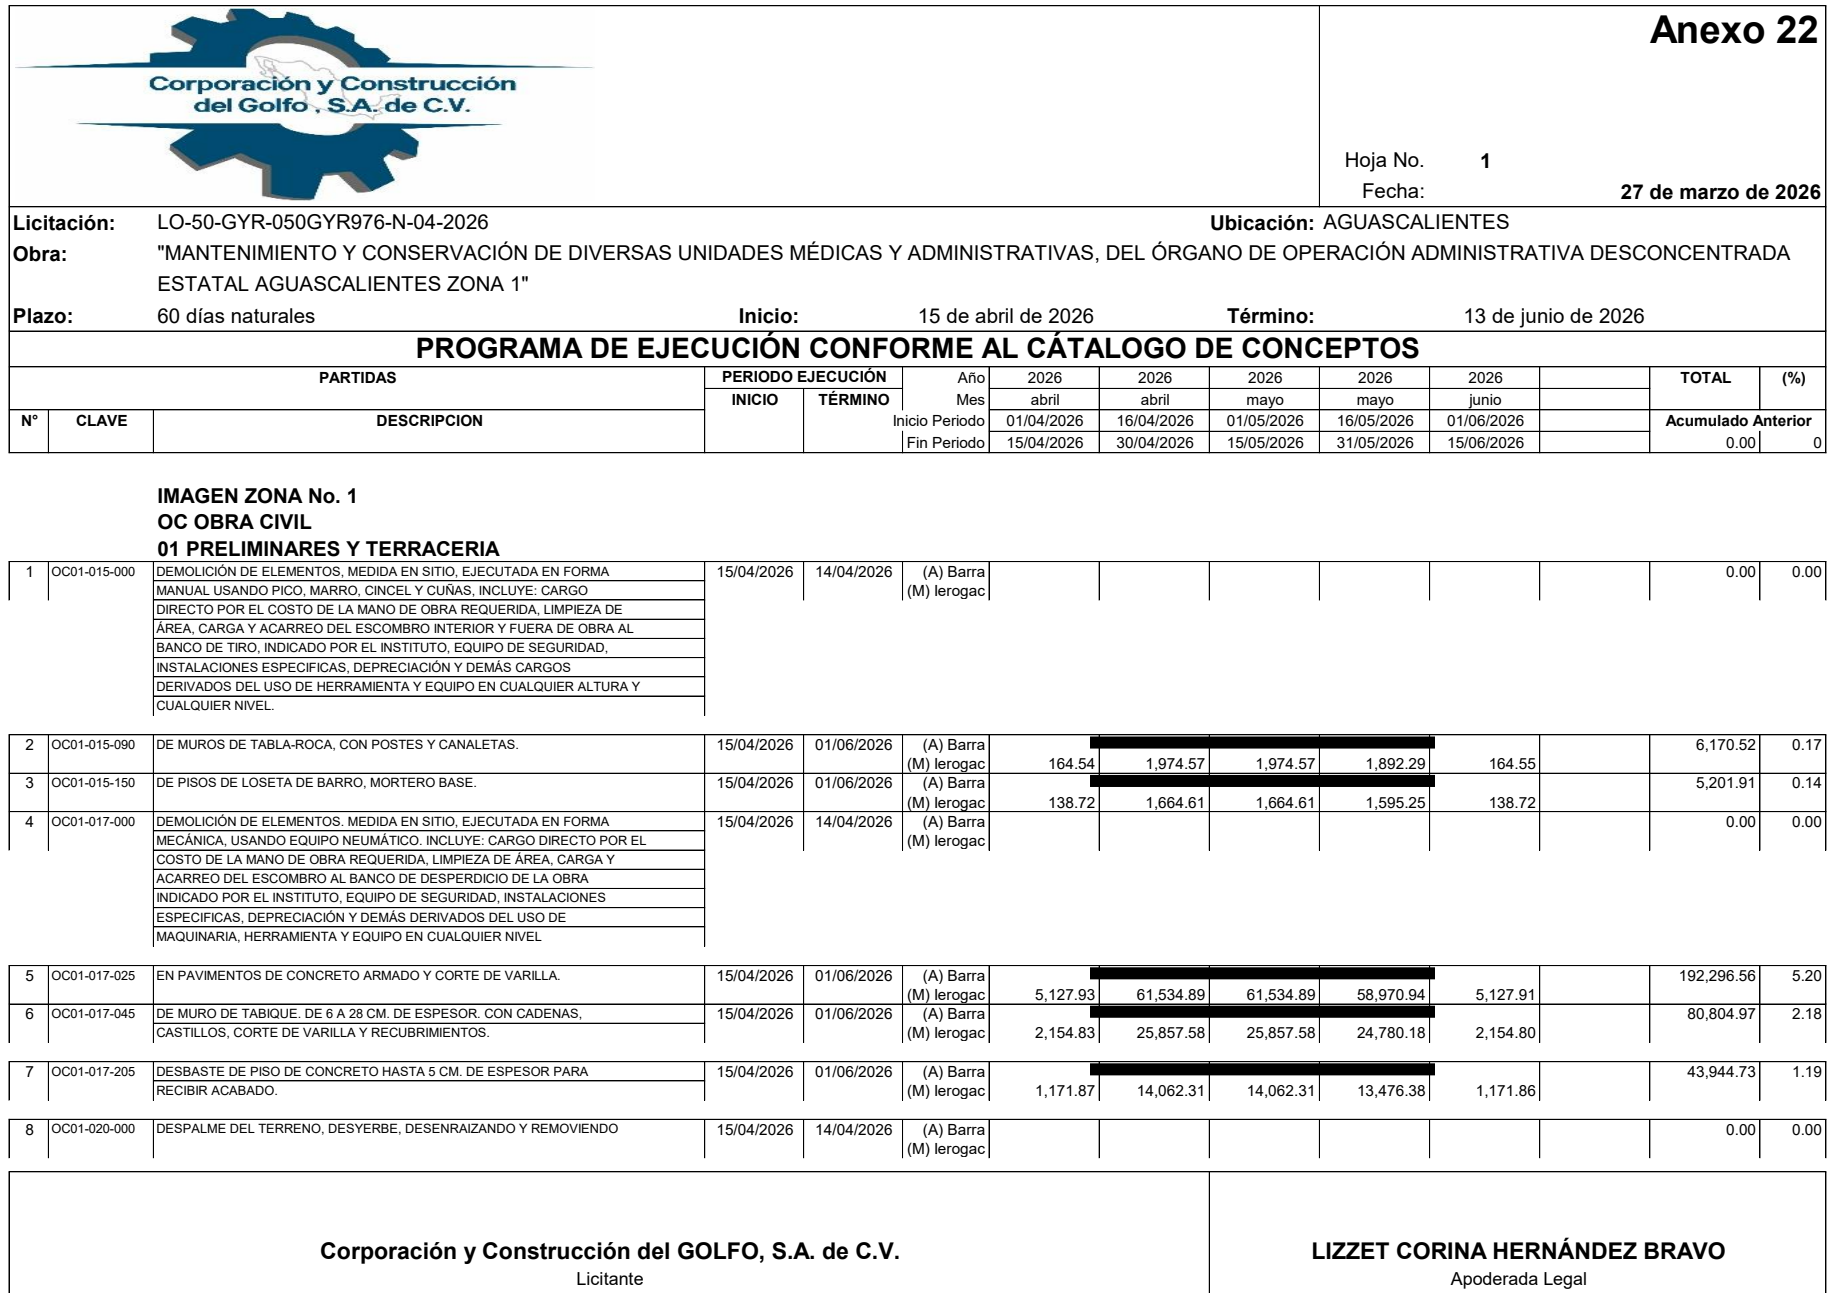

Anexo 22

Hoja No. 2

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)	
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	328,418.69	8.88

CAPA VEGETAL DE 20 A 30 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, JUNTA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO O SEÑALADO EN EL PROYECTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

9	OC01-020-010	POR MEDIO MECÁNICO.	15/04/2026	01/06/2026	(A) Barra						5,618.26	0.15
10	OC01-045-000	EXCAVACIÓN EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMÉS Y EXTRACCIÓN DE ADEMÉS, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	15/04/2026	14/04/2026	(M) lerogac	149.83	1,797.84	1,797.84	1,722.93	149.82	0.00	0.00
11	OC01-045-020	POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B", CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	15/04/2026	01/06/2026	(A) Barra						60,327.89	1.63
					(M) lerogac	1,608.76	19,304.92	19,304.92	18,500.55	1,608.74		
12	OC01-070-000	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra						0.00	0.00
					(M) lerogac							
13	OC01-070-010	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE DE LA LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA.	15/04/2026	01/06/2026	(A) Barra						53,843.08	1.46
					(M) lerogac	1,435.82	17,229.78	17,229.78	16,511.88	1,435.82		

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1320



Anexo 22

Hoja No. 3

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	DESCRIPCION	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026					TOTAL	(%)			
				INICIO	TÉRMINO		2026 abril	2026 abril	2026 mayo	2026 mayo	2026 junio					
						Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior				
						Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	448,207.92	12.12			

14	OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac							0.00	0.00
15	OC01-085-010	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.	15/04/2026	01/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	1,647.36	19,768.16	19,768.16	18,944.49	1,647.35		61,775.52	1.67
16	OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	15/04/2026	01/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	3,483.97	41,807.59	41,807.59	40,065.61	3,483.97		130,648.73	3.53
17	OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	15/04/2026	01/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	7,485.19	89,822.31	89,822.31	86,079.71	7,485.19		280,694.71	7.59
18	OC01-105-000	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac							0.00	0.00
19	OC01-105-010	EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	15/04/2026	01/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	48.00	575.94	575.94	551.94	48.00		1,799.82	0.05
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
20	OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'c=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.	17/04/2026	16/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 4

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	DESCRIPCION	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026					TOTAL	(%)					
				INICIO	TÉRMINO		2026											
							2026	2026	2026	2026	2026							
						Inicio Periodo	2026	2026	2026	2026	2026	Acumulado Anterior						
						Fin Periodo	2026	2026	2026	2026	2026							
21	OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.		17/04/2026	03/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		15,334.31	16,728.33	16,031.32	4,182.08	52,276.04	1.41					
22	OC02-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'y=4200 KG/CM2.) EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		17/04/2026	16/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00					
23	OC02-035-045	Nº 3 A.R. EN CIMENTACIÓN.		17/04/2026	03/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		10,340.40	11,280.43	10,810.41	2,820.11	35,251.35	0.95					
24	OC02-035-055	Nº 4 A.R. EN CIMENTACIÓN.		17/04/2026	03/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		938.12	1,023.00	980.37	255.76	3,197.25	0.09					
25	OC02-035-095	Nº 2 EN ESTRUCTURA.		17/04/2026	03/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		473.61	516.03	494.53	129.01	1,613.18	0.04					
26	OC02-035-100	Nº 3 A.R. EN ESTRUCTURA.		17/04/2026	03/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		5,214.15	5,688.09	5,451.08	1,422.02	17,775.34	0.48					
27	OC02-041-000	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3). INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		17/04/2026	16/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00					
28	OC02-041-016	EN MURO DE CISTERNA F'C=350 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.		17/04/2026	03/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		8,371.16	9,132.18	8,751.67	2,283.05	28,538.06	0.77					

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 5

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	DESCRIPCION	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026					TOTAL	(%)			
				INICIO	TÉRMINO		2026	2026	2026	2026	2026					
							Inicio Periodo					Acumulado Anterior				
							Fin Periodo									
04 ALBAÑILERIA																
29	OC04-005-000	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00			
30	OC04-005-025	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac			5,309.54	6,706.79	6,427.34	2,794.49	21,238.16	0.57			
31	OC04-007-000	CADENA DE CONCRETO F'C=300 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00			
32	OC04-007-005	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac			2,237.40	2,826.17	2,708.42	1,177.57	8,949.56	0.24			
33	OC04-007-010	DE 15 X 30 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac			1,672.96	2,113.21	2,025.16	880.50	6,691.83	0.18			
34	OC04-010-000	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00			

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 6

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,098,657.47 29.69

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

35	OC04-010-020	DE 12 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerogac	8,928.72	11,278.39	10,808.46	4,699.33	35,714.90	0.97
36	OC04-010-025	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerogac	179.17	226.30	216.87	94.29	716.63	0.02
37	OC04-012-000	CASTILLO DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerogac					0.00	0.00
38	OC04-012-005	DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerogac	1,908.21	2,410.35	2,309.92	1,004.31	7,632.79	0.21
39	OC04-030-000	ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerogac					0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1324



Anexo 22

Hoja No. 7

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación:

Obra:

Plazo:

LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026
"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"
60 días naturales

Ubicación:

Inicio:

Término:

AGUASCALIENTES
15 de abril de 2026
13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,142,721.79 30.89

DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

40	OC04-030-005	A BASE DE SOLERA EN FORMA DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y DOS VARILLAS DEL Nº 2.5 EN FORMA DE "V" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		3,332.56	4,209.53	4,034.14	1,753.97	13,330.20	0.36
41	OC04-057-000	MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004) LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
42	OC04-057-005	DE 12 CM. DE ESPESOR CON BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM., TIPO INTERMEDIO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		47,741.66	60,305.24	57,792.52	25,127.18	190,966.60	5.16
43	OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
44	OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5. A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		11,475.73	14,495.66	13,891.68	6,039.86	45,902.93	1.24
45	OC04-075-010	CEMENTO ARENA 1:5. A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		19,848.19	25,071.40	24,026.76	10,446.42	79,392.77	2.15

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 8

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes						TOTAL	(%)							
			INICIO	TÉRMINO															
						2026	2026	2026	2026	2026									
						abril	abril	mayo	mayo	junio									
						Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior								
						Fin Periodo	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,472,314.29	39.8							
46	OC04-075-012	CEMENTO-ARENA-GRAVILLA 1:2:3, A PLOMO, ACABADO SERROTEADO 3 CM. DE ESPESOR.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		6,869.12	8,676.78	8,315.25	3,615.33	27,476.48	0.74							
47	OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00							
48	OC04-085-010	DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		2,181.50	2,755.56	2,640.75	1,148.15	8,725.96	0.24							
49	OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00							
50	OC04-095-050	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		3,919.90	4,951.43	4,745.12	2,063.10	15,679.55	0.42							
51	OC04-100-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO,	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00							

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

1326



Anexo 22

Hoja No. 9

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,524,196.28	41.2

HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

52	OC04-100-160	DE 5 CM. DE ESPESOR CON ENDURECEDOR INTEGRAL. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO FINO	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		4,963.34	6,269.46	6,008.23	2,612.27	19,853.30	0.54
53	OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
54	OC04-101-025	FINO TERSO PARA RECIBIR PISO VINÍLICO EN ROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:2.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		3,167.51	4,001.04	3,834.33	1,667.10	12,669.98	0.34
55	OC04-125-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN, PARA DAR PENDIENTES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
56	OC04-125-025	DE CONCRETO CELULAR ULTRA LIGERO (VENTIUM UL DE CEMEX).	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		2,416.41	3,052.31	2,925.13	1,271.79	9,665.64	0.26
57	OC04-163-000	MESETA O DESCANSO DE ESCALERA, DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1327



Anexo 22

Hoja No. 10

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio			
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		1,566,385.20	42.34

OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, ALAMBRE RECOCIDO No. 18, NIVELADO, PERFILADO, CHAFLANES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, CURADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

58	OC04-163-005	DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. ACABADO LAVADO.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		8,038.97	10,154.40	9,731.30	4,231.00		32,155.67	0.87
59	OC04-165-000	ABRIR Y RESANAR HUECO EN LOSAS PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, RESANES, CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., CIMBRA Y DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, CORTE DE VARILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
60	OC04-165-005	DE 20 X 20 CM. DE 10 CM. DE ESPESOR PARA PASO DE INSTALACIONES.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,883.35	7,431.60	7,121.95	3,096.50		23,533.40	0.64
61	OC04-170-000	RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
62	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		6,640.95	8,388.56	8,039.03	3,495.23		26,563.77	0.72
63	OC04-180-000	CIMBRA DE CONTACTO Y DESCIMBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 11

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)			
			INICIO	TÉRMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio					
						Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior			
						Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,648,638.04			
												44.57			

COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18, HABILITADO, CORTES, CHAFLANES, DESMOLDANTE, MOÑOS O PASADORES, SEPARADORES, OBRA FALSA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.


64	OC04-180-005	COMÚN, EN ATRAQUES Y BASES PARA FIJAR TUBERÍAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ACCESORIOS Y EQUIPO.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		1,683.42	2,126.42	2,037.82	886.01	6,733.67	0.18
65	OC04-180-010	APARENTE, EN BASES PARA EQUIPOS.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		190.72	240.89	230.86	100.37	762.84	0.02
66	OC04-185-000	CONCRETO PREMEZCLADO EN BASES, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00
67	OC04-185-005	EN ATRAQUES Y BASES PARA FIJAR TUBERÍAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ACCESORIOS Y EQUIPO.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		932.65	1,177.89	1,128.81	490.79	3,730.14	0.10
68	OC04-185-010	EN BASES PARA EQUIPOS.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		750.64	948.07	908.57	395.03	3,002.31	0.08
69	OC04-190-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN BASES DE EQUIPOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEPARADORES, CALZAS, ELEVACIONES, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18, HABILITADO, GANCHOS,	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

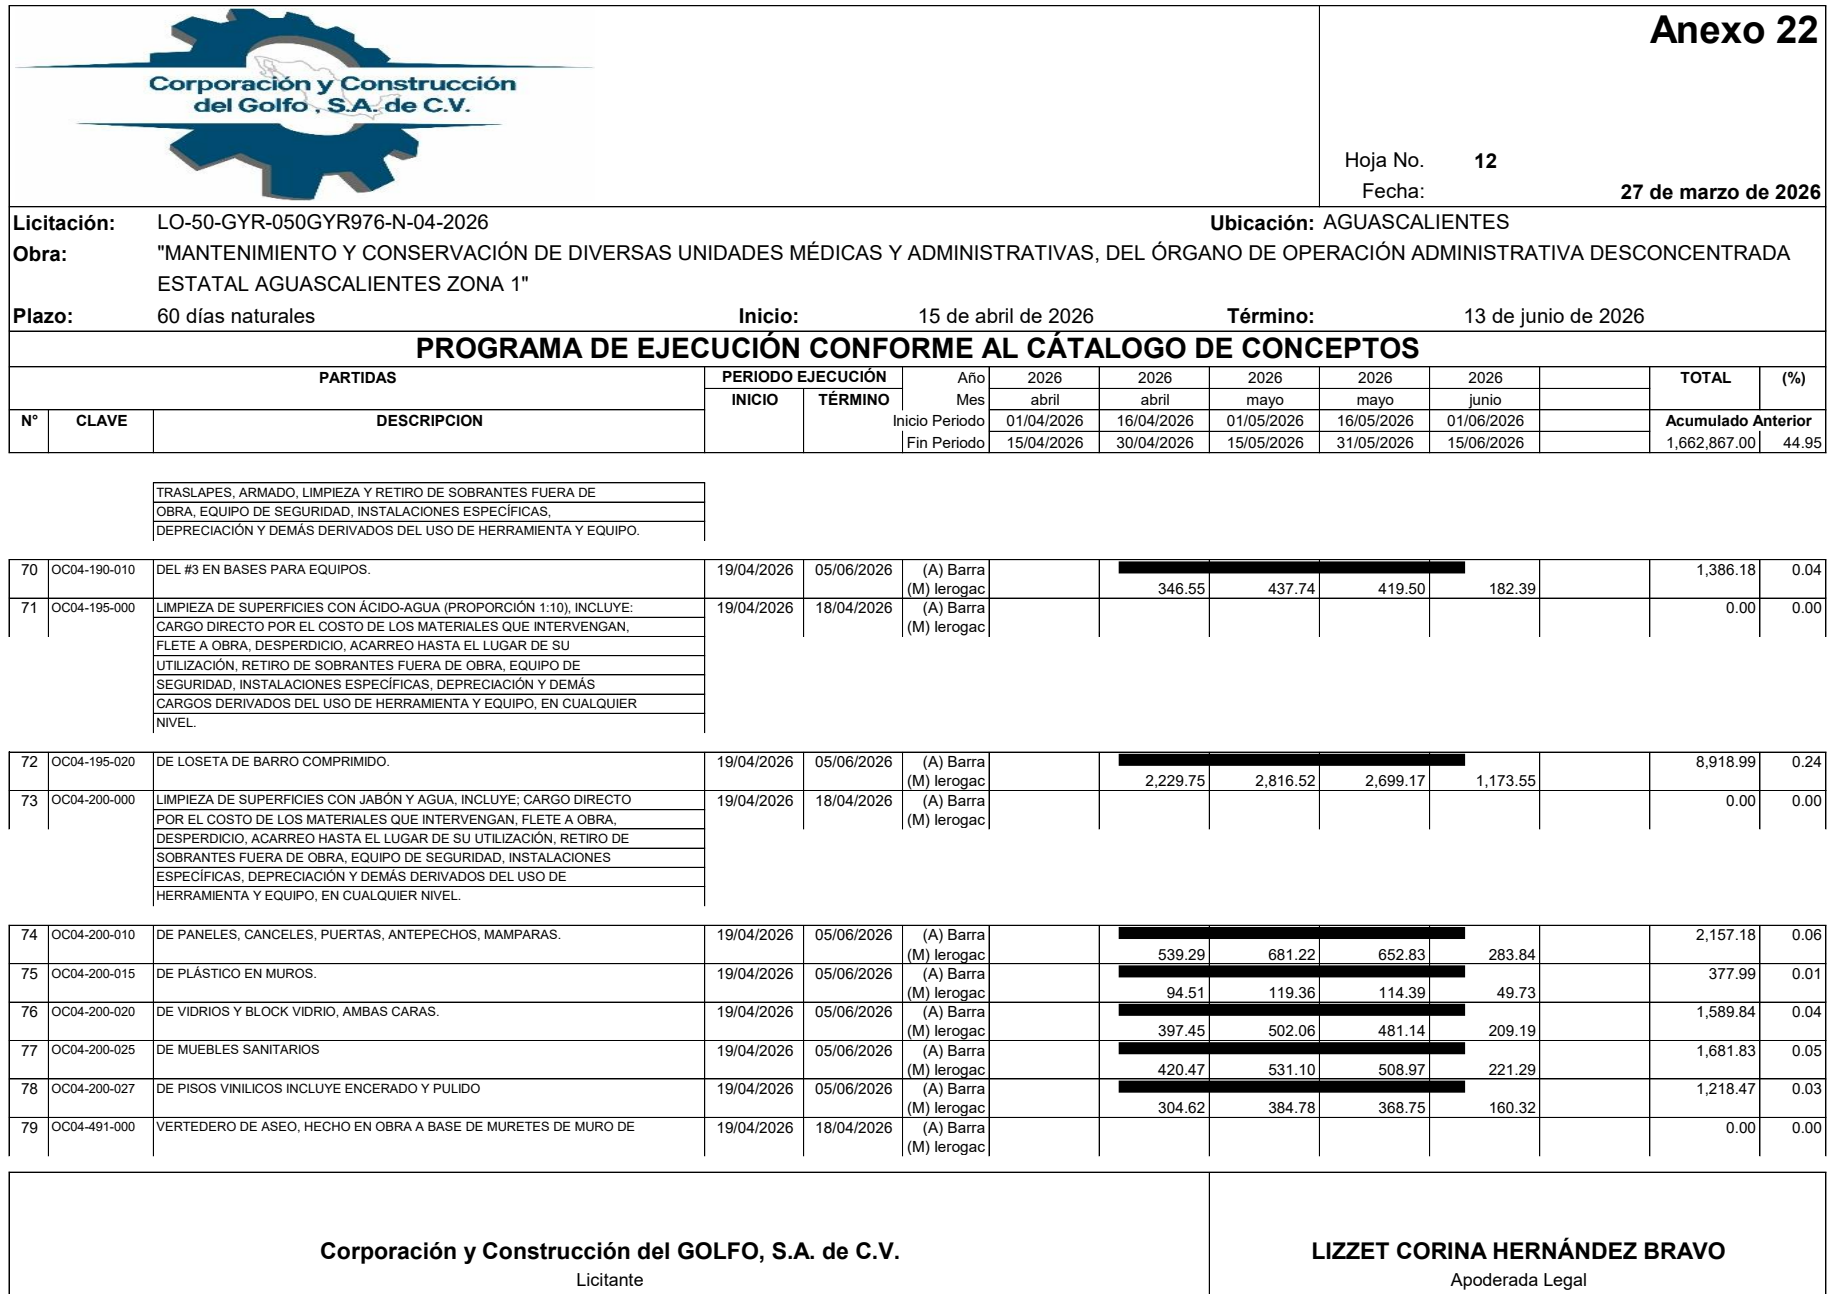



Anexo 22

Hoja No. 13

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,680,197.48	45.42


BLOCK. CON UNA ALTURA DE 0.60 M. EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR DE 0.50 M. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE REMATE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM. CIMBRA COMÚN, DE 15 X 15 CM., RELLENO CON PEDACERÍA DE TABIQUE O GRAVA, CAPA DE MATERIAL INERTE DE 30 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA Y HUMEDECIDA, LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ARMADA CON ACERO DEL No.3 A.R. A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y MORTERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 2 KG/SACO DE CEMENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, RECUBIERTO CON LOSETA SIMILAR AL ACABADO DEL PISO, ASENTADA CON CEMENTO-ARENA 1:5 Y SELLADO CON CEMENTO BLANCO, (ALTURA VERTEDERO DE ASEO 60 CM. AL EXTERIOR Y 50 CM. AL INTERIOR). NOTA: EL PRECIO SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN DE 0.10 M., EN SUS DIMENSIONES EN TODOS LOS SENTIDOS.

80	OC04-491-030	DE 1.40 x 0.70	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerroqac		572.48	723.03	692.91	301.26		2,289.68	0.06
81	OC04-491-035	DE 0.90 x 0.70	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerroqac		710.80	897.72	860.32	374.05		2,842.89	0.08
82	OC04-500-000	NICHO O CUADRO DE VÁLVULAS, HECHO EN OBRA EN MURO DE TABIQUE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRIR CAJA CON CINCEL Y MARTILLO, RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerroqac							0.00	0.00
83	OC04-500-005	DE 30 X 60 CM. LIBRES, EN EL INTERIOR, DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 13 CM., CONSIDERANDO EL APLANADO FINAL.	19/04/2026	05/06/2026	(A) Barra (M) lerroqac		1,284.46	1,622.47	1,554.87	676.03		5,137.83	0.14
84	OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR,	19/04/2026	18/04/2026	(A) Barra (M) lerroqac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

1331

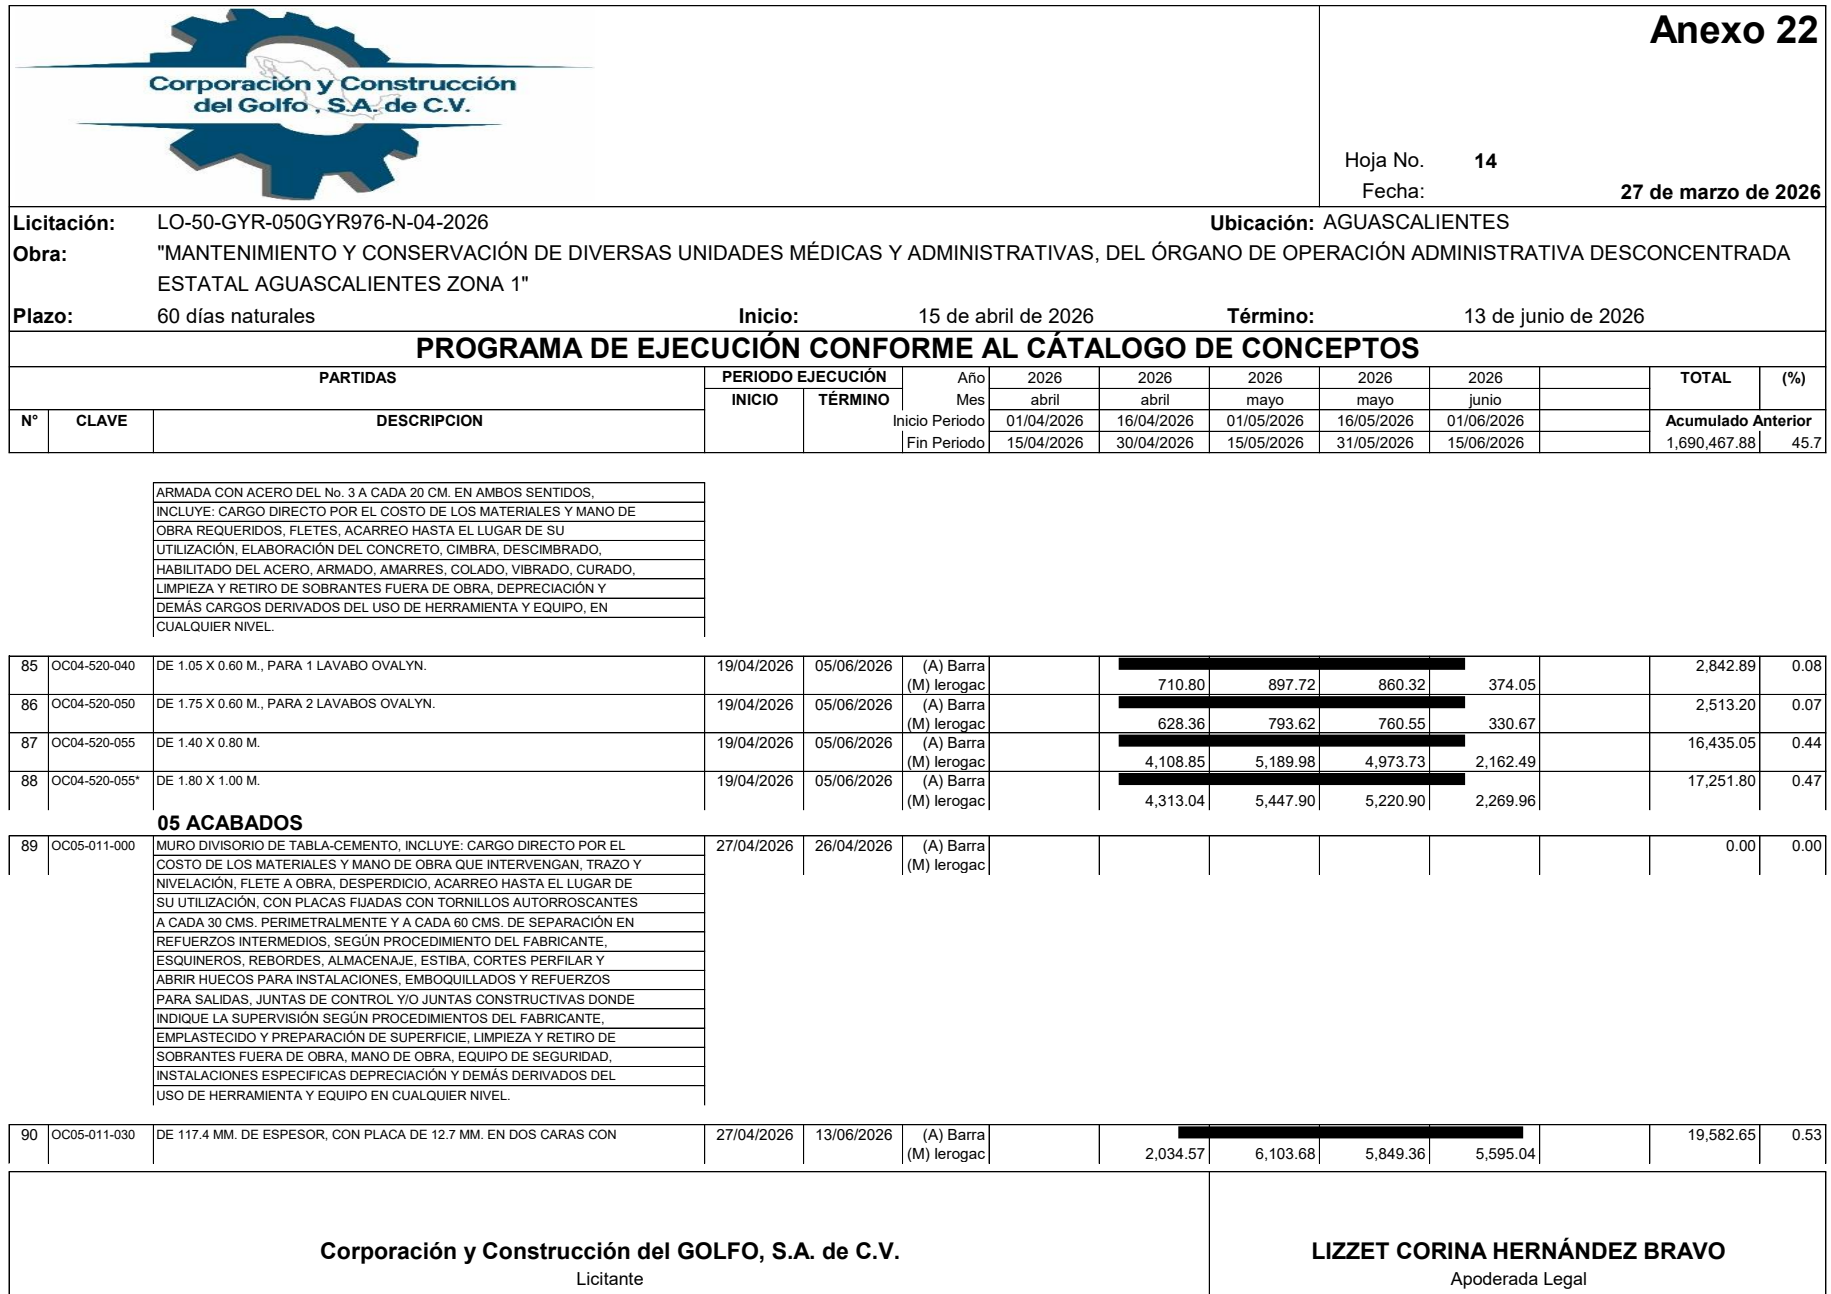



Anexo 22

Hoja No. 15

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,749,093.47	47.29

CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO, PLYCEM.

91	OC05-011-035	DE 177.8 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 152.4 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac		167.65	502.86	481.90	460.95	1,613.36	0.04
92	OC05-011-040	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac		113.55	340.58	326.39	312.20	1,092.72	0.03
93	OC05-021-000	ABRIR HUECO EN TABLA-CEMENTO PARA TABLEROS Y GABINETES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerogac						0.00	0.00
94	OC05-021-005	EN MUROS.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac		22.85	68.52	65.67	62.81	219.85	0.01
95	OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerogac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 16

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,752,019.40 47.37

GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30

M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE

CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR

INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y

NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN ,

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

96	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra						122,703.21	3.32
97	OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	27/04/2026	13/06/2026	(M) lerozac	12,748.38	38,245.16	36,651.61	35,058.06		521.14	0.01
98	OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO, SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzado, PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0. 75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCÓPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 17

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,875,243.75	50.7

INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

99	OC05-035-038	PLAFÓN MODULAR USG CLASS 10 M COLOR BLANCO DE 61 X 61 CM CON SUSPENSIÓN DONN	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		249.54	748.61	717.41	686.22	2,401.78	0.06
100	OC05-053-000	BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
101	OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		1,530.47	4,591.39	4,400.08	4,208.78	14,730.72	0.40
102	OC05-055-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADO CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. No. 12 A CADA 0.90 M., LISTONES METÁLICOS DE 67.8 X 22.2 X 4.2 MM. CON LAMINA GALVANIZADO CAL. No. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADAS A CANALETA DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO No.18, TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA DE REFUERZO, TRAZO, PERFILADO, ESTIBA, ELEVACIÓN, ANGULO DE REBORDE, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, CORTES, HECHURA, NIVELADO, ALMACENAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1335



Anexo 22

Hoja No. 18

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,892,376.25	51.16

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

103	OC05-055-005	HASTA 0.50 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "L" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	58.16	174.45	167.18	159.91		559.70	0.02
104	OC05-055-010	HASTA 1.00 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "L" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	194.87	584.64	560.28	535.92		1,875.71	0.05
105	OC05-055-020	HASTA 1.00 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "U" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	108.47	325.35	311.80	298.24		1,043.86	0.03
106	OC05-055-022	HASTA 2.10 M. DE DESARROLLO EN FORMA "U" TABLA-ROCA 13 MM. DE ESPESOR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	49.37	148.13	141.96	135.79		475.25	0.01
107	OC05-055-031	HASTA 1.50 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "J" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	944.87	2,834.57	2,716.47	2,598.36		9,094.27	0.25
108	OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
109	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	1,770.80	5,312.38	5,091.03	4,869.68		17,043.89	0.46
110	OC05-060-020	CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	2,043.74	6,131.20	5,875.73	5,620.27		19,670.94	0.53

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

1336



Anexo 22

Hoja No. 19

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)			
			INICIO	TÉRMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio					
						Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior			
						Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	1,942,139.87			
												52.51			

TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTO.

111	OC05-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
112	OC05-080-010	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO A CADA 1.22 M. DE CENTRO A CENTRO EN AMBOS SENTIDOS. CON TALADRO DE 1/4" DE DIÁMETRO A 45 GRADOS Y 10 CM. DE PROFUNDIDAD Y ALAMBRÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO A.R. FORMANDO GANCHO.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		151.13	453.39	434.49	415.60		1,454.61	0.04
113	OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
114	OC05-085-170	R-5 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA METALLIC COLOR NICKEL 40 x 40 CM CON JUNTAS DE 3 MM, ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		7,399.15	22,197.45	21,272.56	20,347.66		71,216.82	1.93
115	OC05-085-175	Z-3, Z-6 Y Z-7. RODAPIE DE MÁRMOL TRAVERTINO JALAPA DE 60x60x2 CM H= 0.90 M S.N.P.T. ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR SIMILAR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		887.81	2,663.43	2,552.45	2,441.48		8,545.17	0.23

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 20

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio			
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		2,023,356.47	54.71
116	OC05-103-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
117	OC05-103-010	R-6 PVC EN ROLLO TARKET LÍNEA WALLGARD COLOR WHITE YELLOW 210055 224 ROLLO DE 2 x 20 M Y 2 MM DE ESPESOR, SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINO ASENTADO CON ADHESIVO ACRÍLICO LIBRE DE SOLVENTES 925 RESILIENT ADHESIVE MARCA JOHNSONITE DE TARKETT O SIMILAR EN CALIDAD. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., APLICACIÓN DE SELLOS EPÓXICOS, BASE, AGUA. (DE ACUERDO A DISEÑO INDICADO EN PLANO.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		2,934.51	8,803.49	8,436.68	8,069.87		28,244.55	0.76
118	OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO,	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

						Anexo 22						
Hoja No. 21 Fecha: 27 de marzo de 2026												
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES						
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"												
Plazo: 60 días naturales				Inicio: 15 de abril de 2026				Término: 13 de junio de 2026				
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS												
PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	55.47
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,051,601.02	

RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.												
119	OC05-125-290	P-3 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA JANEIRO COLOR CASTELOS GRAY DE 50 x 50 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP-PLUS.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac							
							5,609.23	16,827.62	16,126.46	15,425.31	53,988.62	1.46
120	OC05-125-295	P-4 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA JANEIRO COLOR COPACABANA WHITE 50 x 50 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP-PLUS, SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac		3,160.41	9,481.23	9,086.17	8,691.12	30,418.93	0.82
121	OC05-125-300	P-5 LOSETA DE MÁRMOL TRAVERTINO JALAPA 60 x 60 x 2 CM COLOCAR SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO COLOCADO A HUESO CON PEGAMARMOL NIASA O SIMILAR SEGUN DESPIECE.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac		1,959.13	5,877.39	5,632.50	5,387.61	18,856.63	0.51
122	OC05-125-305	P-6 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA METALLIC COLOR PEWTER 40 x 40 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP- PLUS, SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac		2,245.34	6,736.00	6,455.33	6,174.67	21,611.34	0.58
123	OC05-125-310	P-7 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA VALPARAISO COLOR SEASHELL GRAY 20 x 20 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP-PLUS, SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerogac		77.30	231.90	222.24	212.58	744.02	0.02
124	OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerogac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---



Anexo 22

Hoja No. 22

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)			
			INICIO	TÉRMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio					
						Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior			
						Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,177,220.56			
												58.86			

ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

125

OC05-133-075

P-10 PVC CONDUCTIVO EN ROLLO TARKET IQ TORO SC COLOR 3093 960 ROLLO DE 2 X 20 M Y 2 MM DE ESPESOR, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO, SECO Y NIVELADO, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTAS SOLDADAS SEGUN ESPECIFICACION DE PROVEEDOR.

27/04/2026

13/06/2026

(A) Barra (M) lerogac

1,334.96

4,004.87

3,838.00

3,671.13

12,848.96

0.35

126

OC05-135-000

ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

27/04/2026

26/04/2026

(A) Barra (M) lerogac

0.00

0.00

127

OC05-135-025

P-8 PVC EN ROLLO TARKET ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 978 ROLLO DE 2 x 20 M Y 2 MM DE ESPESOR COLOCAR SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO, SECO Y NIVELADO, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTAS

27/04/2026

13/06/2026

(A) Barra (M) lerogac

2,728.01

8,183.96

7,842.96

7,501.96

26,256.89

0.71

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 24

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,251,174.05	60.87

EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

132	OC05-210-080	Z-2 ZOCLO DE LOSETA DE MÁRMOL TRAVERTINO JALAPA TRAVERTINO JALAPA 60X10X2 CM H= 0.10 M S.N.P.T. COLOCADO DE MANERA HORIZONTAL ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR SIMILAR.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lero		226.58	679.71	651.39	623.07	2,180.75	0.06
133	OC05-222-000	ZOCLO SANITARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, ADHESIVOS, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lero						0.00	0.00
134	OC05-222-010	Z-4, Z-6 Y Z-7. INTEGRAL A PISO, DE PVC EN ROLLO MARCA TARKET ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 773, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETOCON PEGAMENTO BASE AGUA, CON CURVA SANITARIA, DE 10CM.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lero		779.78	2,339.33	2,241.85	2,144.38	7,505.34	0.20
135	OC05-222-015	Z-5. INTEGRAL A PISO, DE PVC CONDUCTIVO EN ROLLO MARCA TARKET IQ TORO SC 3093 960, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO CON PEGAMENTO BASE AGUA, JUNTAS SOLDADAS SEGUN ESPECIFICACIÓN DE PROVEEDOR Y CON CURVA SANITARIA, DE 10CM.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lero		176.73	530.16	508.07	485.98	1,700.94	0.05
136	OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lero						0.00	0.00
137	OC05-240-120	BARRA DE APOYO EN WC PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD HELVEX 68.6851.23.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lero		260.17	780.51	747.99	715.47	2,504.14	0.07

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

1342



Anexo 22

Hoja No. 25

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)						
			INICIO	TÉRMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio								
						Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior						
						Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,265,065.22						
138	OC05-240-125	BARRA DE APOYO EN WC PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD HELVEX 68.6859.23	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		241.54	724.63	694.44	664.24		2,324.85	0.06					
139	OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3/8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00					
140	OC05-243-195	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 2.70 x 1.80 m. (CON 3 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		3,921.68	11,764.94	11,274.73	10,784.53		37,745.88	1.02					
141	OC05-243-200	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.825 x 1.80 m. (CON 2 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		2,674.02	8,022.02	7,687.77	7,353.52		25,737.33	0.70					
142	OC05-243-205	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac		4,838.05	14,514.00	13,909.25	13,304.50		46,565.80	1.26					

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

						Anexo 22						
Hoja No. 26 Fecha: 27 de marzo de 2026												
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES						
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"												
Plazo: 60 días naturales				Inicio: 15 de abril de 2026				Término: 13 de junio de 2026				
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS												
PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	(%)
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,377,439.08	64.29

DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.45 x 1.80 m. FIJO												
143	OC05-243-210	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.20 x 1.80 m. (CON 1 PUERTA DE 0.61 x 1.50m).	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac							
						3,227.31	9,681.86	9,278.45	8,875.04		31,062.66	0.84
144	OC05-243-215	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.425 x 1.80 m. FIJO	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac						23,282.90	0.63
145	OC05-243-220	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 0.925 x 1.80 m. (CON 1 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac						13,503.48	0.37
146	OC05-243-225	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.80 x 1.80 m. (CON 2 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac						25,512.02	0.69
147	OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---



Anexo 22

Hoja No. 27

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)	
			INICIO	TÉRMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio			
						Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026			
						Fin Periodo	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	Acumulado Anterior		
148	OC05-250-055	R-1. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO, COMEX LÍNEA VINIMEX COLOR AJUAR 008-01.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		3,616.82	10,850.45	10,398.34	9,946.24	34,811.85	0.94	
149	OC05-250-060	R-2. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO, COMEX LÍNEA VINIMEX COLOR MOLY A5-10	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		166.43	499.27	478.47	457.67	1,601.84	0.04	
150	OC05-250-065	R-4. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, COREV LÍNEA SANIPAIN H COLOR F021.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		1,039.47	3,118.36	2,988.43	2,858.50	10,004.76	0.27	
151	OC05-250-070	R-7. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, COMEX LÍNEA VINIMEX COLOR MICROFONO 312-03.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		725.07	2,175.23	2,084.59	1,993.96	6,978.85	0.19	
152	OC05-250-075	PL-2. EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS PINTURA VINIL-ACRÍLICA COMEX VINIMEX COLOR BLANCO.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		1,917.72	5,753.14	5,513.43	5,273.71	18,458.00	0.50	
153	OC05-250-080	PL-5. EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS, COREV LÍNEA SANIPAIN H COLOR F021.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		75.29	225.86	216.45	207.04	724.64	0.02	
154	OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LUADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00	
155	OC05-255-051	EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		813.71	2,441.13	2,339.41	2,237.70	7,831.95	0.21	
156	OC05-255-110	R-8. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, COMEX LÍNEA AQUA 100 TOTAL COLOR MICROFONO 312-03.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		468.59	1,405.74	1,347.17	1,288.60	4,510.10	0.12	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 28

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

N°	CLAVE	PARTIDAS	DESCRIPCION	PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026					TOTAL	(%)				
				INICIO	TÉRMINO		2026 abril	2026 abril	2026 mayo	2026 mayo	2026 junio						
							Inicio Periodo 01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior 2,555,722.13	69.11				
							Fin Periodo 15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026						
157	OC05-255-120	PL-3. EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS, COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO.		27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		402.21	1,206.62	1,156.34	1,106.07	3,871.24	0.10				
158	OC05-255-125	EN ESCALERA MARINA, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO.		27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		10.22	30.67	29.40	28.12	98.41	0.00				
159	OC05-255-130	ANTICORROSIVO, EN CONTRAMARCOS DE LAMINA NEGRA DE HASTA 0.40 M. DE DESARROLLO.		27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		603.74	1,811.21	1,735.74	1,660.27	5,810.96	0.16				
160	OC05-265-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00				
161	OC05-265-020	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO, PARA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y CASA DE MAQUINAS.		27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		95.27	285.81	273.90	261.99	916.97	0.02				
162	OC05-265-045	EN PISOS DE CONCRETO.		27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac		1,318.39	3,955.12	3,790.33	3,625.53	12,689.37	0.34				
163	OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA: CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS), RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS,		27/04/2026	26/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00				

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1346



Anexo 22

Hoja No. 29

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,579,109.08 69.73

Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE. EMPALMES OCULTOS. OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

164	OC05-286-005	DE TELA. 100 % POLIÉSTER.	27/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lero		1,114.42	3,343.18	3,203.88	3,064.58	10,726.06	0.29
165	OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	21/04/2026	20/04/2026	(A) Barra (M) lero						0.00	0.00
166	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No.18, CON HERRAJES.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		5,459.91				5,459.91	0.15
167	OC06-005-045	EN GOTERO, TAPAJUNTAS Y MOLDURA CON PERFIL DE SECCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 22.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		12,411.06				12,411.06	0.34
168	OC06-005-060	EN SOPORTE P/CANCEL, CON PERFIL DE SECC. ESTRUCTURAL., CON ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" EN 1.35 M. ALTO A.C. 1.80 M., CON TIRA DE MADERA DE 1 A 4 X 3/4" S/LABRAR NI CANTE.	21/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) lero		19,270.84				19,270.84	0.52
169	OC06-005-075	EN ESCALERA MARINA DE 40 CM. DE ANCHO, CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, TUBO NEGRO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y ESCALONES A CADA	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		3,382.11				3,382.11	0.09

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1347



Anexo 22

Hoja No. 30

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,630,359.06 71.12
30 CM.											
170	OC06-005-115	PASO PARA CISTERNA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" (150MM) CED. 40 UNIDO A PLACA DE ACERO DE 50X50 CMS X 1/4" CON SOLDADURA E-7018 AHOGADA Y ANCLADA EN MURO DE CISTERNA,	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,110.14				5,110.14 0.14
171	OC06-005-131	ESCOTILLA DE 1.00M x 1.00 M, CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, ANGULO Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL 14 TROQUELADA.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		2,920.84				2,920.84 0.08
172	OC06-005-132	TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 0.80 x 0.80 M, CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, ANGULO Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL 14 TROQUELADA.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		4,519.50				4,519.50 0.12
173	OC06-005-133	TAPA PARA CÁRCAMO SECO DE 1.75 x 1.10 M, A BASE DE REJILLA TIPO IRVING FABRICADA CON SOLERA DE Fo. No. DE 1 1/2" x 1/4" @ 5 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE ESCOTILLA DEL MISMO MATERIAL DE 0.60 x 0.60 M.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,262.07				5,262.07 0.14
174	OC06-055-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA PANORAMA. SERIES FIJOS DE 3.000" X 1.250", CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" Y PUERTA BATIENTE DE 1.750" O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA	21/04/2026	20/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00 0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 31

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	Acumulado Anterior	71.6
					Inicio Periodo	15/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,648,171.61	

VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.

175	OC06-055-005	FIJO DE 1.40 x 1.20 m.	21/04/2026	27/04/2026	(A) Barra (M) lero		11,108.55				11,108.55	0.30
176	OC06-055-010	FIJO DE 1.15 x 1.20 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		1,894.50				1,894.50	0.05
177	OC06-055-015	FIJO DE 0.45 x 0.45 m.	21/04/2026	07/05/2026	(A) Barra (M) lero		12,580.25	8,140.17			20,720.42	0.56
178	OC06-055-020	FIJO DE 0.30 x 2.10 m.	21/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) lero		8,886.84				8,886.84	0.24
179	OC06-055-025	DE 3.45 x 2.40 m., INCLUYE 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.85 x 2.40 m	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		12,995.97				12,995.97	0.35
180	OC06-055-030	DE 3.60 x 2.40 m., INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 0.90 x 2.40 m	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		13,510.00				13,510.00	0.37
181	OC06-055-035	FIJO DE 0.30 x 2.10 m.	21/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lero		2,960.06				2,960.06	0.08
182	OC06-055-040	DE 5.65 x 2.40 m., INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.20 x 2.40 m	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		19,604.57				19,604.57	0.53
183	OC06-055-045	PUERTA ABATIBLE DE 0.90 x 2.40 m. Y FIJO DE 1.80 x 1.50 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		7,538.64				7,538.64	0.20
184	OC06-055-050	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 2.00 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		9,175.05				9,175.05	0.25
185	OC06-055-055	PUERTA ABATIBLE DE 0.975 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		4,510.91				4,510.91	0.12
186	OC06-055-060	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.75 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		7,461.07				7,461.07	0.20
187	OC06-055-065	FIJO DE 5.60 x 0.60 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lero		4,054.13				4,054.13	0.11
188	OC06-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR BOLSA 3000 ESTÁNDAR DE 1.75", PARA SISTEMA DE PUERTAS Y FIJOS CON PERSIANA LOUVER, SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y	21/04/2026	20/04/2026	(A) Barra (M) lero						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. 32

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,772,592.32 74.96

JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.

189	OC06-060-005	FIJO DE 2.525 x 1.20 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		3,700.74				3,700.74	0.10
190	OC06-060-010	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.50 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		6,503.22				6,503.22	0.18
191	OC06-060-015	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.80 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		7,652.64				7,652.64	0.21
192	OC06-060-020	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.20 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,353.81				5,353.81	0.14
193	OC06-060-025	PUERTA ABATIBLE DE 1.20 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,353.81				5,353.81	0.14
194	OC06-060-030	PUERTA ABATIBLE DE 1.20 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,353.81				5,353.81	0.14
195	OC06-060-035	DE 2.40 x 2.40 m. 4 PUERTAS DE 0.60 x 2.40 m.	21/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		24,439.74				24,439.74	0.66
196	OC06-060-040	FIJO DE 0.90 x 0.90 m.	21/04/2026	27/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		7,400.15				7,400.15	0.20
197	OC06-060-045	PUERTA ABATIBLE DE 0.90 x 2.40 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		4,204.38				4,204.38	0.11
198	OC06-065-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA HECHA A BASE DE PERFILES TUBULARES DE 3", CAL. 14 PARA POSTES Y LARGUEROS, ASÍ COMO POSTES DE SUJECIÓN PARA PUERTAS DE PTR DE 2"x4" O DE 4"x4", SEGÚN DISEÑO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL	21/04/2026	20/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1350



Anexo 22

Hoja No. 33

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio			
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		2,842,554.62	76.84

COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

199	OC06-065-010	FIJO DE 0.83 x 2.10 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■					2,274.30	0.06
200	OC06-065-015	FIJO DE 2.69 x 2.10 m.	21/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■					14,741.82	0.40
201	OC06-065-020	FIJO DE 4.09 x 2.10 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■					11,207.08	0.30
202	OC06-065-030	FIJO DE 4.55 x 2.10 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■					12,467.52	0.34
203	OC06-065-040	DE 1.30 x 2.10 m. INCLUYE 1 POSTE DE PTR DE 4"x2" DE 2.10 m Y UNA PUERTA DE 1.142 x 2.00 m.	21/04/2026	21/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■					11,351.29	0.31

07 ALUMINIO

204	OC07-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EN PISO Y LAMBRIN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
205	OC07-010-005	TEE, ANODIZADO NATURAL DE 25 X 32 X 3 MM., PARA SEPARACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN PISO.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■					1,436.20	0.04
206	OC07-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO, INCLUYE:	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1351



Anexo 22

Hoja No. 34

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	2,896,032.83 78.29

CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS CADMINIZADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

207	OC07-020-015	ANODIZADO NATURAL, DE 0.10 M. DE ANCHO POR 1/8" DE ESPESOR, EN MUROS, PLAFONES O LOSAS.	23/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac		10,791.67				10,791.67	0.29
208	OC07-061-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA PANORAMA. SERIES FUOS DE 2.000" X 1.250", CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" Y PUERTA BATIENTE DE 1.750" O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac						0.00	0.00
209	OC07-061-005	FUJO DE DE 3.20 x 2.40 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac		7,849.27				7,849.27	0.21
210	OC07-061-010	DE DE 2.60 x 2.40 m. INCLUYE UNA PUERTA DE 1.10 x 2.10 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac		8,650.55				8,650.55	0.23
211	OC07-061-015	DE DE 2.60 x 2.40 m. INCLUYE UNA PUERTA DE 1.10 x 2.10 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac		8,650.55				8,650.55	0.23

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1352



Anexo 22

Hoja No. **35**
Fecha: **27 de marzo de 2026**

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)
		INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio			
Nº	CLAVE	DESCRIPCION			Inicio Periodo	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		2,931,974.87	79.25
212	OC07-061-020	FIJO DE DE 3.30 x 2.40 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	8,082.42					8,082.42	0.22
213	OC07-061-025	FIJO DE DE 3.15 x 2.40 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	7,732.71					7,732.71	0.21
214	OC07-061-030	DE DE 5.90 x 2.40 m. INCLUYE UNA PUERTA DE 1.05 x 2.10 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	16,329.74					16,329.74	0.44
215	OC07-061-035	DE 2.45 x 2.40 m. INCLUYE UNA PUERTA DE 1.05 x 2.10 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	8,243.22					8,243.22	0.22
216	OC07-061-040	FIJO DE DE 1.40 x 1.50 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	2,429.13					2,429.13	0.07
217	OC07-061-045	DE DE 1.50 x 2.40 m. INCLUYE UNA PUERTA DE 1.05 x 2.10 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	6,028.54					6,028.54	0.16
218	OC07-061-050	DE 4.25 x 2.40 m. INCLUYE UNA PUERTA DE 1.15 x 2.10 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	12,562.74					12,562.74	0.34
219	OC07-061-055	DE 5.30 x 2.40 m. INCLUYE UNA PUERTA DOBLE DE 1.80 x 2.40 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	16,201.30					16,201.30	0.44
220	OC07-061-060	FIJO DE DE 5.45 x 2.40 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	13,094.59					13,094.59	0.35
221	OC07-061-065	FIJO DE DE 0.75 x 1.20 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	1,360.64					1,360.64	0.04
222	OC07-061-070	FIJO DE DE 2.20 x 1.20 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	2,953.67					2,953.67	0.08
223	OC07-061-075	FIJO DE DE 3.00 x 1.20 m.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac	4,898.32					4,898.32	0.13
224	OC07-063-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA CON SUJECIÓN SUPERIOR A BASE DE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE KINETIC CVE. 6320 E INFERIOR MEDIANTE PASAMANOS DE ALUMINIO DE 4" CUPRUM, ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR, O SIMILARES EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS,	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. **36**
Fecha: **27 de marzo de 2026**

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Ubicación: AGUASCALIENTES

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)
			INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio			
Nº	CLAVE	DESCRIPCION			Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		3,031,891.89	81.95

ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO); NOTA - EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.

225	OC07-063-005	DE 1.35 x 1.05 M.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		11,630.72					11,630.72	0.31
226	OC07-063-010	DE 1.50 x 1.05 M.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		12,208.66					12,208.66	0.33
08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS													
227	OC08-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	25/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
228	OC08-005-135	6 MM. DE ESPESOR.	25/04/2026	27/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		14,928.18					14,928.18	0.40
229	OC08-005-140	CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR	25/04/2026	27/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		7,789.92					7,789.92	0.21
230	OC08-005-145	CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 9 MM. DE ESPESOR	25/04/2026	28/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		21,679.79					21,679.79	0.59
231	OC08-005-155	CRISTAL TEMPLADO DE CONTROL SOLAR COLOR TINTEX VERDE DE 9 MM. DE ESPESOR	25/04/2026	27/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,865.40					5,865.40	0.16
232	OC08-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO	25/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLF, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1354



Anexo 22

Hoja No. 37

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	3,105,994.56	83.95

DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

233	OC08-010-005	DE 5 MM. DE ESPESOR.	25/04/2026	27/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		5,123.68				5,123.68	0.14
234	OC08-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	25/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
235	OC08-025-015	PELICULA AUTOADHERIBLE DE CONTROL SOLAR COLOR VERDE (TINTEX) SOBRE CRISTAL EXISTENTE.	25/04/2026	27/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		11,093.68				11,093.68	0.30

09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

236	OC09-005-000	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
-----	--------------	--	------------	------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------	------

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1355



Anexo 22

Hoja No. 38

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS		PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio	
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	3,122,211.92 84.39

DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADOR POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

237	OC09-005-040	DE PINO DE 0.71 A 0.81 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	23/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) lerogac		24,708.08				24,708.08	0.67
238	OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	23/04/2026	27/05/2026	(A) Barra (M) lerogac		18,043.55	33,311.16	23,595.40		74,950.11	2.03
239	OC09-005-055	DE PINO DE 1.02 A 1.11 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	23/04/2026	21/05/2026	(A) Barra (M) lerogac		21,651.56	39,972.12	14,989.55		76,613.23	2.07
240	OC09-005-060	DE PINO DE 1.12 A 1.22 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerogac		3,636.28				3,636.28	0.10
241	OC09-025-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL CON BASTIDOR DE MADERA CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS DE 25 X 50 MM., UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRO TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR POR 2 LADOS, CLAVADO Y PEGADO, ACABADO BARNIZ SEMIMATE O PLÁSTICO LAMINADO POR 2 LADOS CON ADHESIVO SEGÚN EL CASO, EL BASTIDOR ESTARÁ ATORNILLADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, HABILITADO, ARMADO, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerogac						0.00	0.00
242	OC09-025-045	DE PINO, RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO S.M.A. MARCA FORMICA O SIMILAR; CON ENTRECALLE CON ESMALTE SEMIMATE COLOR NEGRO.Y ZOULO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE.	23/04/2026	21/05/2026	(A) Barra (M) lerogac		14,376.23	26,540.72	8,315.94		49,232.89	1.33


Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1356

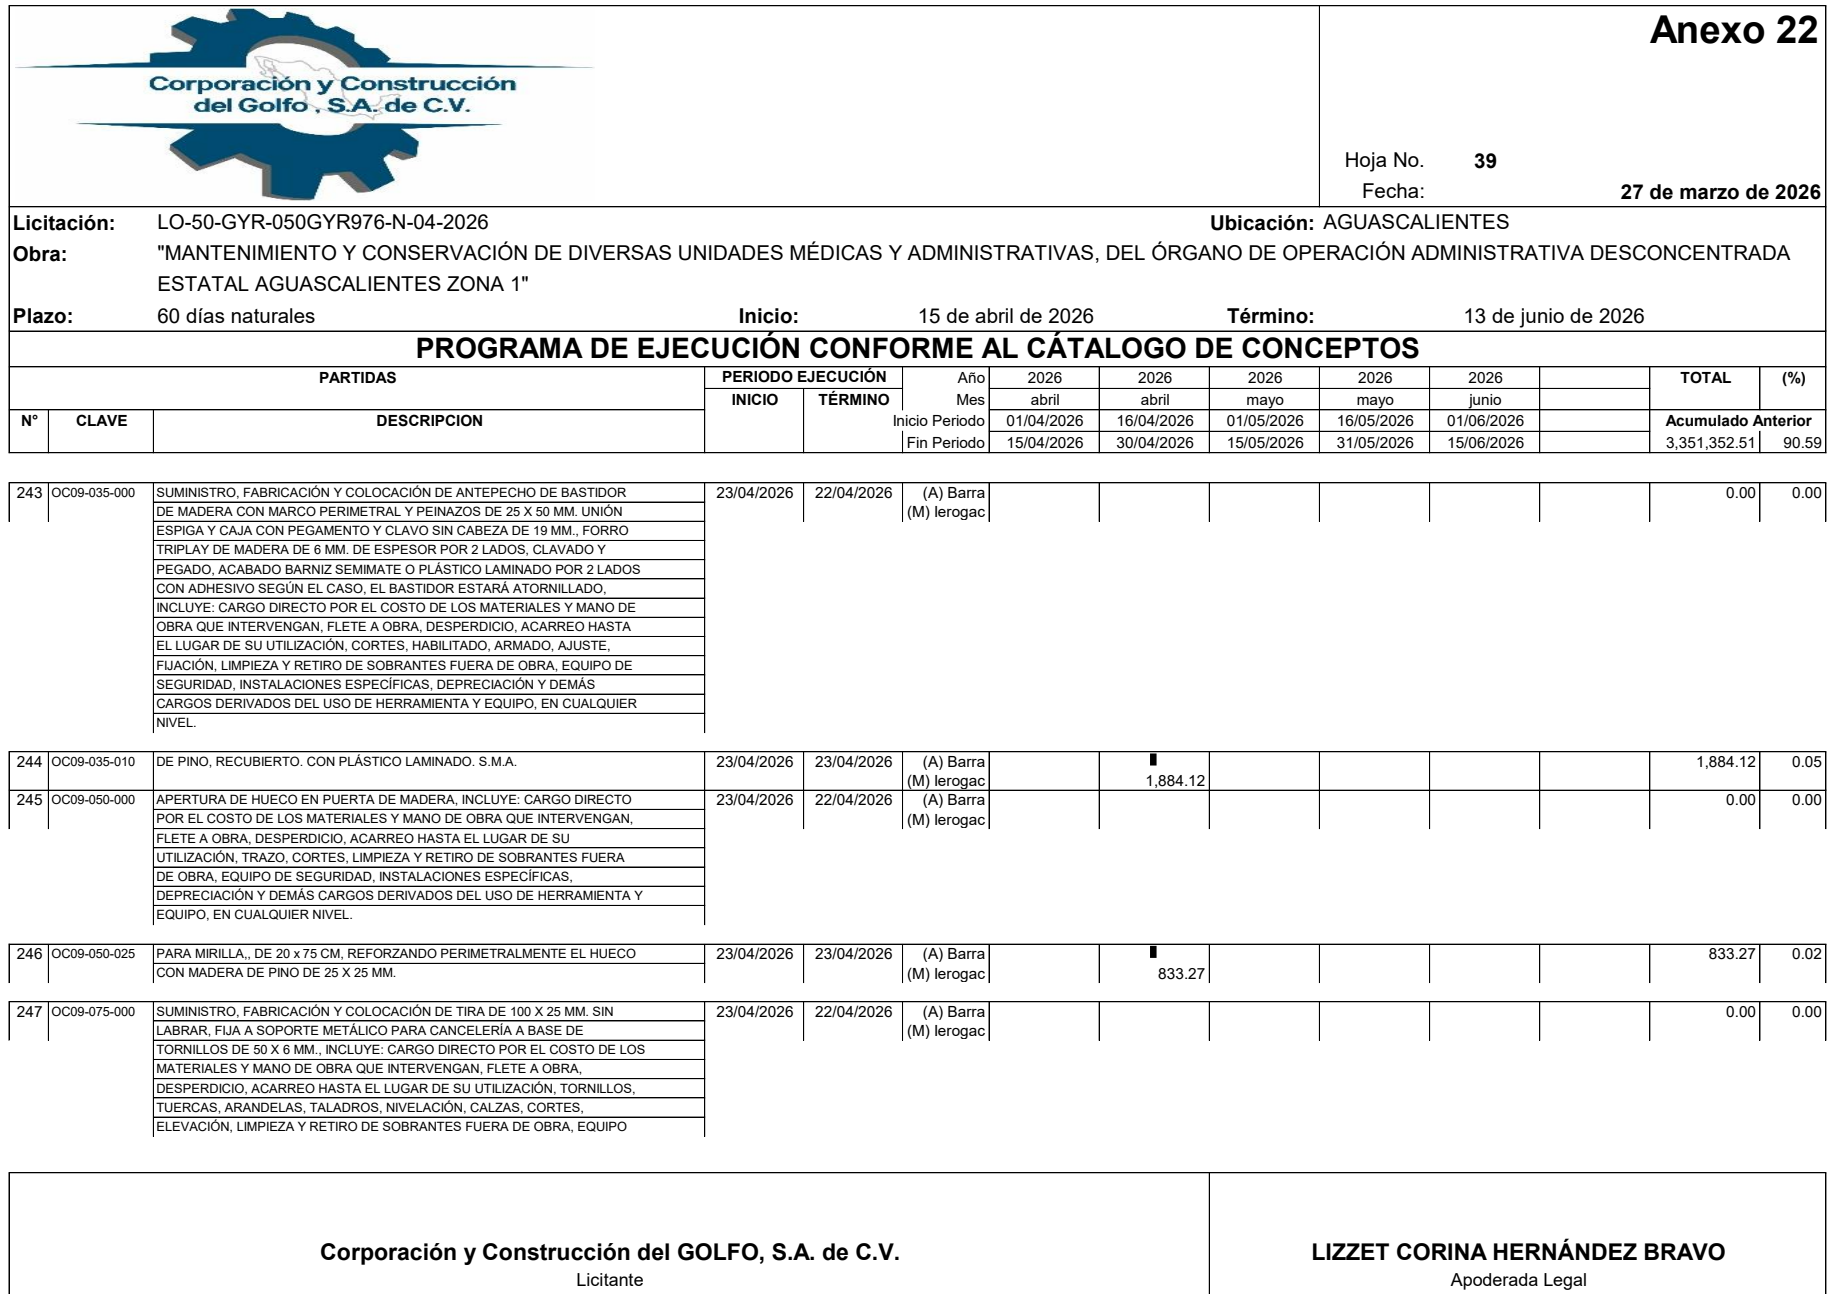

										Anexo 22				
										Hoja No. 40 Fecha: 27 de marzo de 2026				
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026 Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1" Plazo: 60 días naturales										Ubicación: AGUASCALIENTES Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026				
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS														
PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL		(%)	
			INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio				
N°	CLAVE	DESCRIPCION			Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026			Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026			3,354,069.90 90.66	

DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

248	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	23/04/2026	24/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 3,447.57					3,447.57	0.09
249	OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00
250	OC09-080-151	MODELO 550-AN, CON MANIJA LIBRE QUE ACCIONA PESTILLO CON LLAVE O SIMILAR.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 19,527.62					19,527.62	0.53
251	OC09-080-180	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, MODELO 3060 JM, MARCA PHILLIPS O SIMILAR CON JALADERA EXTERIOR Y MANIJA INTERIOR	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 11,769.03					11,769.03	0.32
252	OC09-080-195	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC10SPISA26D.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 13,148.37					13,148.37	0.36
253	OC09-080-200	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 6,306.44					6,306.44	0.17
254	OC09-080-205	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC53PDPISA26D.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 71,480.37					71,480.37	1.93
255	OC09-080-210	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC80PDPISA26D.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 4,730.31					4,730.31	0.13
256	OC09-080-215	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, MODELO 595 AS, MARCA PHILLIPS	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 1,063.25					1,063.25	0.03

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---



Anexo 22

Hoja No. 41

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	3,485,542.86	94.22

O SIMILAR.

257	OC09-080-220	JALADERA TIRADOR DE ALUMINIO, MCA. HERRALUM, MOD. COAHUILA.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		440.24				440.24	0.01
258	OC09-080-225	CERROJO PARA PORTÓN MARCA IMMSA TIPO MAUSER GALVANIZADO R-15 DE 15 CMS	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		3,206.48				3,206.48	0.09
259	OC09-081-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 2" X 2", CON MADERA DE PINO O DE LA REGIÓN DE PRIMERA CALIDAD, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 O SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO VGP O HGP (POSTFORMABLE) PEGADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SIN EMULSIONES VOC, RECOMENDADO POR PROVEEDOR. CUBIERTA DE ATENCIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR COLOCADA CON ESPACIADORES DE ACERO INOXIDABLE CON CHAPETÓN TIPO NARIZ DE 32 x 101 MM, ZOCLO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE, ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO POR EL EXTERIOR Y AL INTERIOR CON LACA AUTOMOTIVA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO. LA CUBIERTA DE TRABAJO TERMINADA EN PLÁSTICO LAMINADO Y LA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM SUJETO AL MUEBLE MEDIANTE POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
260	OC09-081-005	MSD-01. ASISTENTES MÉDICAS. DE 1.20 X 0.75 X 1.15 M.	23/04/2026	30/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		26,306.52				26,306.52	0.71
261	OC09-081-025	MSD-05. CONTROL DE ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA. DE 1.35 X 0.75 X 1.15 M.	23/04/2026	30/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		26,306.52				26,306.52	0.71

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1359



Anexo 22

Hoja No. **42**
Fecha: **27 de marzo de 2026**

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Ubicación: AGUASCALIENTES

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año Mes	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO		abril	abril	mayo	mayo	junio		
						Inicio Periodo 01/04/2026	Fin Periodo 16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior 3,541,802.62	95.74
262	OC09-081-030	MSD-06. APS. DE 1.50 X 0.75 X 1.15 M.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 43,004.68				43,004.68	1.16
263	OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
264	OC09-085-005	DE DOBLE ACCIÓN EMBALADA PARA PISO. MODELO 1500 Ó SIMILAR.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 3,532.71				3,532.71	0.10
265	OC09-085-055	PIVOTE DESCENTRADO REFORZADO PARA PUERTAS DE ABATIR, MOD. 3300, MARCA PHILLIPS. COLOR BLANCO.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 13,083.28				13,083.28	0.35
266	OC09-085-060	BIVEL CON BALERO GALVANIZADO MARCA IMMSA, TAMAÑO GIGANTE.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 5,060.51				5,060.51	0.14
267	OC09-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LUBRICACIÓN, AJUSTES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
268	OC09-090-021	HIDRÁULICO PHILLIPS, MOD. 1404 Ó SIMILAR.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		■ 16,609.58				16,609.58	0.45
269	OC09-095-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASADOR DE SOBREPONER O DE MAROMA PARA EMBUTIR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 22

Hoja No. **43**

Fecha: **27 de marzo de 2026**

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026	TOTAL	(%)
Nº	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio		
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026	Acumulado Anterior	
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	3,623,093.38	97.94

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

270	OC09-095-006	DE EMBUTIR PARA PUERTA DE MADERA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA PHILLIPS, MODELO MX5869 Ó SIMILAR.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		818.04				818.04	0.02
271	OC09-095-035	PASADOR DE ALUMINIO EMBUTIDO MOD. GN-110 MARCA CUPRUM.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		8,384.53				8,384.53	0.23
272	OC09-095-040	PASADOR DE PISO MARCA IMMSA COLONIAL DE BOLA A-30 REDONDO 5/8 (#12).	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		572.53				572.53	0.02
273	OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
274	OC09-100-005	DE PISO	23/04/2026	25/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		12,443.75				12,443.75	0.34
275	OC09-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	23/04/2026	22/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00
276	OC09-110-006	MARCA PHILLIPS MODELO 46 Ó SIMILAR.	23/04/2026	23/04/2026	(A) Barra (M) lerozac		597.66				597.66	0.02
31 MANO DE OBRA UNICAMENTE												
277	OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) lerozac						0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal

						Anexo 22											
Hoja No. 44 Fecha: 27 de marzo de 2026																	
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES											
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																	
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026						Término: 13 de junio de 2026					
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS																	
PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)				
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio							
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		Acumulado Anterior	98.57				
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		3,645,909.89					

RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

278	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	84.33	1,011.85	1,011.85	969.69	927.53		4,005.25	0.11
279	OC31-020-045	DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA SANITARIO.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	7.74	92.97	92.97	89.09	85.22		367.99	0.01
280	OC31-025-000	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00

281	OC31-025-005	CENTRAL DE ENFERMERAS.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	68.44	820.17	820.17	785.99	751.82		3,246.59	0.09
282	OC31-025-020	MOSTRADOR ATENCIÓN, RECIBO O ENTREGA.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	273.46	3,281.36	3,281.36	3,144.63	3,007.91		12,988.72	0.35
283	OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00

284	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	127.03	1,524.37	1,524.37	1,460.85	1,397.34		6,033.96	0.16
285	OC31-035-080	DE ESCALERA MARINA PARA ACCESO A AZOTEA	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) lerozac	3.98	47.58	47.58	45.60	43.62		188.36	0.01
286	OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) lerozac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

						Anexo 22											
Hoja No. 45 Fecha: 27 de marzo de 2026																	
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES											
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"																	
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026						Término: 13 de junio de 2026					
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS																	
PARTIDAS			PERIODO EJECUCIÓN		Año	2026	2026	2026	2026	2026		TOTAL	(%)				
N°	CLAVE	DESCRIPCION	INICIO	TÉRMINO	Mes	abril	abril	mayo	mayo	junio							
					Inicio Periodo	01/04/2026	16/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	01/06/2026		Acumulado Anterior					
					Fin Periodo	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	31/05/2026	15/06/2026		3,672,740.76	99.3				

ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

287	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	237.53	2,850.35	2,850.35	2,731.58	2,612.82		11,282.63	0.31
288	OC31-045-000	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac							0.00	0.00
289	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	68.36	820.24	820.24	786.07	751.89		3,246.80	0.09
290	OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac							0.00	0.00
291	OC31-050-035	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	100.28	1,203.28	1,203.28	1,153.15	1,103.01		4,763.00	0.13
292	OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac							0.00	0.00
293	OC31-080-005	DE EDIFICIO POR REINICIO DE OBRA O REMODELACIÓN.	15/04/2026	13/06/2026	(A) Barra (M) Ierogac	122.89	1,474.78	1,474.78	1,413.33	1,351.88		5,837.66	0.16
294	OC31-115-000	EXTRACCIÓN DE TOCONES CON DIÁMETRO MEDIDO A 1.00 M. DE ALTURA O	15/04/2026	14/04/2026	(A) Barra (M) Ierogac							0.00	0.00

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

<

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--
