

Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

Acta Parcial de Recepción Física de los Trabajos, al Área Operativa Delegación Chihuahua y Residencia de Obra.

En la Ciudad de Cd. Juárez, Chihuahua siendo las 12:00, horas del día 06 de mayo de 2019, se reúnen en la oficina que ocupa la Residencia de Obra instalada para llevar a cabo la entrega de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, ubicada en Ciudad, Juárez, Chihuahua, las personas que nombran e identifican cuyas firmas aparecen al final de la presente y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, para llevar a cabo el acto de recepción física de los trabajos relativos al amparo del contrato, N° 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688:-----

1. Descripción de los trabajos que se reciben:-----

Se trata de la ejecución de los trabajos de Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en la que se ejecutaron trabajos de obra civil, preliminares y terracerías, cimentación y estructura, albañilería, urbanización, estructura de acero, herrería, aire acondicionado, gases medicinales acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, Sistema de voz y datos, sistema de detección de incendios, cableado estructurado para sistema de telecomunicaciones, Urbanización, estacionamiento así como obras exteriores, además como los siguientes equipos.-----

Equipo de Aire Acondicionado

EQUIPO	UBICACION	SERIE	MARCA
Unidad paquete 01	Área de gobierno-Azotea	1218P44634	CARRIER
Unidad paquete 02	Área de farmacia-Azotea	1118C81346	CARRIER
Unidad paquete 03	Consultorios 7,8,9 y 10-Azotea	1218P05528	CARRIER
Unidad paquete 04	Consultorios 3,4,5 y 6-Azotea	1218C82305	CARRIER
Unidad paquete 05	Sala de espera, consultorios 1 y 2-Azotea	1418P21898	CARRIER
Unidad paquete 06	Sala de espera frente a consultorios 1 y 2-Azotea	1218P44635	CARRIER
Ventilador de extracción 01	Sanitarios personal-Azotea	17116295100 5	SOLER & PALAU
Ventilador de extracción 02	Taller de conservación-Azotea	18123268800 5	SOLER & PALAU



[Handwritten signatures and scribbles]

Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

Ventilador de extracción 03	Sanitarios públicos-Azotea	16101509000 4	SOLER & PALAU
Ventilador de extracción 04	Brigada de enfermeras-Azotea	17116295100 3	SOLER & PALAU
Ventilador de extracción 05	Baños y vestidores-Azotea	17111309500 8	SOLER & PALAU
Ventilador de extracción 01	Sanitario farmacia-Azotea	16106654200 3	SOLER & PALAU
U. Condensadora miniSplit UCMS-01	Dirección-Azotea	10000214317030003 7	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-01		10000128717010001 8	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-02	Sala de usos múltiples-Azotea	10000214317030001 2	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-02		10000128717010000 5	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-03	Sala de usos múltiples-Azotea	10000214317030001 0	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-03		10000128717010002 0	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-04	MDF-Azotea	10000225816060015 2	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-04		10000125816060010 0	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-05	IDF-Azotea	10000225816060013 6	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-05		S/N	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-06	Oficina de almacén-Azotea	10000230417010009 8	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-06		S/N	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-07	Medicamentos controlados-Azotea	10000225816060011 0	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-07		10000125816060016 0	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-08	Disparo RX-Azotea	10000214317030002 6	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-08		S/N	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-09	Ultrasonido-Azotea	10000255611709000 5	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-09		10000155617090012 0	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-10	Imagenología-Azotea	10000255617090007 5	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-10		10000102917080172 6	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-11	PAQS RX-Azotea	10000255617090002 9	YORK
U. Evaporadora minisplit UEMS-11		10000162017090048 6	YORK
U. Condensadora minisplit UCMS-12	Caseta de vigilancia-Azotea	10000217217050002 4	YORK

Página 2 de 14

Acta de Recepción Física de los Trabajos

Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

EQUIPOS HIDRAULICOS

EQUIPO	UBICACION	SERIE	MARCA
Generador de agua caliente	Casa de máquinas hidráulica	18EF10069	LEFLAM
Recirculador de agua caliente	Casa de máquinas hidráulica	106507-1A71	BELL & GOSSETT
Bomba centrífuga horizontal 01	Casa de máquinas hidráulica	88377-A	AURORA PICSA
Bomba centrífuga horizontal 01	Casa de máquinas hidráulica	88377-B	AURORA PICSA
Tanque hidroneumático	Casa de máquinas hidráulica	S/N	
Bomba sumergible	Casa de máquinas hidráulica	B78-10TV6H-060518	
Acondicionador de aguas duras	Casa de máquinas hidráulica		HELVEX
Tanque de gas L.P.	Azotea casa de máquinas hidráulica	03-18-C16265	CY TSA

EQUIPO DE GASES MEDICINALES

EQUIPO	UBICACION	SERIE	MARCA
Manifold de oxígeno	Casa de máquinas hidráulica	G061806001	ARIGMED
Manifold de aire medicinal	Casa de máquinas hidráulica	G061806002	ARIGMED
Alarma Audiovisual	Curaciones e inyecciones	S/N	ARIGMED
Equipo toma mural Oxígeno	Curaciones e Inyecciones		
Equipo toma mural Aire	Curaciones e Inyecciones		
4 Juegos Acc. Periféricos	Curaciones e Inyecciones		

Equipo de Telefonía.

EQUIPO	UBICACION	SERIE	MARCA
Teléfono básico	Taller de conservación	949GH666B003099	DENWA
Teléfono básico	Casa de máquinas hidráulica	949GH666B003098	DENWA
Teléfono básico	Caseta de vigilancia	949GH666B003429	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 3	1168HV627A000021	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio enfermería 2	1168HV627A000022	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 4	1168HV627A000023	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Asistentes medicas 1	1168HV627A000024	DENWA

Página 3 de 14

Acta de Recepción Física de los Trabajos

Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 5	1168HV627A000025	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio enfermería 3	1168HV627A000026	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 6	1168HV627A000027	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 2	1168HV627A000028	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio enfermería 1	1168HV627A000029	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 1	1168HV627A000030	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Asistentes medicas 2	1168HV627A000151	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Disparo	1168HV627A000152	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 7	1168HV627A000153	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio enfermería 4	1168HV627A000154	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 8	1168HV627A000155	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 9	1168HV627A000156	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Asistentes medicas 3	1168HV627A000157	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio enfermería 5	1168HV627A000158	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Consultorio 10	1168HV627A000159	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Vestibulo	1168HV627A000160	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Salud en el trabajo	1168HV627A000101	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Jefe de enfermería	1168HV627A000102	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Auxiliar universal de oficinas 1	1168HV627A000106	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Trabajo de enfermeras	1168HV627A000107	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Jefe de medicina familiar	1168HV627A000108	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Sala de usos múltiples	1168HV627A000109	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Auxiliar universal de oficinas 2	1168HV627A000110	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Secretaria director	1168HV627A000191	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Información contable	1168HV627A000192	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Oficina personal	1168HV627A000193	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	APS	1168HV627A000194	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Nutrición	1168HV627A000195	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Prestaciones Económicas	1168HV627A000196	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Oficina de Almacén	1168HV627A000197	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	Farmacia	1168HV627A000198	DENWA
Teléfono Semi-ejecutivo	MDF	1168HV627A000199	DENWA

Página 4 de 14

Acta de Recepción Física de los Trabajos

Calle Hacienda de los Fresnos esquina con calle Acacia
Fraccionamiento las Huertas V Etapa.
Cd. Juárez Chihuahua



[Handwritten signatures and marks]



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

Table with 4 columns: Description, System, ID Number, and Brand. Rows include Telefonos Semi-ejecutivo, Ejecutivo, and APS Jefe de personal.

EQUIPO TELEFONIA E INFORMATICA EN MDF E IDF

Table with 4 columns: EQUIPO, UBICACION, N° PARTE, and N° SERIE. Lists various communication and computer equipment like servers, switches, and UPS units.



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

SERVIDOR DE DATOS

EQUIPO	UBICACION	Nº PARTE	Nº SERIE
Equipo de Servidor de Datos Hewlett Packard Enterprise Modelo: DL380 Gen 10 Server Serie2M282501TW.	MDF	871177-DN1	2219076605810 2219076605932 2219076605826 2219076605830 2219076470994 2219076470989 2219076470826 2219076470910 2219076605818 2219076470978 2219060035454 3772018613483
Ms WS16 (16 CORE) STD ROK Es SW	MDF	P00487-071	
MS WS16 RDS CAL SUSR en/fr/es/xc LTU HPE 1.2TB SAS 10 k SFF SC DS HDD		871232-DN1	3811000302720
		872479-B21	6C3817H15 PH1845H1VT PH1851HOP2 PH1844H1WD 2Y490372M7 9CP82501JV PHT903VQ2S PHT903VQ2R PHT903VQ2P PHT903VQ2T
HPE DL380 GEN104114 XEON-S-KIT HPE 500W FS PLAT HT PLG LH PWR SPLY KIT HPE 16 GB 1RX4 PC4-2666V-RSMART KIT		826850-B21 865408-B21 815098-B21	BUPP-PS6-1U24FBKSK CAT6 RJ-45-RJ45
PANEL DE PARCHEO MODELO AX103253 CORDONES DE PARCHEO			



[Handwritten signatures and scribbles]



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Table with 4 columns: EQUIPO, UBICACION, N° PARTE, N° SERIE. Lists various equipment like 'ESTACION DE TRABAJO', 'Servidor de video NVR', and 'Pantalla de led' with their respective locations and part numbers.

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

SISTEMA DE VOCEO Y SONORIZACION

EQUIPO	UBICACION	Nº PARTE	Nº SERIE
Antena	azotea		
Micrófono	site	Mca. asaji	
Baffles empotrado	plafón	Mca. asaji	modelo 1319/02
Equipos de control De volumen		Mca. asji	modelo 1101
Amplificador mezclador reforzador	IDF	17266008	ASAJI
Amplificador mezclador reforzador	IDF	17266003	ASAJI
Reproductor e CD'S	IDF	Y074208Y0	YAMAHA
Sintonizador AM/FM	IDF	1617083	ROLLS
Procesador de zonas	IDF	18211411	ASAJI
Micrófono de zonas	IDF	S/N	ASAJI
Micrófono	IDF	1635015	ASAJI
Micrófono half dúplex	Disparo RX	16380251	RAPSON
Amplificador half dúplex	Disparo RX	1832044	RAPSON
Bocina vertical half dúplex	Disparo RX	NS-AW190/NS-AW390	YAMAHA

SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO.

EQUIPO	UBICACION	Nº SERIE	MARCA
Tablero de Control Inteligente	IDF	NFS320	NOTIFIER
Fuente auxiliar de energía	IDF	FCPS-2456	NOTIFIER
Detectores de Incendio (55)	Plafón	Mod. FSP-851	NOTIFIER
Detectores de Incendio (06)	Plafón	Mod. FST-851	NOTIFIER
Detectores de Incendio (10)	Plafón	Mod. FFAPT-851	NOTIFIER
Equipo de Estación Manual (02) de Alarma		Mod. NBG-12LXSP	NOTIFIER
Equipo Modulo de Alerta Audio-Visual		Mod. AS241575W-FR	NOTIFIER
Equipo de Fuente Auxiliar para Panel de Detección de Incendio		Mod.FCPS-24S6, SERIE 50125142-001-A	NOTIFIER

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

SISTEMA DE TV. Y FOMENTO A LA SALUD.

Table with 4 columns: EQUIPO, UBICACION, N° SERIE, MARCA. Lists items like Antena, Divisor de Señal, Decodificador de TV Gebox, etc.

SISTEMA ELECTRICO, TABLERO GENERALES Y EQUIPOS DE FUERZA.

Table with 4 columns: EQUIPO, UBICACION, Marca, Serie. Lists items like Tablero General Normal, Tablero General Emergencia, Tablero General AAN1, etc.

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the year 2019.



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

SISTEMA ELECTRICO TABLEROS DE ZONA

Table with 4 columns: EQUIPO, UBICACION, Marca, Serie. Contains details for electrical panels and components like 'Tres Tableros de Zona Mod. A, AE y Int. UMF' and 'Centro de Carga Mod 2. Con interruptores'.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA TORMENTAS

Table with 4 columns: EQUIPO, UBICACION, Marca, Serie. Contains details for lightning protection equipment like 'UNA PUNTA DE PARARRAYOS IONIZANTE, MOD. PDC 4.3' and 'UN CONTADOR DE DESCARGAS RAYOS MOD. CDR-UNIVERSAL'.

2.- El Residente de obra manifiesta que se encuentra en trámite un Convenio en Monto, derivado de trabajos ejecutados, las estimaciones correspondientes se autorizaran a pago una vez que se libere el Oficio de Liberación Inversión correspondiente

3.- Actividades No Ejecutadas por Causas Imputables al Contratista.- El personal de la Residencia de Obra del Instituto, manifiesta que en la cláusula primera del Contrato de referencia. "El Instituto a el

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the year 2019 and the name ENRIQUE ZARZA.



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

Contratista" la ejecución de los trabajos que comprenden la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 Consultorios y se obliga en forma conjunta y solidaria a realizar hasta su total terminación. El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a la información contenida en el presente Contrato, en su Cláusula Segunda, así como los diversos ordenamientos legales vigentes, derivado delo anterior "El Contratista" ejecuto y dio inicio en tiempo y forma la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 Consultorios, sin embargo, derivado de las solicitudes del Contratista se realizaron Convenios Adicionales al plazo de ejecución, no imputables al Contratista.

A esta fecha los trabajos están concluidos, debiendo atender el Contratista los detalles señalados por el área del Departamento de Construcción Inmobiliaria de la Delegación Estatal, de fecha 3 de mayo de 2019, (anexo), y lista de detalles por la Jefatura de Servicios Administrativos del 6 de mayo de 2019, (anexo 2); es necesario que estos detalles se encuentren terminados a satisfacción del Instituto para proceder a la Recepción Total de la Unidad. A continuación se enumeran los trabajos pendientes de ejecutar y documentar:

- a) Falta el suministro de un Disco duro para el servidor de datos.
b) Entrega de informes de resultados de blindaje de barita en sala de Rx.
c) Puesta en marcha y operación de puertas de aluminio corredizas en acceso principal.
d) Falta de entrega de garantías de equipos, manuales, fichas técnicas y certificados de calidad; así como la extensión de garantía a 24 meses, de los equipos propios del inmueble, según marca contrato.
e) Certificado de ocupación, emitido por el Departamento de Protección Civil del Municipio de Cd. Juárez.
f) Prueba a su máxima capacidad y funcionamiento de Cisterna.
g) Entrega de la Fianza de Garantía por defectos, Vicios Ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad.
h) Se anexa relación de detalles, por los representantes de esta Delegación Estatal y que se requieren atenderse a la brevedad
i) Queda pendiente la entrega de los planos de la construcción final, (As-built).

Nota aclaratoria: Residencia de Obra del Instituto, hace mención del Contrato celebrado entre el Instituto y el Contratista, sin embargo no se anexo a esta acta.

Derivado de las circunstancias antes descritas, mismas que afectan la conclusión de los trabajos, así como la operación de la Unidad, se determina que:

Se recibe de forma parcial y cuando estén resueltos y/o corregidos los detalles arriba señalados, se realizara la recepción definitiva, para ello se manifiesta que el personal de esta Residencia de Obra del Instituto, continuara a cargo y será la responsable de dar seguimiento oportuno hasta su total terminación a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

Handwritten signature in black ink

Handwritten mark in black ink

Handwritten signature in black ink



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

4.- Se manifiesta que la Contratista Hizo entrega de:

- En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de equipo periférico de gases medicinales,
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, garantía de impermeabilización.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de claves para chapas digitales.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de llaves de accesorios de baños.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de llaves puertas de fierro exteriores.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de llaves puertas de acceso a casas de máquinas.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de llaves puertas de aluminio.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de llaves puertas de madera.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de llaves de aparatos de detección de incendio.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de accesorios sanitarios.
En escrito sin número de fecha 09 de abril de 2019, entrega de extensiones telefónicas internas, y aparatos telefónicos, aparatos de: Telecomunicaciones montados en racks en IDF, Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Sistema de Voceo y Sonorización, Sistema de Detección de Incendio.
Por lo anterior, en este acto se entrega copia fotostática de cada uno de los documentos que se enumeran y se hace entrega del contenido que se menciona según sea el caso de forma física. Tomando en cuenta que en la presente acta de recepción es parcial, la Residencia de Obra del Instituto, manifiesta que los documentos originales se entregaran al Área operativa en Original una vez realizada la Entrega-Recepción definitiva.

5.- Conclusiones

Siendo que el personal de la Delegación Estatal que se indica, recibe de forma parcial de conformidad y de buena fe, la Residencia de Obra del Instituto se compromete a dar seguimiento oportuno a la entrega de la documentación faltante y los pendientes antes mencionados hasta su total conclusión a entera satisfacción de la Delegación Estatal.



Handwritten signatures and initials in blue and black ink.



Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

La Residencia de Obra del Instituto, se compromete a informar a su Normativa la División de Construcción, enviando una copia de la presente Acta de Recepción en forma impresa y escaneada, vía correo electrónico, Enviara copia a la Jefatura de Servicios Administrativos.

La Residencia de Obra del Instituto, se compromete a entregar o informar el avance que presente para la Entrega-Recepción definitiva, para el 08 de mayo de 2019.

La presente acta se cierra a las 13.00 horas del día en que se levanta, firmándola de conformidad los que en ella intervienen.

ENTREGA

RECIBE

Residencia de Obra
UMF-10 Consultorios

Área operativa Delegación Chihuahua

Ing. Dámaso Vera Martínez
Residente Obra
Mat. 311080213

Ing. Álvaro Ibáñez Palafox
Jefe de Conservación de la Zona 1
Mat.

Ing. José Alberto Wong Gallegos
Supervisor de Instalaciones
Mat. 311080234

Dr. Mario Alberto Llamas Salinas
Director de la UMF-10 No. 70
Mat. 99017874

Ing. Jaime Vargas Mendoza
Residente de Obra UMF 20
Mat. 311170140
TESTIGO

Lic. Karina Idalia Davila Alverdy
Administrador de UMF No. 70
Mat. 99088803





Acta parcial de recepción física de los trabajos "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. de 10 consultorios, en Cd. Juárez, Chihuahua". Ubicada en Calle Hacienda de los Fresnos Esquina Calle Acacia, Fraccionamiento las Huertas V Etapa, Código Postal 32577, al Amparo del Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 1-15080002-4-43688, compromiso 4-43688.

Ing. Daniel Cambrón Torres
Supervisor de Instalaciones UMF 20
Mat. 311080243
TESTIGO

C.P. Luis Carlos Talamantes Alvidres
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos
Delegación Chihuahua
Mat. 311170140


Arq. Enrique Ochoa Rodarte
Enc. Del Departamento de Conservación
Mat. 98084195

Ing. Roberto Hernández Ronquillo
Depto. De construcciones y planeación
Inmobiliaria
Mat. 98081534






Con relación a los detalles de la obra en proceso Unidad de Medicina Familiar No. 70 en CD. Juárez, Chih., me permito enviarle la relación de los detalles faltantes a la fecha.

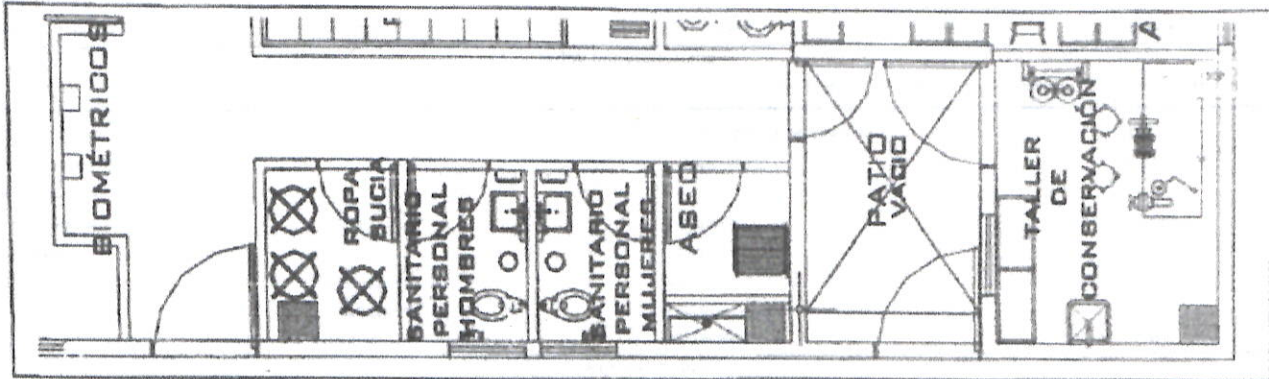

1. Cuarto de aseo

- Fisura en muro junto a chambrana

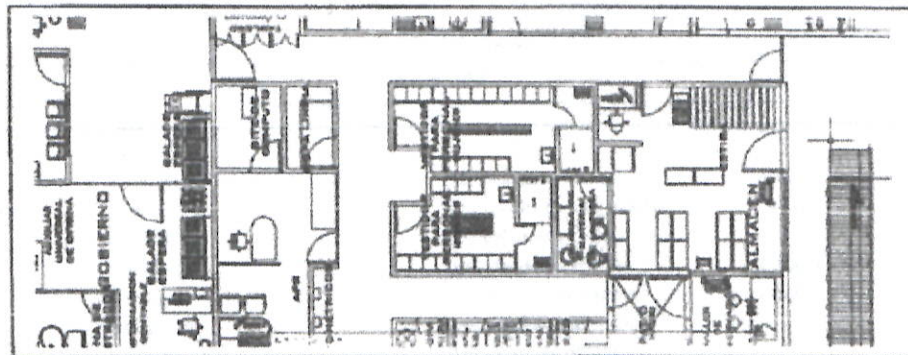

2. Personal

- Remoción de pintura en la T esmaltada
- Detalle de pintura muro y plafón.

3. Vestidor de mujeres

- Limpieza en mampara

4. Vestidor de hombres

- Limpieza mampara y regadera
- Boquilla loseta abajo del lavabo

5. Almacén

- Detalle de chambrana exterior
- Detalle de puerta a exterior de estiba
- Detalle en el perfilado del aplanado marco exterior de puerta de estiba

J. Amh

03 Mayo 19

03 Mayo 19

03 Mayo 19


03 Mayo 19

03 Mayo 19



03 Mayo 19

03 Mayo 19

03 Mayo 19

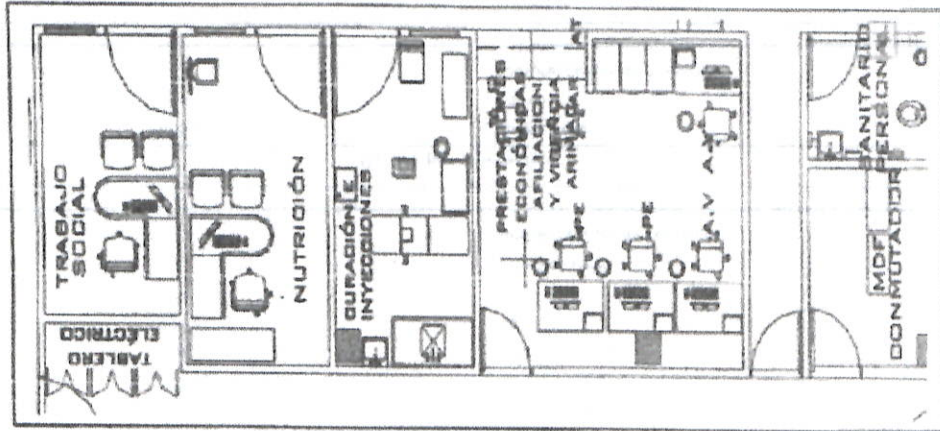

- 6. MDF Conmutador
 - Falta aterrizar el rack .
- 7. Área de estiba de medicamento
 - Detalle en señalización exterior *conservación*
 - Ajuste de chapa en puerta de estiba hacia exterior
- 8. Prestaciones Económicas
 - Detalle de pintura en rejilla aire plafón.

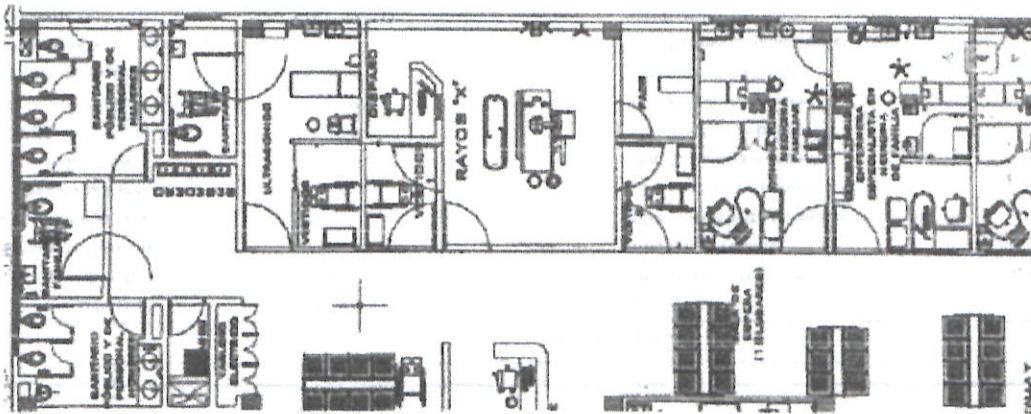

J. Am...





9. Sanitarios públicos (área de bebederos)

- Colocar letrero

10. Sanitario público mixto

- Detalle de pintura en recubrimiento pétreo en muro

11. Ultrasonido


- Retoque de pintura en general del vestidor

12. Sala de rayos X

- Chambrana muy dañada de la puerta de cuarto de vos y datos
- Se realizó prueba de obscuridad en la sala y en la totalidad de las chambranas hubo filtraciones de luz entre la puerta en la zona de piso, y al ser la chambrana armada con dos piezas (no monolítica) hubo filtraciones en la misma, en la totalidad de las puertas.
- Existen fisuras en muros por asentamiento de zapatas dentro de la sala

13. Cuarto de Voz y datos

- Aterrizar el Rack

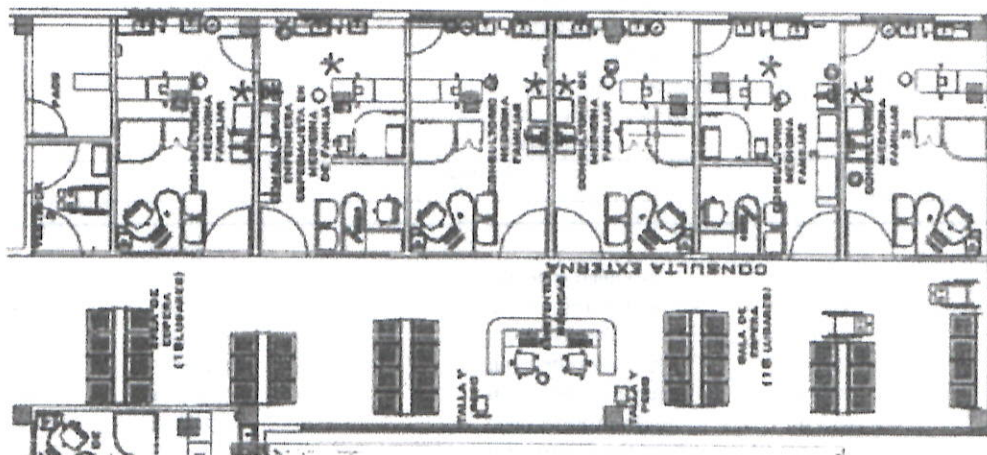

14. Consultorio 1

- Detalle de pintura en tapa de voz y datos
- Detalle de tapa registro en plafón

15. Sala de espera central

- Ajustar muebles de carpintería al equipo de computo
- Falta sellar las ventanas junto a columnas (2)
- Fisura en plafón afuera del consultorio 6

16. Exteriores

- Fisura en muros parte trasera
- Reparación de las filtraciones en el cárcamo seco de la cisterna

17. Cuarto de maquinas

- Faltan planos de ingeniería actualizados.
- Falta prueba de hermeticidad en una celda de la cisterna

J. Amador


(falta arrancar prueba)




- Falta entrega de algunos manuales de equipos de la unidad.

Por lo que después de realizado el recorrido por las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar se constataron los detalles que con antelación se mencionan, no contemplando en este reporte los posibles faltantes en obra contenidos según proyecto.

POR EL I.M.S.S.




ING. ROBERTO HERNÁNDEZ RONQUILLO
 RESIDENTE DE INSTALACIONES IMSS
 CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN
 INMOBILIARIA DELEGACIÓN CHIHUAHUA




DR. MARIO ALBERTO LLAMAS SALINAS
 DIRECTOR U.M.F. No. 70



ING. DANIEL CAMBRON TORRES
 SUPERVISOR DE INSTALACIONES




ING. JAIME VARGAS MENDOZA
 RESIDENTE DE OBRA CIVIL IMSS
 NIVEL CENTRAL




ING. DAMASO VERA MARTINEZ
 RESID. OBRA UMF70 cd. Juarez
 Chihuahua

LIC. KARINA IBALIA DAVILA ALVERDY
 ADMINISTRADORA DE U.M.F No.70



ING. ALVARO IBÁÑEZ PALAFOX
 JEFATURA DE CONSERVACION ZONA I

POR LA CONTRATISTA



LIC. GLADYS SALCIDO FLORES
 REPRESENTANTE DE FIGOSA SA DE CV



Recibi original - Gladys Salcido

03 Mayo 19

Recibi Original Lic. Karina Davila




Recibi Original Roberto Hernandez A



Recibi Original Domingo J. B. B. B.

Recibi Original Marco Antonio Linares Sandoval



Damaso Vera MTZ.





CD. JUAREZ, CHIH A 6 DE MAYO DE 2019

ANEXO -2

Con relación a los detalles de la obra en proceso Unidad de Medicina Familiar No. 70 en CD. Juárez, Chih., me permito enviarle la relación de los detalles faltantes a la fecha.

1. **Cuarto de aseo**
 - Reparar chambrana interior.
2. **Ropa sucia**
 - Falta zoclo de cerámica detrás de la puerta.
3. **Ropa Limpia**
 - Remate de boquilla.
4. **Salud en el trabajo**
 - Quitar machas de oxidado en piso.
5. **Sanitario hombres y mujeres**
 - Desmanchar pisos y muros atrás de wc.
6. **Ultrasonido**
 - Detallar chambrana interior.
7. **Rayos X**
 - Limpieza general
8. **Vestidor rayos X1**
 - Desmanchar pisos.
 - Detallar chambrana interior.
9. **Vestidor rayos X2**
 - Reparar unión de pisos entre vestidores y rayos X
10. **Área exterior**
 - Reparar chapa de abastos farmacia se atora chapa.
 - Reparar chambrana exterior abastos farmacia.
 - Reparar fisuras en muros exterior en general.
 - Detallar con pintura amarilla cordones de banquetta.
 - Reparar fisura en banquetta afuera de almacén.
 - Reparar separación de banquetta con respecto a la guarnición sobre avenida principal.
 - Reparar registros de alumbrado a pie de arbotante.
 - Desmanchar vidrios planta alta sobre acceso principal.
 - Calibrar puerta principal.
 - Proiongar Podo táctil.
 - Cambiar tapa de tomacorriente tipo torre en piso por metálicas.





Por lo que después de realizado el recorrido por las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar se constataron los detalles que con antelación se mencionan, no contemplando en este reporte los posibles faltantes en obra contenidos según proyecto.

POR EL I.M.S.S.

C.P. LUIS CARLOS TALAMANETS ALVIDREZ
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADM.
DELAGACION ESTATAL CHIHUAUHA.

ARQ. ENRIQUE OCHOA RODARTE
JEFE DE OFICINA DE CONSERAVCION DELEG
DELAGACION ESTATAL CHIHUAHUA.

ING. ROBERTO HERNÁNDEZ RONQUILLO
RESIDENTE DE INSTALACIONES IMSS
CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA DELEGACION CHIHUAHUA

ING. JAIME VARGAS MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA CIVIL IMSS
NIVEL CENTRAL

ING. DAMASO VERA MTZ
RESID OBRA U.M.F-70 Cd. Juarez
Chihuahua

DR. MARIO ALBERTO LLAMAS SALINAS
DIRECTOR U.M.F. No. 70

LIC. KARINA IDALIA DAVILA ALVERDY
ADMINISTRADORA DE U.M.F No.70

ING. DANIEL CAMBRON TORRES
SUPERVISOR DE INSTALACIONES

ING. ALVARO IBANEZ PALAFOX
JEFATURA DE CONSERVACION ZONA I

