



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Proyectos PAO 2026

Terminados



2026
año de
Margarita
Maza

Reubicación-UMF 26

PROVIDENCIA, CÓRDOBA VER.

INVERSIÓN: \$ 799,800.68 MXN



Gobierno de
México



- En gestión el contrato de drenaje, contando con la conexión.
- En proceso de verificación de los trabajos.
- Entrega-Recepción de los trabajos 25.05.26



2026
año de
**Margarita
Maza**

AVANCE GENERAL DE OBRA INTERIOR: **100%**

AVANCE GENERAL DE OBRA EXTERIOR: **100%**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

OBRAS PAO 2026

En Proceso




2026
año de
Margarita
Maza

MANTENIMIENTO INMUEBLE

SUR 10, Orizaba, Ver.

Continúan los trabajos de adecuación de contenedores para el archivo de la JSSTPES, JSP, JSF Y JAC.

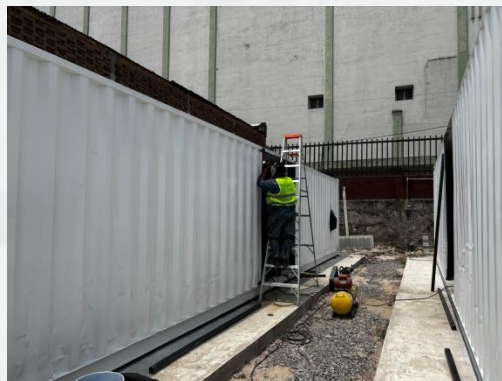

2026
año de
**Margarita
Maza**


PERIODO DE EJECUCIÓN: **28.04 – 27.05**

AVANCE GENERAL DE OBRA: **70%**

MANTENIMIENTO INMUEBLE.

SUBDELEGACIÓN COATZACOALCOS.

- Se dio inicio formal a los trabajos con el suministro de los materiales por parte de la empresa el día 08.05.2026, se ha solicitado a la empresa cumplir con lo establecido en la NOM-009-STPS-2011

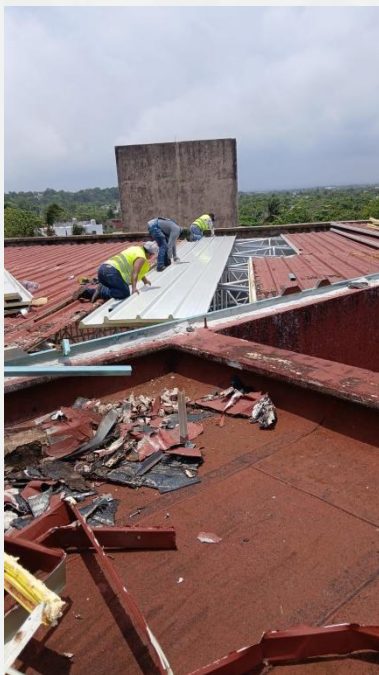

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28.04 – 06.06

AVANCE GENERAL DE OBRA: 45%

ADECUACIÓN DE ESPACIO.

UMF 52 COSOLEACAQUE.

- La empresa inicio formalmente los trabajos el día 07.05.2026 con los trabajos preliminares de trazo, nivelación y desenraice.



2026
año de
**Margarita
Maza**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **21.04 – 15.05**

AVANCE GENERAL DE OBRA: **90%**
