

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-43-2024	Fecha de Adjudicación:	06-nov-24
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DURANTE LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 15 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN- AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL"			
EMPRESA:	SUPERVISION, COORDINACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-22200022-5-431055	No COMPROMISO:	5-431055
Monto de Contrato:	\$ 9,830,881.58	Monto de Anticipo:	\$0.00
Periodo de Ejecución:	07-NOV-2024 AL 02-OCT-2025	Plazo de Ejecución:	330 DIAS
No. DE CONTRATO:	2-22200022-5-431055C1-25	No COMPROMISO:	5-431055C1-25
Monto de Contrato:	\$ 14,339,406.51	Monto de Anticipo:	\$0.00
Periodo de Ejecución:	07-NOV-2024 AL 29-MAR-2026	Plazo de Ejecución:	508 DIAS

CONVENIO

Monto <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Número: 2-22200022-5-431055C1-25	
Periodo:	Importe: 07-NOV-24 AL 29-MAR-26	Número compromiso: 5-431055C1-25	Fecha:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	80.56%	74.71%	5.85%
Financiero (Importes C/IVA)	\$11,552,284.22	\$10,712,970.61	\$839,313.62
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			0
Materiales		0.00%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$14,339,406.51	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$10,712,970.61	HASTA EST. No.:	
AUTORIZADA:	\$10,712,970.61	HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	0.00%
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%

Reporte Fotográfico

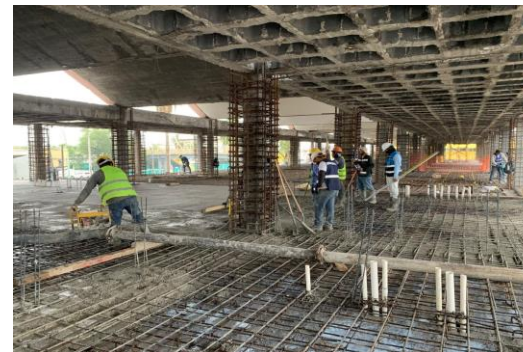

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se autorizo la estimación 12
