


Ampliación y Remodelación de Urgencias de la UMAE Hospital General CMN La Raza, Norte del D.F.

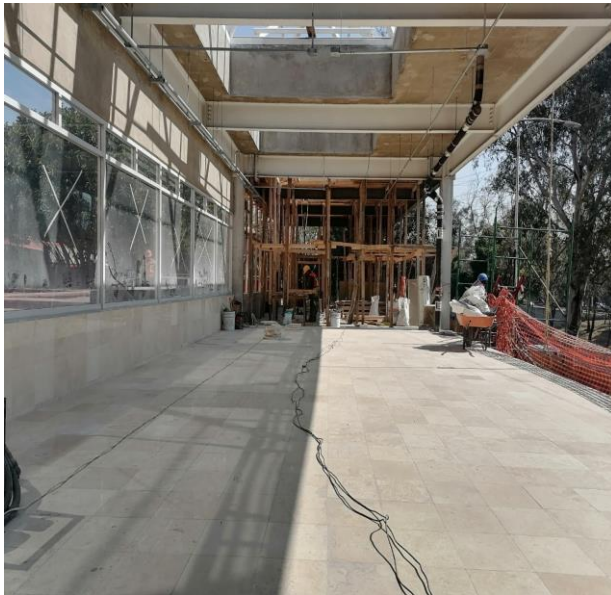

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| TIPO DE OBRA: | Ampliación y Remodelación |
| RESPONSABLE: | Nivel Central |
| SUPERFICIE DEL TERRENO: | 3,597 m ² |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA: | 50,045 m ² |
| NÚMERO DE CAMAS: | 599 camas censables |
| NÚMERO DE QUIROFANOS: | 4 |
| POBLACION BENEFICIADA: | 25,048 derechohabientes |

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MAFYN, S.A. DE C.V.

Contrato 1-14360001-4-43910

| | Inicio | Fin | Importe |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Original | 03/09/2021 | 29/06/2022 | \$ 123,867,547.63 |
| | 30/09/2021 | 29/06/2022 | \$ 123,867,547.63 |
| TOTAL | | | \$ 123,867,547.63 |

| Avance físico | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| Programado | Real | Diferencia |
| 23.12% | 24.69% | -1.57% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Por ejercer |
| \$ 28,192,971.36 | \$ 13,605,859.00 | \$ 14,587,112.36 |
| 22.76% | 10.98% | 11.78% |

Situación actual de la obra:

Referente a la etapa 1, se ejecutan trabajos de instalaciones y acabados.
