CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 158
Actualización: 28/09/26

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS								
Localidad:	Carretera Transpeninsular No 10412 colonia Ex-ejido Chapultepec II, C.P. 22785, Ensenada, B.C.				**Coordenadas:**	Latitud: 31.8658° (norte) Longitud: -116.6076 (oeste)			
Superficie del Terreno (m2):	76,843.00	**Superficie Construida (m2):**	14,782.76	**Superficie Estacionamiento (cajones):**	9,459.00	**Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso, andadores, jardines, estacionamiento, caseta de vigilancia, entre otros.)**	6,970.00	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):**	N/A
Camas censables:	216	**Camas no censables**	114	**Especialidades:**	42	**Monto de Equipamiento:**		698 mdp	

CONTRATO

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-T-35-2023	**Fecha de Adjudicación:**	24-ago-23	**Empresa:**	Irkon Holdings, S.A. de C.V. en participación conjunta con Edificaciones 3 Ríos, S.A. de C.V., José Carlos Delgado, Delgado.	**Plazo de ejecución:**	360 días naturales
Descripción de los trabajos a ejecutar:	"Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en el municipio de Ensenada, Baja California (Etapa 1), bajo la modalidad de Proyecto Integral".					**Período de ejecución:**	08 de septiembre de 2023 al 29 de mayo de 2025

CONVENIO 1

No. De Convenio:	1-22020004-4-431003C1-23	**Fecha:**	18-oct-23	**Tipo de convenio:**	Cambio de OLI	**Período de ejecución:**	08 de septiembre de 2023 al 01 de septiembre de 2024.

CONVENIO 2

No. De Convenio:	1-22020004-4-431003C2-23	**Fecha:**	13-dic-23	**Tipo de convenio:**	Diferimiento de inicio	**Período de ejecución:**	20 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2025.

CONVENIO 3

No. De Convenio:	1-22020004-4-431003C3-24	**Fecha:**	09-dic-24	**Tipo de convenio:**	Diferimiento de término	**Período de ejecución:**	01 de febrero de 2025 al 29 de mayo de 2025

CONVENIO 4

No. De Convenio:	1-22020004-4-431003C4-25	**Fecha:**	02-may-25	**Tipo de convenio:**	Diferimiento de término	**Período de ejecución:**	N/A

CONVENIO 5

No. De Convenio:	1-22020004-4-431003C5-26	**Fecha:**	28-oct-25	**Tipo de convenio:**	Modificatorio (Compensación)	**Período de ejecución:**	N/A

MONTOS DE CONTRATO Y CONVENIOS (Incluyen IVA)

Monto de Contrato:	$ 767,493,424.45	**Monto de Convenio 1:**	$ -	**Monto de Convenio 2:**	$ -	**Monto de Convenio 3:**	$ -	**Monto de Convenio 4:**	$ -

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVACIÓN
Físico	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero	$ 767,493,424.45	$ 766,951,324.04	-$ 542,100.41
Fuerza de trabajo	0	0	0

SITUACION FINANCIERA

ESTIMACIONES			
Monto del Contrato:	$ 767,493,424.45	**Monto de Convenios Modificatorios:**	$ -
Monto Pagado:	$ 766,951,324.04	**Hasta Estimación No.**	28
Pendiente de pago:		**Estimaciones faltantes:**	

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EJERCICIO	TOTAL AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	COMENTARIOS
2023	$ 79,020,545.02		
2024	$ 148,848,427.19	$ 2,379,055.10	
2025	$ 151,227,482.29	$ -	
2026	$ -	$ -	

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL CORTE
$812,582.59
RETENCIÓN ACUMULADA A LA FECHA (SEP DE 2026):
$17,619,934.94

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATO

1) Carpeta de Gastos no recuperables. El 07 de enero del 2026, la contratista presentó solicitud de gastos no recuperables, derivado de 2 suspensiones parciales de obra, la cual fue revisada y enviada por la RO IMSS a la DSOP con fecha 08 de abril del 2026 para su trámite correspondiente. Mediante oficio, la DSOP notificó a la RO IMSS la devolución de esta carpeta, la cual fue turnada al contratista para su complemento documental.
2) Finiquito de la Obra. Se tienen condiciones para avanzar a la definición del finiquito de este contrato, sin embargo, el contratista indicó que presentaría de nuevo su reclamación de gastos no recuperables, motivo por el cual no se ha concluido el cierre contractual.
3) El viernes 07 de agosto se formalizó el Convenio de Compensación.
4) Contrato a Precios Unitarios de conceptos extraordinarios fuera del alcance contractual (reja perimetral, equipos hidráulicos y gases medicinales, obra exterior adicional, muros).
Se cuenta con el catálogo definitivo que formará parte del nuevo contrato a Precios Unitarios, integrado por conceptos de los 5 presupuestos extraordinarios previamente autorizados. Conviene aclarar que estos conceptos se encuentran ejecutados en su totalidad, por lo que, al formalizarse el contrato, se procedería de inmediato al pago al contratista y se estará en condiciones del cierre administrativo de la Etapa 1 en su conjunto.

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

1) La documentación correspondiente a la solicitud de Gastos no Recuperables fue devuelta por la Residencia a la Contratista para su complementación, a la fecha no hay reingreso alguno.
2) El Convenio de Compensación ya fue formalizado.
3) El Convenio de Compensación ya fue formalizado.
4) Los presupuestos No. 4 y 5 fueron ingresados a la DCPU mediante los oficios No. 09 53 84 61 1G79/2026/0952 y No. 09 53 84 61 1G79/2026/1077, los días 12 de junio y 02 de julio de 2026, respectivamente.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

Proyecto concluido, no se tiene problemática.	sin problemática

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 158

Actualización: 28/09/26

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS

DE LA OBRA

1) Recepción de la primera etapa de Ensenada por parte de la OOAD. Desde el 16 de marzo del 2025 personal del Instituto se encuentra laborando en este Hospital y en los tres meses subsecuentes se fueron concluyendo áreas y servicios que actualmente están en operación, por lo que es indispensable que a la brevedad se realice la recepción por parte del área operativa, ya que se han presentado algunas situaciones propias de la operación y Conservación solicita la intervención de la empresa contratista, siendo que la JC opera directamente el equipo de instalación permanente y deben encargarse del mantenimiento adecuado de estos, a fin de no afectar las condiciones de garantía de los equipos, así como, para poder contratar los servicios de mantenimiento preventivo, los cuales no forman parte de las garantías de los mismos. Conviene señalar que el Hospital se encuentra en funcionamiento desde el 13 de julio de 2025 (un día después de su inauguración). 2) Fallas en el funcionamiento de equipo de instalación permanente, Se han presentado fallas operativas en equipos como: • Sistema de agua caliente: Se llevó a cabo el drenado de la tubería y la limpieza de tanques de almacenamiento; se realizaron muestreos del agua, resultando niveles de presencia de óxido por debajo del límite permisible (0.30 ppm) respecto a este tema. La semana del 17 de agosto, se arrancará el sistema de generación de agua caliente, quedando pendiente y reprogramado para la semana del 07 de septiembre la prueba de un laboratorio certificado, para de este modo, asegurar la entrega de calidad de agua caliente al hospital, No fue posible la toma de muestras ya que se observo presencia de oxido (dentro de lo permitido), derivado del estancamiento de agua, producto de no haber utilizado el sistema, a lo que el Contratista opto por la limpieza de los tanques de agua caliente previo a la realización de las pruebas de calidad del agua, **se concluyó la limpieza de los tanques y se programará realizar las pruebas de la calidad del agua una vez se concluyan los trabajos de cambio de conexiones flexibles en la red de agua fría.** • Planta de emergencia: Se han presentado fallas al momento de arrancar de manera automática, cuando se presentan variaciones de voltaje en algunas de las fases de la CFE. Se han realizado diversas libranzas, sin embargo, durante la más reciente, el 23 de julio del presente, accionó sin falla. Se requiere revisión por parte del proveedor GP. Aún sin confirmar fecha de visita a obra. **Al momento no se detecta ninguna falla.** • Caldera 1: El contratista 3 Ríos reparó y dejó funcionando esta caldera (concluyó los trabajos de reparación del serpentín y servomotor el 1 de agosto de 2026). Por decisión del departamento de Conservación del hospital, permanece apagada para bajar el consumo de diésel, dado que no se tiene gran demanda de vapor. Se presentó de nuevo una fuga en el serpentín, la RO IMSS solicitó al contratista evaluar el reemplazo de la pieza para evitar contratiempos a futuro. En seguimiento a esta solicitud, el contratista informó que el serpentín será retirado y enviado a Clayton para su inspección y, en su caso, sustitución. El retiro se realizó el pasado 11 de septiembre de 2026 y se encuentra con el proveedor para la revisión, reparación o, en su caso, sustitución. **Se mantiene el estatus.** 3) Automatización del HVAC: El contratista 3 Ríos, no ha concluido estos trabajos, toda vez que espera el pago de la estimación número 27 para proceder a dar el anticipo correspondiente a su proveedor del sistema HVAC. **El contratista informó que ya cuenta con el recurso y realizará el anticipo en la semana del 28 de septiembre 2026, dando inicio los trabajos el día 05 de octubre 2026 y se prevé concluir 05 de diciembre del mismo año.** Con fecha 27 de julio de 2026 se envió a la DSOP, una tarjeta informativa donde se describen los temas citados anteriormente, destacando la solicitud de apoyo para poder realizar la entrega de la etapa 1 a la OOAD a través de la jefatura de Conservación . El día martes 04 de agosto de 2026, la RO IMSS y el Jefe de conservación del hospital tuvieron una reunión para la entrega parcial del hospital. Se le compartió al JCU el borrador del acta para sus observaciones. El pasado lunes 10 de agosto, la RO IMSS, en conjunto con el personal de conservación de la unidad y el contratista, realizó un recorrido por las instalaciones de la unidad, en el cual se enlistaron los detalles que serán atendidos por la contratista para el cierre de esta acta de entrega total de la Obra o parcial, en el caso de que permanezca algún pendiente por atender. El contratista ha atendido la mayor parte de las observaciones hechas por conservación, destacando como pendiente, precisamente, la automatización del HVAC. En seguimiento, el 04 de septiembre la RO, en conjunto con el contratista, elaboró una minuta con compromisos para la conclusión de los trabajos pendientes. El 17 de septiembre del año en curso, el Jefe de Conservación notificó a la RO IMSS , que en la línea de agua fría se detectaron áreas con presencia de óxido, así como en un esterilizador (instrumental quirúrgico con óxido). La RO instruyó al contratista a revisar conexiones y/o posibles puntos de generación de óxido , así como colaborar con el JCU en la revisión de mangueras de la línea de vapor, ya que se tiene la sospecha de que estas mangueras de acero inoxidable con extremos de acero al carbón, pudieran ser la fuente de esta presencia de óxido Esta revisión, concluyó el 24 de septiembre de 2026, por lo que la RO IMSS determinó la necesidad del cambio de mangueras flexibles de acero inoxidable, actividad que tiene programada se concluya en la semana del 12 al 16 de octubre de 2026.	1) Se mantiene el estatus. 2A) Se esperan resultados de calidad del agua. 2B) El proveedor se comprometió a asistir el día 14 de julio para revisar las condiciones del equipo y los faltantes, a fin de complementar los trabajos pendientes. Sin embargo, no asistieron y no se cuenta con nueva fecha. 2C) El sábado 01 de agosto, se concluyó la reparación de la Caldera 1. (se puso en marcha sin contratiempos). 3) Se espera conciliar con DEFENSA la marca de plataformas para utilizarla en las 2 etapas.

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

Se cuenta con las Licencias, Permisos y Vistos Buenos, no se tiene problemática.	sin problemática

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

El contratista se encuentra presente en obra con el propósito de atender cualquier inconveniente que surja en la operación del Hospital Etapa 1, así como para el cierre administrativo contractual.	El contratista se encuentra comprometido a realizar los trabajos necesarios para concluir la obra.

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE APERTURA PARCIAL
30 de junio 2025, inaugurado el 12 de julio del 2025	16/03/25

POR EL IMSS:

Arq. Ebed Gerardo Duncil

Titular de la División de Residencia Especial HGR 216 Camas, Ensenada, B.C.

POR LA SUPERVISIÓN: **(contrato concluido, en proceso de cierre administrativo)**

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	**158**
Actualización:	**28-sept-26**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**LO-50-GYR-050GYR119-N-37-2023**	**Fecha de Adjudicación:**	**11 DE SEPTIEMBRE 2023**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).

EMPRESA:	CURRIE & BROWN MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	**1-22020004-5-431004**	**No COMPROMISO:**	**5-431004**
Monto de Contrato:	**$ 22,491,020.16**	**Monto de Anticipo:**	**-----**
Periodo de Ejecución:	**25 de septiembre de 2023 al 17 de diciembre de 2024**	**Plazo de Ejecución:**	**450 días naturales**

CONVENIO

No. De Convenio:	1-22020004-5-431004C1-25	Tipo de Convenio:	MODIFICATORIO AL MONTO Y PLAZO	
Periodo:		Importe:	$ 5,078,947.96	**Fecha:** 03 de julio 2025
No. De Convenio:	1-22020004-5-431004C2-25	Tipo de Convenio:	MODIFICATORIO AL MONTO Y ADICIONAL PLAZO	
Periodo:		Importe:	$ 172,681.75	**Fecha:** 16 de dic 2025

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**100.00%**	**98.73%**	**1.27%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 27,569,968.11**	**$ 27,228,667.01**	**$341,301.10**

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	**$ 22,491,020.16**	**MONTO CONVENIDO:**	**$ 5,251,629.71**
MONTO PAGADO:	**$ 27,228,667.01**	HASTA EST. No.:	42
PENDIENTE DE PAGO:	**$ -**	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	**$ -**	HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

SE CUENTA CON EL AVISO DE TÉRMINO Y ACTA DE VERIFICACIÓN, EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO.

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	**158**
Actualización:	**28-sept-26**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	**LO-50-GYR-050GYR098-N-20-2023**	**Fecha de Adjudicación:**	**22-ago-23**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).

EMPRESA:	ARQ. LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA		
No. DE CONTRATO:	**1-22020004-S-020508**	**No COMPROMISO:**	**020508**
Monto de Contrato:	**$ 1,875,379.40**	**Monto de Anticipo:**	**------**
Periodo de Ejecución:	**28 de agosto de 2023 al 21 de agosto de 2024**	**Plazo de Ejecución:**	**353 días naturales**

CONVENIO

No. De Convenio:	1-22020004-S020508C1-24	Tipo de Convenio:	MODIFICATORIO AL MONTO Y PLAZO	
Periodo:		Importe:	$ 138,916.00	**Fecha:** 08/08/2024
No. De Convenio:	1-22020004-S020508C2-24	Tipo de Convenio:	MODIFICATORIO AL MONTO	
Periodo:		Importe:	-$ 429.02	**Fecha:** 18/10/2024
No. De Convenio:	1-22020004-S020508C3-24	Tipo de Convenio:	MODIFICATORIO AL MONTO Y PLAZO	
Periodo:		Importe:	$ 286,830.43	**Fecha:** 19/11/2024
No. De Convenio:	1-22020004-S020508C4-25	Tipo de Convenio:	MODIFICATORIO AL MONTO Y ADICIONAL PLAZO	
Periodo:		Importe:	$ 124,829.88	**Fecha:** 27/02/2025

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$ 2,425,526.69**	**$ 2,425,526.69**	**$0.00**

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	**$ 1,875,379.40**	**MONTO CONVENIDO:**	**$ 550,147.29**
MONTO PAGADO:	**$ 2,425,526.69**	HASTA EST. No.:	26
PENDIENTE DE PAGO:	**$ -**	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	**$ -**	HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZÓ EL FINIQUITO Y CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	158
Actualización:	28-sept-26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-23-2024	Fecha de Adjudicación:	05-jul-24

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).

EMPRESA:	C MIGUEL GARCIA BARRERA		
No. DE CONTRATO:	2-22020004-5-431037	No COMPROMISO:	5-4312037
Monto de Contrato:	$ 1,064,672.79	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	11 de julio de 2024 al 17 de diciembre de 2024	Plazo de Ejecución:	353 días naturales

CONVENIO

No. De Convenio:	2-22020004-5-431037C1-25	Tipo de Convenio:	MODIFICATORIO AL MONTO Y PLAZO	
Periodo:	☑	Importe:	$ 495,352.39	**Fecha:** 01 octubre 2025
No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		
Periodo:	☐	Importe:		

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	$ 1,730,372.82	$ 1,730,372.82	$0.00

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$ 1,235,020.44	MONTO CONVENIDO:	$ 495,352.39
MONTO PAGADO:	$ 1,730,372.82	HASTA EST. No.:	11
PENDIENTE DE PAGO:	$ -	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	$ -	HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

SE CUENTA CON EL AVISO DE TÉRMINO, ACTA DE VERIFICACIÓN Y ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE FINIQUITO.

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 158
Actualización: 28-sept-26

"Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en el municipio de Ensenada, Baja California (Etapa 1), bajo la modalidad de Proyecto Integral".

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL






VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL





VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



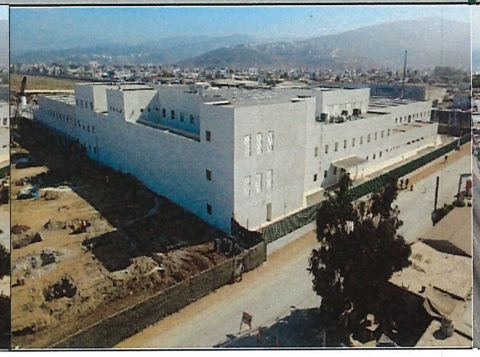

VISTA PANORAMICA





Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	158
Actualización:	28-sept-26

#¡DESBORDAMIENTO!

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190
