CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 16 (dieciseis)
Actualización: 28/09/26

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS								
Localidad:	Carretera Transpeninsular No 10412 colonia Ex-ejido Chapultepec II, C.P. 22785, Ensenada, B.C.				Coordenadas:	Latitud: 31.8658° (norte) Longitud: -116.6076 (oeste)			
Superficie del Terreno (m2):	76,843.86	Superficie Construida (m2):	28,966.67	Superficie Estacionamiento	9,459.00	Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso,	3,508.73	Superficie Ampliación y Remodelación (m2):	1,440.00
Camas censables:	216	Camas no censables:	114	Especialidades:	42	Monto de Equipamiento:		630 MDP	

CONVENIO

Tipo de Convenio:	Convenio Específico de Colaboración	Fecha de Firma del Convenio:	06-may-25	Empresa/ Dependencia:	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	Plazo de ejecución:	24 meses
Descripción de los trabajos a ejecutar:	Construcción del Área de Hospitalización y Quirófanos del Hospital General Regional de 216 Camas en Ensenada, Baja California					Período de ejecución:	Mayo 2025 a Mayo 2027

MODIFICACIONES AL CONVENIO

Tipo	Número	Periodo	Plazo (días)	Monto (c/IVA)
Convenio modificatorio en Plazo y Recalendarización de Ministraciones	1 (Primer)	Mayo 2025 a Noviembre 2026	6 meses	N/A

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVACIÓN
Físico	94.59%	63.06%	-27.75%
Financiero	$ 1,315,673,083.12	$ 1,246,427,131.37	$ 69,245,951.74
Fuerza de trabajo	626	27	0

SITUACION FINANCIERA

MINISTRACIONES

Monto del Convenio:	$ 1,384,919,034.86	Monto de Convenio Modificatorio:	0
Monto Pagado:	$ 1,246,427,131.37	Hasta ministración No.	6 de 8
Pendiente de pago:	$ 138,491,903.49	Ministraciones faltantes:	7 (sept 2026, 8 (nov 2026)

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATO

1. Primer Convenio modificatorio en Plazo y Recalendarización de Ministraciones
Con fecha del 20 de febrero del 2026 se realizó el Primer Convenio modificatorio en Plazo y Recalendarización de Ministraciones con el que se redujo 6 meses el plazo originalmente pactado en el Convenio de Colaboración, siendo la nueva fecha de terminación el 20 de noviembre del 2026.
Debido a circunstancias ajenas a la obra, en particular al asunto de licitación-suministro de equipo médico se vio impactado el tiempo requerido para concluir la obra en su totalidad, por tal motivo la RO IMSS solicitó a la RO de la DEFENSA elaborar una reprogramación considerando los tiempos reales ya que se tiene conocimiento que las guías mecánicas de estos equipos estarían siendo entregadas en obra en el mes de octubre de 2026. En reunión del 13 de julio del 2026 se solicitó a la DEFENSA respetar el programa de convenio modificatorio y en su lugar elaborar un programa de cierre de obra donde manifieste la recuperación de atrasos de obra, dejando señalado aquellos trabajos que estén supeditados a compromisos de entrega documental de parte del Instituto. Este programa deberá ser entregado por la DEFENSA el lunes 20 de julio 2026.
Cobra relevancia contar con las guías mecánicas de los equipos de Imagenología para poder terminar está área y servicios generales de Etapa 2 para estar en condiciones de iniciar los trabajos de remodelación de la planta baja del cuerpo 2 donde actualmente se encuentran estos servicios (Etapa 1). En obra se han implementado acciones de coordinación con los proveedores de los Equipos instalados para su reinstalación en Etapa 2.
La dirección del Hospital solicitó que para poder hacer la mudanza de los servicios de Imagenología y servicios generales hacia Etapa 2 es indispensable entregar concluidos y funcionando los trabajos de planta baja y primer nivel del cuerpo 6, incluidos cuerpo 9 (jefatura de conservación y talleres), cubos de escaleras y elevadores así como la obra exterior.
Todo lo anterior repercute directamente en la nueva programación de obra solicitada a la RO de la DEFENSA.
Por instrucción de IMSS central, mediante oficio No. 342 la RO IMSS solicitó a la RO de la DEFENSA el programa de cierre, en congruencia con la Cédula de Avance Físico, que forma parte del Convenio modificatorio en Plazo y Recalendarización de Ministraciones. La DEFENSA respondió con su similar No 744 en el que manifestó que las fechas programadas para el cierre de la obra están sujetas a la entrega oportuna de las guías mecánicas del equipamiento médico, indispensables para concluir los trabajos correspondientes al Cuerpo 6, asimismo, el cumplimiento del programa de cierre dependerá de contar con la suficiencia y liquidez presupuestal requeridas.

Con fecha 11 de septiembre del 2026 la RO de la DEFENSA informó mediante minuta 041, la suspensión unilateral de trabajos de campo, que será efectuada a partir del día 14 de septiembre del mismo año, argumentando la falta de recursos presupuestales, lo anterior no ha sido acreditado por la RO IMSS, dado que la DEFENSA no ha presentado las comprobaciones de gasto del mes de enero a agosto 2026, conviene señalar, que no existe atraso en el pago de ministraciones de obra por parte del Instituto.

Se aclara también, que se mantiene presencia de trabajadores en obra, principalmente en estructura de acero.

La RO IMSS trabaja en el dictamen para el segundo convenio modificatorio, que tiene la finalidad de recalendarizar el pago de ministraciones.

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

1. El día jueves 30 de julio de 2026 se sostuvo una reunión entre RO IMSS, DEFENSA y CCI, en la cual la RO IMSS presento el área afectada por las guías mecánicas, la cual resulto de 506 m2, poco menos del 2%, por lo que no debería de atrasar los trabajos.

Por lo anterior, quedamos en espera del programa de cierre por generar por la Residencia de Obra de la DEFENSA, y hasta que eso ocurra, continuamos dando seguimiento a lo establecido en el Primer Convenio Modificatorio, el cual marca una terminación de la obra en Noviembre de 2026.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

1. Boletines de proyecto, a partir del inicio de los trabajos (20 de mayo de 2025) a la fecha (28 de septiembre de 2026) la RO de la DEFENSA ha ingresado a la RO IMSS 189 boletines de proyecto, de los cuales se han respondido 187.
2. Cédula de Cambio CDC-01, con fecha 08 de junio del 2026 se entregó a la RO de la DEFENSA la Cédula de Cambio CDC-01, relativa a modificaciones en las áreas de UCIA, UCIN, cirugía (quirófano central), CEyE y hospitalización, derivadas de la revisión de COFEPRIS.
3. Cédula de Cambio CDC-05, con fecha 16 de junio del 2026 se entregó a la RO de la DEFENSA el Proyecto Ejecutivo de la Cédula de Cambio CDC-05, relativa a modificaciones en el área de Tococirugía, solicitadas por COFEPRIS, las cuales se encuentran en proceso de construcción.

1. Respondidos 189 boletines, los 2 restantes actualmente se encuentran en revisión de la Residencia de Obra del IMSS.

2. En Obra se llevan a cabo las modificaciones plasmadas en la Cedula de cambio CDC-01.

3. En Obra se llevan a cabo las modificaciones plasmadas en la Cedula de cambio CDC-05. Mediante Oficio No. 09 53 84 61 1G10/000770 de fecha 29 de julio de 2026 la Titular de la CPSI informo la entrega del Programa Medico y la Guía de Dotación, además mediante oficio No. 09 53 38 61 1G20/000598 de fecha 04 de agosto hizo llegar un tanto del Programa Medico Impreso, sin embargo, para continuar con los tramites de COFEPRIS es necesaria la actualización del Programa Medico Arquitectónico, el cual fue solicitado a la CPSI mediante oficio No. 09 53 84 61 1G70/1089 de fecha 19 de agosto de 2026.

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 16 (dieciseis)
Actualización: 28/09/26

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS

DE LA OBRA

1. DEFENSA, ya ha implementado acciones de coordinación para el movimiento de equipos instalados en la etapa 1, mismo que se prevé realizar al concluir la totalidad de la planta baja del cuerpo 6.

2. Se solicitó el 26 de abril del 2024 al gobierno municipal un proyecto para la integración vial del entorno inmediato al Hospital. El gobierno municipal indicó que realizará los trabajos faltantes al concluir las acciones del colector pluvial. Para ello, se cuenta con el acompañamiento de la dirección de administración en las gestiones institucionales correspondientes.

Pendiente resolver las siguientes obras complementarias.

3. Descarga pluvial: Se requiere la formalización del convenio de colaboración DEFENSA-CESPE (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada) para la construcción del colector pluvial que daría servicio a este Hospital.
La DEFENSA informó, durante la visita de la Presidenta de la República el 19 de junio de 2026, que en un tiempo aproximado de 2 semanas se estaría formalizando el convenio de colaboración DEFENSA-CESPE para la construcción del colector pluvial, con recursos del gobierno estatal.

El día 03 de agosto del 2026 se formalizó el Convenio de colaboración DEFENSA-Gobierno del Estado de Baja California, teniendo como representante encargado a la CESPE (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada) para la construcción del colector pluvial que dará servicio a este Hospital. La R.O. de la DEFENSA informó que se cuenta con los recursos económicos, se tiene programado terminar el 28 de febrero del 2027. **Al día de hoy no se ha dado inicio a los trabajos, únicamente se observó el suministro de materiales (tuberías) para esta obra, mismos que fueron descargados en el predio propiedad del Instituto.**

1. Seguimiento de la conclusión de la PB del cuerpo 6 por parte de la RO IMSS.

2. Se trabajara en una propuesta de Reiterativo a fin de contar con ese proyecto de integración vial del entorno del Hospital, debido a que ya se formalizo el convenio de Colaboración entre la DEFENSA y CESPE el cual tiene por objeto la construcción del Colector Pluvial.

3. N/A

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

1. COFEPRIS: El día jueves 17 de agosto del 2026 se recibió el programa médico y guía de dotación del proyecto ejecutivo contemplando las modificaciones al proyecto original del área de Tococirugía, posteriormente, el 07 de septiembre 2026 la RO recibió el programa medico-arquitectónico actualizado; con misma fecha se remitió mediante oficio a la DRO para continuar con los tramites de la obtención de la licencia correspondiente. **El 18 de septiembre de 2026 la RO IMSS envió a la DSOP el oficio Of. 09 53 84 61/ IG84/ 2E ENS / 0405 solicitando el apoyo para gestionar Programa Médico – Arquitectónico, como documento único para continuar los trámites de premiso sanitario de Construcción (COFEPRIS)**

2. Protección Civil: Actualmente el proyecto se encuentra en revisión por parte de la dependencia para emitir su respectivo dictamen de factibilidad de proyecto. **Con fecha 28 de julio de 2026 se envió mediante oficio No. 09 53 84 61/ 1G84/ 2E ENS /0350, las observaciones técnicas derivadas de la revisión del proyecto ejecutivo de la segunda etapa del Hospital General Regional No. 23 del IMSS en el oficio CMPC/PLAN/1295/2026, emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil de Ensenada.**

3. Dirección de Bomberos: se cuenta con la Factibilidad de Proyecto por parte de la Dirección de Bomberos con fecha 09 de julio 2026.

1. Mediante oficio NoOf. No. 09 53 84 61 1G21/SDRPAI 0072, se compartió con la CPSI los comentarios de la Residencia de Obra del IMSS a fin de obtener su opinión técnica, Si bien se recibió la actualización de programa médico-arquitectónico, como un anexo al programa del proyecto ejecutivo, se requiere el Programa Médico – Arquitectónico, como documento único para continuar los trámites de premiso sanitario de Construcción (COFEPRIS)

2. Se recibieron comentarios al proyecto ejecutivo por parte de Protección Civil enviados por la RO IMSS mediante oficio No. 09 53 84 61/ 1G84/ 2E ENS /0350, de fecha 28 de julio de 2026, mediante oficio No. 09 53 84 61 1G70/1016 de fecha 05 de agosto de 2026 se compartieron mencionadas observaciones con la CPSI, a fin de obtener una solvatación técnica.

3. N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

Medicina Física y Rehabilitación (cuerpo 3). Pendiente el suministro de equipo médico y muebles de acero inoxidable a cargo del IMSS. Conviene aclarar, que este equipamiento será instalado por la DEFENSA una vez que el Instituto los suministre.

Urgencias, Tococirugía, Cirugía y hospitalización (cuerpo 5). Obra civil: trabajan en las escaleras de emergencia e instalaciones electromecánicas en general.

Imagenología, servicios generales, patología, UCIN, UCIA, UCIP y hospitalización (cuerpo 6). Instalaciones electromecánicas en general.

Elevadores, escaleras públicas y de servicio (cuerpo 7 y 8) obra civil: Se trabaja en detalles de pintura en general de la estructura de acero de cuerpo 7. En el cuerpo 8, se encuentra sin actividad. Se encuentran en obra los elevadores para su posterior instalación.

Jefatura de conservación y talleres (cuerpo 9), sin actividades.

Obras exteriores: Se trabaja en el montaje de estructura de acero para la cubierta de acceso de urgencias e iniciaron el montaje del andador peatonal entre cuerpos 5 y 6.

N/A

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

20 de noviembre 2026 (según primer Convenio modificatorio en Plazo y Recalendarización de Ministraciones), sin embargo, la RO de la DEFENSA tiene pendiente la entrega el programación de cierre de obra.

FECHA DE APERTURA PARCIAL

El día 23 de julio del 2026 se realizó la entrega parcial del cuerpo 3, Medicina Física y Rehabilitación, formalizada en su respectiva acta de entrega y recepción parcial de misma fecha.

POR EL IMSS:

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial HGR 216 Camas, Ensenada, B.C.

POR LA SUPERVISIÓN:

Ing. Joel Alejandro de la Rosa Juarez
Superintendente de Supervisión

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	16 (dieciseis)
Actualización:	28/09/26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. de Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-T-17-2025	Fecha de Adjudicación:	27 de agosto del 2025

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (2A ETAPA)"

EMPRESA:	PLANET INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-2020004-5-431075	No COMPROMISO:	5-431075
Monto de Contrato:	$32,830,997.56	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	10 de septiembre 2025 al 13 de marzo del 2027	Plazo de Ejecución:	550

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:
Periodo:		Importe:		

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	68.22%	63.82%	-4.41%
Financiero (Importes C/IVA)	$22,398,235.36	$19,207,600.06	$3,190,635.31

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$32,830,997.56	MONTO CONVENIDO:	$0.00
MONTO PAGADO:	$17,373,069.49	HASTA EST. No.:	11
PENDIENTE DE PAGO:	$1,834,530.57	HASTA EST. No.:	12
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	$0.00	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	$79,739.32	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

No se tienen observaciones

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 11392190

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	16 (dieciseis)
Actualización:	28/09/26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. de Procedimiento:	**LO-50-GYR-050GYR098-N-7-2025**	**Fecha de Adjudicación:**	**04 DE JULIO DEL 2025**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA "

EMPRESA:	ARQ. LUCELIA CASATAÑEDA FRAGOZA		
No. DE CONTRATO:	**1-22020004-S-020517**	**No COMPROMISO:**	**S-020517**
Monto de Contrato:	**$4,877,806.24**	**Monto de Anticipo:**	**-----**
Periodo de Ejecución:	**07 DE JULIO 2025 al 31 DE DICIEMBRE 2027**	**Plazo de Ejecución:**	**909**

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:
Periodo:		Importe:		

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	**59.46%**	**59.46%**	**0.00%**
Financiero (Importes C/IVA)	**$2,900,541.00**	**$2,695,434.97**	**$ 205,106.03**

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	**$4,877,806.24**	**MONTO CONVENIDO:**	**$0.00**
MONTO PAGADO:	**$2,695,434.97**	HASTA EST. No.:	13
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISIÓN:	**$110,531.76**	HASTA EST. No.:	14

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	**$0.00**	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	**$0.00**	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Si bien se recibió la actualización de programa médico-arquitectónico, como un anexo al programa del proyecto ejecutivo, se requiere el Programa Médico – Arquitectónico, como documento único para continuar los trámites de premiso sanitario de Construcción (COFEPRIS)

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	16 (dieciseis)
Actualización:	28/09/26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. de Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR098-N-37-2025	Fecha de Adjudicación:	25 DE JULIO DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA "

EMPRESA:	ARQ. LUCELIA CASATAÑEDA FRAGOZA		
No. DE CONTRATO:	1-22020004-S-020518	No COMPROMISO:	S-020518
Monto de Contrato:	$2,936,919.15	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	28 DE JULIO 2025 al 31 DE DICIEMBRE 2027	Plazo de Ejecución:	888

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:
Periodo:	☐	Importe:		

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	49.94%	49.94%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	$1,466,702.42	$1,347,768.16	$ 118,934.26

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	$2,936,919.15	MONTO CONVENIDO:	$0.00
MONTO PAGADO:	$1,347,768.16	HASTA EST. No.:	13
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	$61,517.64	HASTA EST. No.:	14

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	$0.00	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	$0.00	

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

No se tienen observaciones

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 11392190

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

16 (dieciseis)
28/09/26

Construcción del Área de Hospitalización y Quirófanos del Hospital General Regional de 216 Camas en Ensenada, Baja California

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA



Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula: 16 (dieciseis)
Actualización: 28/09/26

Construcción del Área de Hospitalización y Quirófanos del Hospital General Regional de 216 Camas en Ensenada, Baja California

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



Instalaciones en general, cuerpo 5.



Instalaciones en general, cuerpo 5.



Instalaciones en general, cuerpo 5.



Escalera de emergencia, cuerpo 5.




Instalaciones en general,, cuerpo 6.



Instalaciones en general, cuerpo 6.



Instalaciones en general, cuerpo 6.

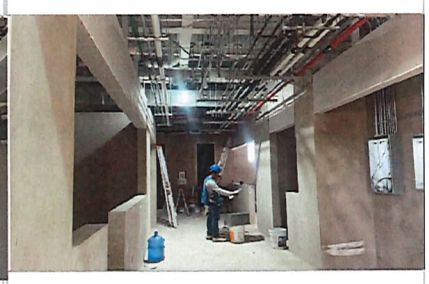

Instalaciones en general, cuerpo 6.



Soldadura y pintura en estructura de acero, cuerpo 7.



Obra civil en azotea, cuerpo 8.



Interior Medicina Fisica y Rehabilitación, cuerpo3.



Medicina Fisica y Rehabilitación, cuerpo 3.



Jefatura de conservación y talleres, cuerpo 9.



Jefatura de conservación y talleres, cuerpo 9.



Obras exteriores, cubierta Urgencias



Obras exteriores, andadore peatonal entre cuerpos 5 y 6

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Titular de la División de Residencia Especial B
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 3113921 90
