CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACION TECNICA DE CONSTRUCCION
DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

No. Cédula: 177
Actualización: 28/09/26

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL RURAL 50 CAMAS								
Localidad:	Av. El Naranjo S/N, Sur Poniente, Col. Moretos, C.P.29770, Bochil, Chiapas.			**Coordenadas:**	16.992255, -92.895164 (16°59'32.118" N, 92°53'42.590" O)				
Superficie del Terreno (m2):	9,644.53	**Superficie Construida (m2):**	2,577.94	**Superficie Estacionamiento (cajones):**	0.00	Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso, andadores, jardines, estacionamientos, caseta de vigilancia, entre otros.)	414.98	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):**	2,332.12
Camas censables:	52	**Camas no censables:**	20	**Especialidades:**	Pediatría; Medicina Interna; Ginecología y Obstetricia; Cirugía General; Anestesiología	**Monto de Equipamiento:** *En proceso de licitación y revisión el eq. Medico		$	139,757,356.00

CONTRATO

No. De Procedimiento:	LO-0500GYR119-E28-2022	**Fecha de Adjudicación:**	02-sep-22	**Empresa:**	ADMTVO. DESARROLLOS INVERSIÓN, PROYECTOS, CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	**Plazo de ejecución:**	160 días naturales
No. De Contrato:	1-22570004-4-43945	**Descripción de los trabajos a ejecutar:**	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL BOCHIL, CHIAPAS			**Período de ejecución:**	13 de septiembre de 2022 al 19 de febrero de 2023

CONVENIO 1

No. De Convenio:	1-22570004-4-43945C1-23	**Fecha:**	13-abr-23	**Tipo de convenio:**	Plazo	**Período de ejecución:**	20 de febrero al 20 de abril de 2023

CONVENIO 2

No. De Convenio:	1-22570004-4-43945C2-23	**Fecha:**	07-ago-23	**Tipo de convenio:**	Plazo	**Período de ejecución:**	21 de abril al 19 de julio de 2023

CONVENIO 3

No. De Convenio:	1-22570004-4-43945C3-23	**Fecha:**	29-dic-23	**Tipo de convenio:**	Plazo	**Período de ejecución:**	20 de julio al 31 de diciembre de 2023

CONVENIO 4

No. De Convenio:	Dictamen C4	**Fecha:**	En Proceso	**Tipo de convenio:**	Diferimiento	**Período de ejecución:**	01 de enero de 2024 al 28 de marzo de 2025

MONTOS DE CONTRATO Y CONVENIOS (Incluyen IVA)

Monto de Contrato:	$ 99,146,528.99	**Monto de Convenio 1:**	$ -	**Monto de Convenio 2:**	$ -	**Monto de Convenio 3:**	$ -	**Monto de Convenio 4:**	$ -

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVACIÓN
Fisico	100.00%	97.12%	-2.88%
Financiero	$ 99,146,528.99	$ 95,664,323.57	-$ 3,482,205.42
Fuerza de trabajo	0	0	0

SITUACION FINANCIERA

ESTIMACIONES			
Monto del Contrato:	$ 99,146,528.99	**Monto de Convenios Modificatorios:**	$ -
Monto Pagado:	$ 95,664,323.57	**Hasta Estimación No.**	38
Pendiente de pago:	$ 540,543.70	**Estimaciones faltantes :**	Finiquito

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EJERCICIO	TOTAL AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	COMENTARIOS
2022	$ -	$ -	
2023	$ -	$ -	
2024	$ -	$ -	

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL CORTE (ESTIMACIÓN 38):
$0.00
RETENCIÓN ACUMULADA A LA FECHA (JUNIO DE 2026):
$942,945.18

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATO

1. El 01-jun-2026 el Residente de Obra envió a la DSOP la información requisitada para la obtención del Registro de la Cartera de Inversión ante la SHCP.

2. Derivado de la solicitud del contratista para la Terminación Anticipada del contrato de fecha 01-jul-2025, el R.O. reenvió a la DSOP el proyecto del Acta de Terminación Anticipada por correo electrónico el 16-jul-2026.

3. Derivado de la minuta de fecha 20-ago-2026 con la DCPU, y mediante of. no. 09538461 1G79/SDCSOPZCS/2026/244 se recibe expediente de la solicitud de ajuste de costos indirectos y financiamiento, procediendo a realizar devolución a la contratista mediante of. no. 22570004/RO/2026/010, previo reingreso del expediente de la solicitud con documentación complementaria por iniciativa de la contratista mediante oficio número 22570004/RO/2026/008 del 20-ago-26.

4. Con fecha 31-jul-26, se reenvía por correo electrónico a la SDCSOPZCS el dictamen técnico con sus anexos del dictamen C4, por pagos extemporáneos y un plazo de 453 días naturales del 01-ene-24 al 28-mar-25; mismo que se encuentra en proceso de revisión.

5. Con fecha 25-ago-26 se recibe of. no. 09538431 1G79/2026/1517 en el cual se devuelve el P-06 no aprobado, por lo que mediante of. no. 22570004/RO/2026/009 del 25-ago-26 se realiza la devolución a la contratista; en espera de su reingreso con las correcciones enlistadas.

** SE REALIZÓ REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS Y NO EJECUTADOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FINIQUITO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN, IDENTIFICANDO CONCEPTOS NO EJECUTADOS DE LAS ESTIMACIONES No. 39 A LA No. 55, POR LO QUE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATISTA, SE AJUSTÓ EL AVANCE FÍSICO REAL CONFORME A LO EJECUTADO PAGADO Y LO PENDIENTE POR PAGAR.*

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

1.- La DSOP remitió a la CTC el expediente enviado por la Residencia de Obra para solicitar el registro en la Cartera de Inversión ante la SHCP; dicha información está en proceso de revisión por la CPECI para realizar el trámite correspondiente.

2.- El equipo legal de la DSOP se encuentra revisando y analizando la viabilidad de formalizar, o no, la terminación anticipada del contrato, misma que fue solicitada por el contratista.

3.- La DCPU devolvió el estudio a la DSOP por medio del oficio No. 09538461 1G80/2026/0574, derivado de la minuta de trabajo del 20 de agosto de 2026 al no contar con la documentación soporte necesaria para llevar a cabo la revisión correspondiente, la SDCSOPZCS devolvio el 26 de agosto de 2026 dicho estudio a la RO, por medio del oficio 09538461 1G79/SDCSOPZCS/2026/244. El R.O. reingresa el estudio de ajuste de costos de indirectos a la DSOP por oficio No. 22570004/RO/2026/008 del 20/08/26, por lo que la DSOP procedio al reingreso el 26/08/2026 de dicho estudio a la DCPU por oficio no. 09538461 1G79/2026/1536.

4.- El R.O. envio el 31 de julio de 2026 por correo electronio el dictamen tecnico del C4 y sus anexos, por lo cual se da inicio con su revisión por parte de la DSOP. (Se aclara que solo procede su revisión mas no su tramite, toda vez que aun no se cuenta con OLI 2026).

5.- La DCPU devuelve el 19 de agosto de 2026 por oficio 09538461 1 G80/2026/0567 a la DSOP el presupuesto P-06 concluyendo que no se aprueban los conceptos presentados por deficiencias en la integración de la documentación. Por lo anterior la DSOP devuelve el 25 de agosto de 2026 a la R.O., el presupuesto P-06 no aprobado por oficio no. 09538461 1G79/2026/1517.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

N/A

DE LA OBRA

1. Conservación retomó los trabajos pendientes con el fin de concluirlos, a la fecha, dicho contrato se encuentra en etapa de conclusión.

2. A la fecha se encuentra en uso por el área operativa dentro del área de remodelación, el quirófano existente, y dentro del área de ampliación el área de CEyE y residencias médicas, contando con las actas de recepción parcial de dichas áreas.

3. Residencia de obra DSOP en conjunto con la Residencia de Obra de Conservación del Hospital, notificaron la necesidad de adquisición de mobiliario por parte del OOAD, conforme a planos, el cual se encuentra en proceso de adquisición.

1. Residencia de Obra coadyuva en el seguimiento para la conclusión de los trabajos contemplados en el contrato de Conservación.

LA CEPI-OP SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA DEL OOAD. DICHO DOCUMENTO TENDRÁ COMO FINALIDAD ÚNICAMENTE SOLVENTAR LA DEUDA PENDIENTE DE LA UIPECI CON LA EMPRESA CONTRATISTA, ASÍ COMO RESPALDAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y NO MÉDICO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, DESDE LA CONCEPCIÓN DE LA OBRA, NO SE CONSIDERÓ LA INCLUSIÓN DE EQUIPAMIENTO.

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

1. No se cuenta con el refrendo de la licencia de construcción, derivado del proceso de terminación anticipada del servicio de DRO.
2. No se cuenta con licencia sanitaria de construcción ligada al punto anterior.
3. En proceso de formalización la contratación del aumento de carga ante CFE.

1 y 2. El 28 de julio de 2026 la Residencia de Obra envió correo al Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales del OOAD en Chiapas, informando la necesidad de contar con el servicio del DRO para la conclusión de los trámites pendientes.
3. El OOAD da seguimiento a la contratación del aumento de carga; sujeto a la terminación total de los trabajos.
EL 28 DE JULIO DE 2026 LA RESIDENCIA DE OBRA ENVIÓ CORREO AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL OOAD EN CHIAPAS, INFORMANDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO DEL DRO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRÁMITES PENDIENTES.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

1. La empresa contratista se encuentra atendiendo detalles de acabados e instalaciones, así como del arranque y correcto funcionamiento de los equipos electromecánicos

CONSERVACIÓN RETOMÓ LA OBRA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR UN MONTO DE $36,660,263.00 MDP (AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, CON VICIOS OCULTOS EN LA ENTREGA).
SE NOTIFICÓ LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR PARTE DEL OOAD, CONFORME A PLANOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de término conforme al Convenio 3:
31 de diciembre de 2026
Fecha estimada para la conclusión real de los trabajos del contrato de Conservación:
10 de octubre de 2026

FECHA DE APERTURA PARCIAL

29 de noviembre de 2024
(Contrato DSOP. CEyE y Quirófano Existente)
01 de marzo de 2026
(Contratro OOAD. Residencias Médicas)

POR EL IMSS:

Ing. Rodrigo Iván Gallegos Flores
Residente de Obra IMSS

POR LA SUPERVISIÓN:

Nombre
Cargo

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACION TECNICA DE CONSTRUCCION
DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

No. Cédula: 99
Actualización: 28/09/26

DATOS GENERALES

Unidad:	HOSPITAL RURAL 50 CAMAS						
Localidad:	Av. El Naranjo S/N, Sur Poniente, Col. Morelos, C.P.29770, Bochil, Chiapas.			**Coordenadas:**	16.992255, -92.895164 (16°59'32.118" N, 92°53'42.590" O)		
Superficie del Terreno (m2):	9,644.53	**Superficie Construida (m2):**	2,577.94	**Superficie Estacionamiento (cajones):**	0.00	**Superficie Obra Exterior (m2):** (plaza de acceso, andadores, jardines, estacionamiento, caseta de vigilancia, entre	414.98	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):**	2,332.12
Camas censables:	52	**Camas no censables:**	20	**Especialidades:**		**Monto de Equipamiento:**			

CONTRATO

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR056-N-1-2024	**Fecha de Adjudicación:**	08-ago-24	**Empresa:**	S/ INVOICE IT CINCO NO OBVIO S DE RO NE ISA S DE CV.	**Plazo de ejecución:**	90 días naturales
No. De Contrato:	1-22570004-4-43945	**Descripción de los trabajos a ejecutar:**	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL BOCHIL, CHIAPAS			**Período de ejecución:**	09 de agosto al 06 de noviembre de 2024

CONVENIO 1

No. De Convenio:	N/A	**Fecha:**		**Tipo de convenio:**		**Período de ejecución:**	

CONVENIO 2

No. De Convenio:	N/A	**Fecha:**		**Tipo de convenio:**		**Período de ejecución:**	

CONVENIO 3

No. De Convenio:	N/A	**Fecha:**		**Tipo de convenio:**		**Período de ejecución:**	

CONVENIO 4

No. De Convenio:	N/A	**Fecha:**		**Tipo de convenio:**		**Período de ejecución:**	

MONTOS DE CONTRATO Y CONVENIOS (Incluyen IVA)

Monto de Contrato:	$ 498,812.01	**Monto de Convenio 1:**	$ -	**Monto de Convenio 2:**	$ -	**Monto de Convenio 3:**	$ -	**Monto de Convenio 4:**	$ -

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVACIÓN
Físico	100.00%	66.28%	-33.72%
Financiero	$ 498,812.01	$ 330,612.60	-$ 168,199.41
Fuerza de trabajo	0	0	0

SITUACION FINANCIERA

ESTIMACIONES			
Monto del Contrato:	$ 498,812.01	**Monto de Convenios Modificatorios:**	$ -
Monto Pagado:	$ 363,086.75	**Hasta Estimación No.**	2
Pendiente de pago:	-$ 49,999.90	**Estimaciones faltantes :**	Devolución de pagos en exceso

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EJERCICIO	TOTAL AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	COMENTARIOS
2022	$ -	$ -	
2023	$ -	$ -	
2024	$ -	$ -	

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL CORTE (ESTIMACIÓN 38):
$0.00
RETENCIÓN ACUMULADA A LA FECHA (JUNIO DE 2026):
$0.00

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

1. Se cuenta con el acta de terminación anticipada, dando cierre a la Bitácora Electrónica del Servicio. 2. Se encuentra en estatus de pendiente el pago de reingreso por pagos en exceso y sus intereses por un monto de $49,999.90 más IVA e intereses calculados a la fecha de $7,706.53. 3. Residencia de obra solicita las fianzas de vicios ocultos para su revisión y validación, esto para la formalización del acta de finiquito. 4. Con fecha 29 de junio de 2026, mediante acta de entrega recepción de la residencia de servicios, se hace entrega a personal del OOAD expediente e información referente al contrato, así como el estatus de los pendientes.	

DEL PROYECTO EJECUTIVO

N/A	

DE LA OBRA

N/A	

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

1. No se cuenta con el refrendo de la licencia de construcción, derivado del proceso de terminación anticipada del servicio de DRO. 2. No se cuenta con licencia sanitaria de construcción ligada al punto anterior. 3. En proceso de formalización la contratación del aumento de carga ante CFE.	1 y 2. El 28 de julio de 2026 la Residencia de Obra envió correo al Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales del OOAD en Chiapas, informando la necesidad de contar con el servicio del DRO para la conclusión de los trámites pendientes. 3. El OOAD da seguimiento a la contratación del aumento de carga; sujeto a la terminación total de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

N/A	

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE APERTURA PARCIAL

POR EL IMSS:

Ing. Rodrigo Iván Gallegos Flores
Residente de Obra IMSS

POR LA SUPERVISIÓN:

Nombre
Cargo

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula: 99
Actualización: 28/09/26

DATOS GENERALES

Unidad:	**HOSPITAL RURAL 50 CAMAS**						
Localidad:	Av. El Naranjo S/N, Sur Poniente, Col. Morelos, C.P.29770, Bochil, Chiapas.			**Coordenadas:**	16.992255, -92.895164 (16°59'32.118" N, 92°53'42.590" O)		
Superficie del Terreno (m2):	9,644.53	**Superficie Construida (m2):**	2,577.94	**Superficie Estacionamiento (cajones):**	0.00	**Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso, andadores, jardines, estacionamiento, caseta de vigilancia, entre** 414.98	**Superficie Ampliación y Remodelación (m2):** 2,332.12
Camas censables:	52	**Camas no censables:**	20	**Especialidades:**		**Monto de Equipamiento:**	

CONTRATO

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR056-N-2-2024		**Fecha de Adjudicación:** 08-ago-24	**Empresa:** [illegible]		**Plazo de ejecución:**	90 días naturales
No. De Contrato:	1-22570004-4-43945	**Descripción de los trabajos a ejecutar:**	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL BOCHIL, CHIAPAS			**Período de ejecución:**	09 de agosto al 06 de noviembre de 2024

CONVENIO 1

No. De Convenio:	N/A		**Fecha:**		**Tipo de convenio:**	**Período de ejecución:**	

CONVENIO 2

No. De Convenio:	N/A		**Fecha:**		**Tipo de convenio:**	**Período de ejecución:**	

CONVENIO 3

No. De Convenio:	N/A		**Fecha:**		**Tipo de convenio:**	**Período de ejecución:**	

CONVENIO 4

No. De Convenio:	N/A		**Fecha:**		**Tipo de convenio:**	**Período de ejecución:**	

MONTOS DE CONTRATO Y CONVENIOS (Incluyen IVA)

Monto de Contrato:	$ 298,617.68	**Monto de Convenio 1:**	$ -	**Monto de Convenio 2:**	$ -	**Monto de Convenio 3:**	$ -	**Monto de Convenio 4:**	$ -

AVANCES DE OBRA

AVANCES	PROGRAMADO	REAL	DESVACIÓN
Físico	100.00%	55.00%	-45.00%
Financiero	$ 298,617.68	$ 164,230.37	-$ 134,387.31
Fuerza de trabajo	0	0	0

SITUACION FINANCIERA

ESTIMACIONES			
Monto del Contrato:	$ 298,617.68	**Monto de Convenios Modificatorios:**	$ -
Monto Pagado:	$ 164,230.37	**Hasta Estimación No.**	2
Pendiente de pago:	$ -	**Estimaciones faltantes:**	

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EJERCICIO	TOTAL AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	COMENTARIOS
2022	$ -	$ -	
2023	$ -	$ -	
2024	$ -	$ -	

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL CORTE (ESTIMACIÓN 38):

$0.00

RETENCIÓN ACUMULADA A LA FECHA (JUNIO DE 2026):

$0.00

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATO

1. Se cuenta con el acta de terminación anticipada, dando cierre a la Bitácora Electrónica del Servicio.
2. Residencia de obra solicita las fianzas de vicios ocultos para su revisión y validación, esto para la formalización del acta de finiquito.
3. Con fecha 29 de junio de 2026, mediante oficio número 22570004/RO/2026/003 se hace envío del expediente del contrato concluido, quedando pendiente la firma de las actas de recepción y finiquito.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

N/A

DE LA OBRA

N/A

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y VISTOS BUENOS

1. No se cuenta con el refrendo de la licencia de construcción, derivado del proceso de terminación anticipada del servicio de DRO.
2. No se cuenta con licencia sanitaria de construcción ligada al punto anterior.
3. En proceso de formalización la contratación del aumento de carga ante CFE.

SEGUIMIENTO

DEL CONTRATO

1 y 2. El 28 de julio de 2026 la Residencia de Obra envió correo al Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales del OOAD en Chiapas, informando la necesidad de contar con el servicio del DRO para la conclusión de los trámites pendientes.
3. El OOAD da seguimiento a la contratación del aumento de carga; sujeto a la terminación total de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN

N/A

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE APERTURA PARCIAL

POR EL IMSS:

Ing. Rodrigo Ivan Gallegos Flores
Residente de Obra IMSS

POR LA SUPERVISIÓN:

Nombre
Cargo

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula	177
Actualización	28/09/26

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL BOCHIL, CHIAPAS

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL (ESTADO ACTUAL)



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL (ESTADO ACTUAL)



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR (ESTADO ACTUAL)



VISTA PANORAMICA (ESTADO ACTUAL)



POR EL IMSS:	**Ing. Rodrigo Ivan Gallegos Flores** Residente de Obra IMSS	**POR LA SUPERVISIÓN:**	**Nombre** Cargo

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
PERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 177
Actualización: 28-sept-26

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL BOCHIL, CHIAPAS

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



SALA DE ESPERA




OBSERVACIÓN MENORES




PASILLO TÉCNICO URGENCIAS



PASILLO TÉCNICO CIRUGÍA

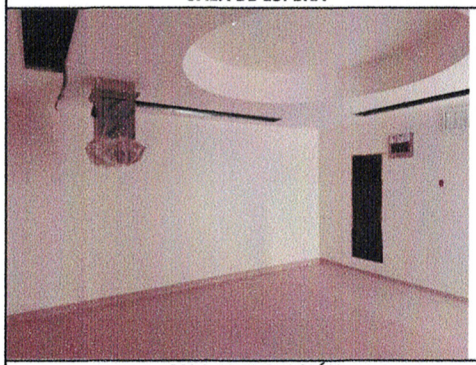

SALA DE EXPULSIÓN

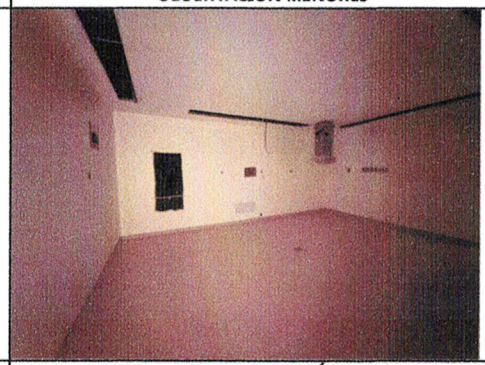

SALA DE CIRUGÍA



CEYE




BAÑOS VESTIDORES




UCEN



PEDIATRÍA

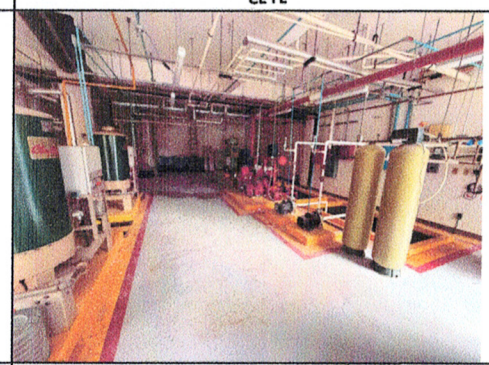

CUARTO DE EQUIPOS HIRÁULICO

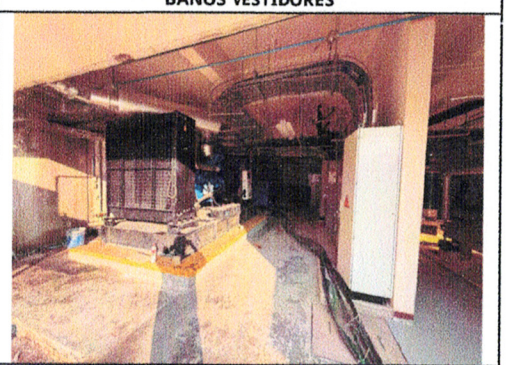

CUARTO DE EQUIPOS ELÉCTRICO

POR EL IMSS:	POR LA SUPERVISIÓN:
Ing. Rodrigo Ivan Gallegos Flores Residente de Obra IMSS	Nombre Cargo
