AE-2

GUZMAN FLORES SALOMON
INGENIERO CIVIL GUFS-420121 QX9 CED. PROF. 1442522
SERVICIOS DE INGENIERIA, PROYECTOS ASESORIA Y CONSTRUCCIONES

PROGRAMA DE GENERAL DE LOS SERVICIOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL DE SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES DIVIDIDO EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

Adjudicación Directa AO-050GYR119-E12-2019

Servicio a realizar: ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON,

Ubicación: Av. Abraham Lincoln casi esquina calle Pingüino, Colonia Valle Verde 1er Sector C.P. 64360, en la Ciudad de Monterrey, en el Estado de Nuevo Leon

Plazo de ejecución del servicio 45 días naturales, del 01 de Octubre al 14 de Noviembre del 2019

No.	ACTIVIDADES (ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES)	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	MONTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA	CLAVE
1	**CEDULA DE SERVICIOS**	01OCT19	17OCT19		%
				$ 38,000.00	A
					M
1.1	Investigacion de Campo	01-oct-19	12-oct-19		%
				$ 24,000.00	A
					M
1.2	Ingenieria de Gabinete	12-oct-19	17-oct-19		%
				$ 14,000.00	A
					M
2	**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO**	04-oct-19	15-oct-19		%
				$ 48,000.00	A
					M
2.1	Trabajos de Campo	04-oct-19	08-oct-19		%
				$ 22,000.00	A
					M
2.2	Ingenieria de Gabinete	09-oct-19	12-oct-19		%
				$ 14,000.00	A
					M
2.3	Dibujo de Planos	05-ago-18	08-ago-18		%
				$ 12,000.00	A
					M
3	**ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS**	10-oct-19	13-nov-19		%
				$ 102,000.00	A
					M
3.1	Investigacion Geologica	10-oct-10	12-oct-19		%
				$ 10,000.00	A
					M
3.2	Sondeos y muestreo	13-oct-19	15-oct-19		%
				$ 21,000.00	A
					M
3.3	Trabajos de Laboratorio	16-oct-19	05-nov-10		%
				$ 16,000.00	A
					M
3.4	Ingenieria de Gabinete	06-nov-19	13-nov-19		%
				$ 39,000.00	A
					M
3.5	Recomendaciones de Pavimentos	09-nov-19	13-nov-19		%
				$ 16,000.00	A
					M
4	**INGENIERIA GEOFISICA**	16-oct-19	30-oct-19		%
				$ 20,000.00	A
					M
4.1	Trabajos de Campo	16-oct-19	20-oct-19		%
				$ 12,000.00	A
					M
4.3	Gabinete	21-oct-19	30-oct-19		%
				$ 8,000.00	A
					M
5	**ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA**	06-oct-19	24-oct-19		%
				$ 20,000.00	A
					M
5.1	Muestra	06-oct-19	06-oct-19		%
				$ 5,000.00	A
					M
5.2	Laboratorio	07-oct-19	21-oct-19		%
				$ 12,000.00	A
					M
5.3	Informe	22-oct-19	24-oct-19		%
				$ 3,000.00	A
					M
			SUBTOTAL	$ 226,000.00	
		SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES			
		ACUMULADO DE LAS EROGACIONES			

PROGRAMACIÓN

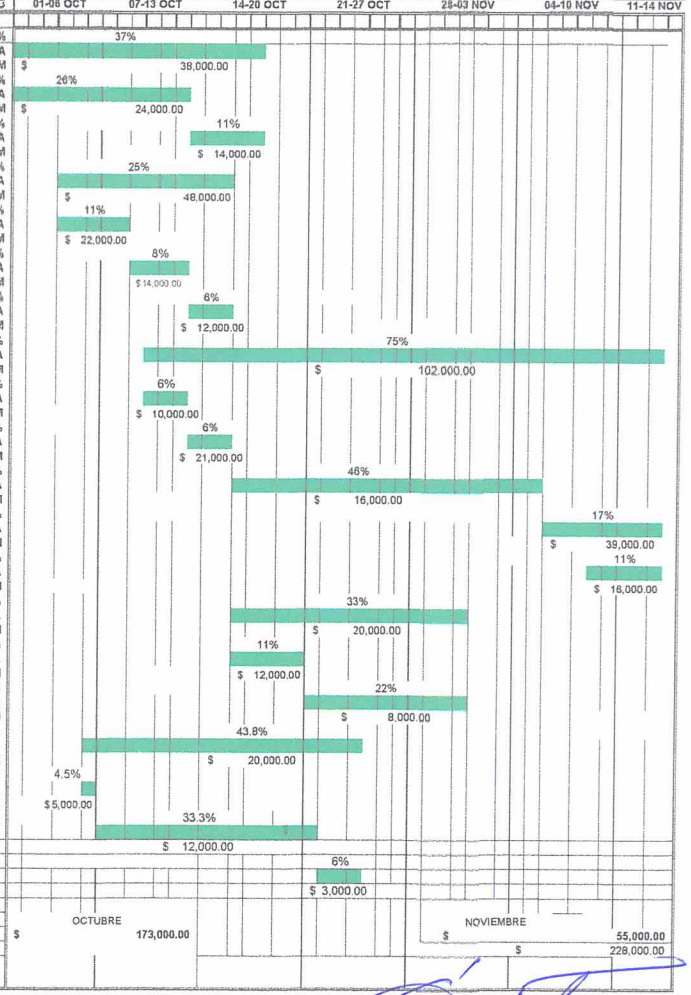

ING. SALOMON GUZMAN FLORES

CLAVES: A AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)
M MONTOS DE EROGACIONES POR PERIODOS

Nota: LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES, PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DEBERA ESTABLECERSE POR EL LICITANTE CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE PROPORCIONA COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ELABORAR SU PROPOSICIÓN, DEBIENDO EL ADJUDICADO REQUISITAR CON VERACIDAD LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS.
