



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** EN LO SUCESIVO "**EL INSTITUTO**" REPRESENTADA POR EL **DR. JOSE VALERIANO IBÁÑEZ DE LA ROSA EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA** Y POR LA OTRA PARTE **GRUPO INMOBILIARIO REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.,** EN LO SUCESIVO "**EL CONTRATISTA**", REPRESENTADO POR EL **C. LUIS GERARDO VALDES RAMOS** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "**LAS PARTES**", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. "EL INSTITUTO" declara que:

- I.1** Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.
- I.2** Conforme con los artículos 251 A y 268 A de la Ley del Seguro Social, 2 fracción IV, inciso a), 8 párrafo primero, 144 fracción I, XXII y 155 fracción V del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como lo señalado en el numeral 5.30 b. de las Políticas, Bases y Lineamientos en material de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS el **Dr. José Valeriano Ibáñez de la Rosa** Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Coahuila, con **R.F.C.** [REDACTED] es la persona Servidor Público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

Lo anterior a su vez de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. ACDO.DN.HCT.140524/121.P.DG dictado por el H. Consejo Técnico del "INSTITUTO", en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2024, surtiendo efectos a partir del 16 de mayo del 2024, así como en base al Poder General que le otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que obra en la **Escritura Pública No. 84,264** (Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro) de fecha 16 de mayo de 2024, pasada ante la Fe del Notario Público No. 13 de la Ciudad de México, el Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el Folio No. 97-7-28052024-105818 en fecha 28 de mayo de 2024.

Se testa RFC con Fundamento en Art. 115 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita al Comité de Información declare formalmente la confidencialidad de la información testada en virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión pueda afectar la esfera privada de las mismas.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

Así también y de conformidad con el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.30 b. de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS, la **C. Olga Lydia Benavides Obregón**, Jefa del Departamento de Construcción Planeación Inmobiliaria con R.F.C. [REDACTED] interviene como Área Requiriente y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, así como del Área Contratante en el presente instrumento jurídico y quien, es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa No. **AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026**, mediante oficio No. **059001 050 100 /OOAD / 2026 / 0751** de fecha 03 de Septiembre de 2026 , y formalizado el presente instrumento el día 08 de Septiembre de 2026, realizado al amparo de lo establecido en los **Artículos 134 de la Constitución** Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los **Artículos 42 fracción XV y Artículo 45 fracción I**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "**LOPSRM**", y los correlativos de su Reglamento.

I.4 "EL INSTITUTO" cuenta con recursos suficientes y autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2026 No. **099001/6B3000/6B30/OP26/ 661 / 2041** de fecha **25 de junio de 2026**, correspondiente al **Centro de Costos 130 100**, emitido por la Dirección de Finanzas.


I.5.- Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes **IMS421231I45**.

I.6 Tiene establecido su domicilio en **Boulevard Venustiano Carranza No. 2809, colonia La Salle en Saltillo, Coahuila, C.P. 25280** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1 Es una persona moral, legalmente constituida mediante el testimonio de **la Escritura Pública No. 89 (ochenta y nueve) de fecha 11 de mayo de 1983, pasada ante la fe del Licenciado Homero Gómez García, titular de la Notaría Pública Número 29 (veintinueve) de la Ciudad de Saltillo, Coahuila., con domicilio profesional ubicado en Calle Reynosa No. 625 (seiscientos veinticinco) Oriente, Colonia Republica, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila**, inscrito en el Registro Público de Comercio bajo la Partida 3122, Tomo 23, Libro III, de Sociedades, de fecha 9 de Mayo de 1983, denominada **GRUPO INMOBILIARIO REAL DEL BOSQUE, S.A DE C.V.**, cuyo objeto social es, entre otros, construir

Se testa RFC con Fundamento en Art. 115 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, se solicita al Comité de Información declare formalmente la confidencialidad de la información testada en virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión pueda afectar la espera privada de las mismas.



Boulevard Venustiano Carranza No. 2809 Col. La Salle, C. P. 25280 Saltillo, Coahuila. Tel: (844) 39-25-60 www.imss.gob.mx



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

casa habitación, edificios, condominios, locales comerciales, industriales y realizar obras urbanas y pavimentación, así como cualquier tipo de construcción.

II.2 El **C. Luis Gerardo Valdes Ramos** en su carácter de **Representante Legal**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante la **Escritura Pública No. 289 (doscientos ochenta y nueve) de fecha 19 de diciembre de 2019**, pasada ante la fe del **Licenciado Rodolfo Rábago Rábago, Titular de la Notaría Pública Número 35 (treinta y cinco) en la Ciudad de Saltillo**, en el **Estado de Coahuila**, inscrita en el Registro Público de Comercio NCI 202000090198 el 4 de junio de 2020, mediante el cual se le otorgaron los poderes de representación, mismo que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le han sido limitados ni revocados en forma alguna.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la **"LOPSRM"** y su Reglamento, Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales que rigen en el ámbito Federal, Estatal o Municipal; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato, y el contenido de los anexos siguientes:

Anexos:

- **Catálogo de Conceptos** conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto por partida, sub partida, concepto y total de la proposición (**Anexo 14**) de la Propuesta presentada por el Contratista.
- **Programa de ejecución convenido** conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y sub partidas del total de los conceptos de trabajo. (**Anexo 14 a**) de la Propuesta presentada por el Contratista.
- Descripción de Planeación integral propuesta para la ejecución de los trabajos incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos (**Anexo 14 b**) de la Propuesta presentada por el Contratista.
- **Proyecto de las áreas afectadas** (Anexo electrónico), proporcionado por El Instituto. Programas a costo directo de:
- **De mano de obra.** (**Anexo 15 a**) de la Propuesta presentada por el Contratista.



2026
año de
**Margarita
Maza**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

- **De los materiales y equipo de instalación permanente**, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (**Anexo 15 b**) de la Propuesta presentada por el Contratista).
- **De la maquinaria y equipo de construcción**, identificado su tipo y características. (**Anexo 15 c**) de la Propuesta presentada por el Contratista.
- **De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios**, encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. (**Anexo 15 d**) de la Propuesta presentada por el Contratista).
- Especificaciones Generales de Construcción, Guías Técnicas (Anexo electrónico proporcionado por El Instituto).
- Anexo de Seguridad (del contrato, sin número).

II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: **GIB830511T93**

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II. 7 Tiene establecido su domicilio en Av. Universidad No. 1035 2º piso, Colonia Universidad, C.P. 25260, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Tel. (844) 438 8150 correo electrónico: [REDACTED]

[REDACTED] los cuales señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

Se testa correo electrónico con Fundamento en Art. 115 Primer Párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, se solicita al Comité de Información declare formalmente la confidencialidad de la información testada en virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión pueda afectar la espera privada de las mismas.



2026
año de
**Margarita
Maza**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.


"EL INSTITUTO" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos adicionales, como **"RESULTADO DE LOS M2 NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO DEL PROYECTO INTEGRAL No. 2-21050002-4-05454, TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES EN LAS AREAS DE ACOMETIDA CFE, CASETAS DE ACCESO A LA UNIDAD, CISTERNA, CUARTO HVAC, CUARTO ELECTRICO, PUENTE DE INSTALACIONES, BASURA Y RPBI Y LINEA DE ENCOFRADO**, que se realiza en la Unidad Médica Familiar con domicilio en Blvd. Santa Patricia No. 290 esquina con Blvd. Santa Bárbara, en la colonia Santa Bárbara, C.P. 25294, en la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, y se obliga a realizarlos de conformidad, con los siguientes documentos:

1. El catálogo de conceptos.
2. El programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos.
3. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que forman parte de este contrato.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevarán a cabo por **"EL CONTRATISTA"** bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, el cual no podrá modificarse durante la vigencia del contrato. Así mismo, Las Partes acuerdan que los precios unitarios que se pacten permanecerán fijos durante la vigencia del contrato conforme al catálogo de conceptos que se agrega como **Anexo 14** integrante de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecución y los trabajos se sujetarán a:

- La legislación y Norma Oficial Mexicana;
- Los Requisitos del procedimiento de contratación No. **AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026**;
- La propuesta presentada;
- Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y
- La bitácora de los trabajos.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de **\$ 5'464,136.97 (Cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 97/100 M.N.)**, más la cantidad de **\$ 874,261.92 (Ochocientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta y un pesos 92/100 M.N.)** por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de **\$ 6'338,398.89 (Seis millones trescientos treinta y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos 89/100 M.N.)**.

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL CONTRATISTA"**.


CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **RLOPSRM**, junto con las hojas generadoras, fotografías, y nota de bitácora, **en apego al Art. 54 de la LOPSRM**, se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes.

Las estimaciones de los trabajos serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte quien deberá efectuar la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de **"EL INSTITUTO"**, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que **"EL CONTRATISTA"** haya presentado la factura electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **"EL CONTRATISTA"** que notifique oportunamente a **"EL INSTITUTO"**.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados serán revisables e independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por **"EL CONTRATISTA"** presenten errores o deficiencias, **"EL INSTITUTO"**, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"EL INSTITUTO"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, **"EL INSTITUTO"**, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso **"EL INSTITUTO"** a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos y se formalizarán a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora.

No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**.



2026
año de
**Margarita
Maza**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de **30 (treinta)** días naturales, pactándose como fecha de inicio el día **09 de septiembre de 2026**, y de conclusión el día **08 de octubre de 2026**.

SEXTA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantía de cumplimiento.

"EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del Oficio de Adjudicación y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el monto total de la obligación garantizada, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de **"EL INSTITUTO"**, por un importe equivalente al **10%** del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.


Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

B. Garantía de anticipo.

Para el presente contrato no se otorga anticipo, por lo que no es procedente la garantía por ese concepto.

C. Garantía para responder por vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

"EL CONTRATISTA" a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"**.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS


"EL INSTITUTO" se obliga a poner oportunamente a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciendo constar mediante Acta Entrega-Recepción y en la bitácora. El incumplimiento por parte de **"EL INSTITUTO"** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

"EL INSTITUTO" pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la solicitud de cotización se haya señalado que quedaban a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

OCTAVA. SUPERINTENDENTE.

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, al **"SUPERINTENDENTE"**, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento.

"EL INSTITUTO" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **"SUPERINTENDENTE"** de los trabajos, y **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la solicitud de cotización.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL INSTITUTO" establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, quien fungirá como su representante ante **EL CONTRATISTA** y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **"EL CONTRATISTA"**.

La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, tendrá las funciones previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento, "El Instituto" ha designado al **C. Guillermo Agustín Ramos Martínez**, como Residente de Obra, para realizar las funciones del presente numeral.

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA.

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"LAS PARTES"**, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El residente deberá abrir la bitácora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los trabajos establecida en el presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para **"EL INSTITUTO"** y **"EL CONTRATISTA"**. Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentra disponible en la página web: <http://besop.funcionpublica.gob.mx>, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 52 BIS de la LOPSRM, así como el 123 del RLOPSRM y con el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizarán que la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el artículo 52 Ter de la LOPSRM.

La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

- a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;
- b) Realizar los trabajos de conformidad con los alcances de los conceptos y conforme a las especificaciones pactadas por **"LAS PARTES"**.
- c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma;
- d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;
- e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y el **"RLOPSRM"**;
- f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecución de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"EL INSTITUTO"** por tales obligaciones;
- g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos, para subcontratar, si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos;


DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste y actualización de costos directos.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el presente contrato no procede ajuste de costos directos.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecución o de ambos, previa autorización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Públicas, el Área





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el artículo 59 Bis de la LOPSRM.

La revisión y ajuste de costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del "RLOPSRM".

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su proposición, **"EL INSTITUTO"** deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del "RLOPSRM"

Ajuste de costo por cargos adicionales.


Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" acuerdan que **"EL INSTITUTO"** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre y cuando éstos, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"**.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, **"EL INSTITUTO"** justificará de manera fundada y explícita las razones para la modificación del presente contrato. Las modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"** o de los Tratados.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original convenido en este contrato.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripción del convenio respectivo, será responsabilidad de **"EL INSTITUTO"**, la cual no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.


Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, **"EL INSTITUTO"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde a lo marcado en el último párrafo del Artículo 59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecución de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a **"EL INSTITUTO"** para que este resuelva lo conducente, y **"EL CONTRATISTA"** sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando **"EL INSTITUTO"** requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"EL INSTITUTO" verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución respectivo.

Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"EL INSTITUTO"** aplicará una retención económica del 11 % calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre **"LAS PARTES"**. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"** mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de **"EL INSTITUTO"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecución total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de ejecución de los trabajos vigente y acordado entre **"LAS PARTES"**, el Residente aplicará la pena convencional del 5 al millar por cada día de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificará a **"EL CONTRATISTA"** a través de oficio o nota de bitácora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"EL INSTITUTO"**.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no deberá exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si **"EL INSTITUTO"** así lo determina.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"EL INSTITUTO"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, o por



2026
año de
**Margarita
Maza**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, **"EL INSTITUTO"** reembolsará **"AL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Una vez comunicada por **"EL INSTITUTO"** la terminación anticipada del contrato, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver a **"EL INSTITUTO"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL CONTRATISTA"** incurra en alguna de las siguientes causales:

- I. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **"LOPSRM"** y su Reglamento;
- II. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"EL INSTITUTO"**;
- III. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente;
- IV. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **"EL INSTITUTO"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega



2026
año de
**Margarita
Maza**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026**


oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"EL INSTITUTO"**, así como cuando éste haya ordenado la suspensión de los trabajos;

- V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- VI. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"EL INSTITUTO"**;
- VII. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"EL INSTITUTO"**;
- VIII. No otorgar a **"EL INSTITUTO"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- IX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"EL INSTITUTO"** para la ejecución de los trabajos,
- X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;
- XI. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero; e
- XII. Incumplir cualquier de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

"EL INSTITUTO", llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" deberá notificar a **"EL INSTITUTO"**, a través de la bitácora o excepcionalmente por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que éste, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificación de los trabajos, **"EL INSTITUTO"** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a **"EL CONTRATISTA"** su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que **"EL INSTITUTO"** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificación de los trabajos, **"EL INSTITUTO"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.


"EL INSTITUTO" y **"EL CONTRATISTA"**, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la recepción física de los trabajos, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de los trabajos y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos.

"EL INSTITUTO" deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a **"EL CONTRATISTA"**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, **"EL INSTITUTO"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación, alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, **"EL INSTITUTO"** procederá en términos del párrafo anterior.

En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de **"LAS PARTES"**, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"EL INSTITUTO"** deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO

2-21050002-4-05465

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

Si resulta que existen saldos a favor de **"EL INSTITUTO"**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición de **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo establecido con el artículo 55 de la **"LOPSRM"**.

En caso de no obtenerse el reintegro, **"EL INSTITUTO"** procederá a hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de **"EL CONTRATISTA"** con el finiquito, o bien, no acuda a la elaboración del mismo, **"EL INSTITUTO"** pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LAS PARTES"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a **"EL INSTITUTO"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL INSTITUTO"**, así como en la ejecución de los trabajos del presente contrato.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO

2-21050002-4-05465

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

Para cualquier caso no previsto, **"EL CONTRATISTA"** exime expresamente a **"EL INSTITUTO"** de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **"EL CONTRATISTA"**, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL INSTITUTO"**, **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancias entre el contenido de los requisitos de la solicitud de cotización, así como el catálogo de conceptos del procedimiento y este contrato, prevalecerá lo establecido en los requisitos de dicha solicitud y el catálogo de conceptos del procedimiento.

Así también, **"LAS PARTES"** acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Dentro de los (*quince días*) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la bitácora, **"EL CONTRATISTA"** presentará a **"EL INSTITUTO"** un escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que **"EL INSTITUTO"** en un plazo no mayor de (*quince días*) hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **"LAS PARTES"**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **"LAS PARTES"** dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora.

Lo anterior sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** puedan solicitar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **"LOPSRM"**.

VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO

2-21050002-4-05465

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

artículos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"**LAS PARTES**" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, y demás legislación aplicable.

El tratamiento de los datos personales que "**LAS PARTES**" recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

"**EL CONTRATISTA**" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.


"**LAS PARTES**" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en Saltillo, Coahuila, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"**LAS PARTES**" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por "**EL CONTRATISTA**" y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de "**LAS PARTES**", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del "**RLOPSRM**".





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026


"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

**POR:
"EL INSTITUTO"**

NOMBRE

CARGO

R.F.C.

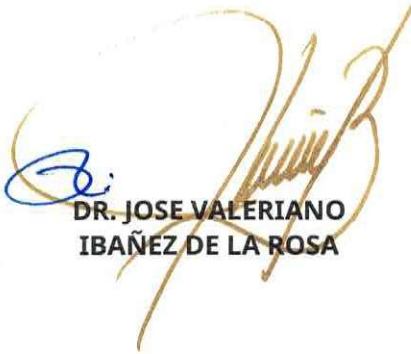
**DR. JOSE VALERIANO
IBAÑEZ DE LA ROSA**

**TITULAR DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL
COAHUILA**




**LIC. GERARDO HERNÁNDEZ
LÓPEZ ROMO**

**TITULAR DE LA JEFATURA DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**



Se testa RFC con Fundamento en Art. 115 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, se solicita al Comité de Información declare formalmente la confidencialidad de la información testada en virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión pueda afectar la espera privada de las mismas.



2026
año de
**Margarita
Maza**

Boulevard Venustiano Carranza No. 2809 Col. La Salle, C. P. 25280 Saltillo, Coahuila. Tel: (844) 39-25-60 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL COAHUILA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

No. DE CONTRATO
2-21050002-4-05465
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AO-50-GYR-050GYR072-N-11-2026

**ING. OLGA LYDIA
BENAVIDES OBREGÓN**

**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA**



**POR:
"EL CONTRATISTA"**

**ING. LUIS GERARDO VALDES
RAMOS**

**GRUPO INMOBILIARIO
REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.**

GIR830511T93

Se testa RFC con Fundamento en Art. 115 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, se solicita al Comité de Información declare formalmente la confidencialidad de la información testada en virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión pueda afectar la espera privada de las mismas.



2026
año de
**Margarita
Maza**

Boulevard Venustiano Carranza No. 2809 Col. La Salle, C. P. 25280 Saltillo, Coahuila. Tel: (844) 39-25-60 www.imss.gob.mx
